
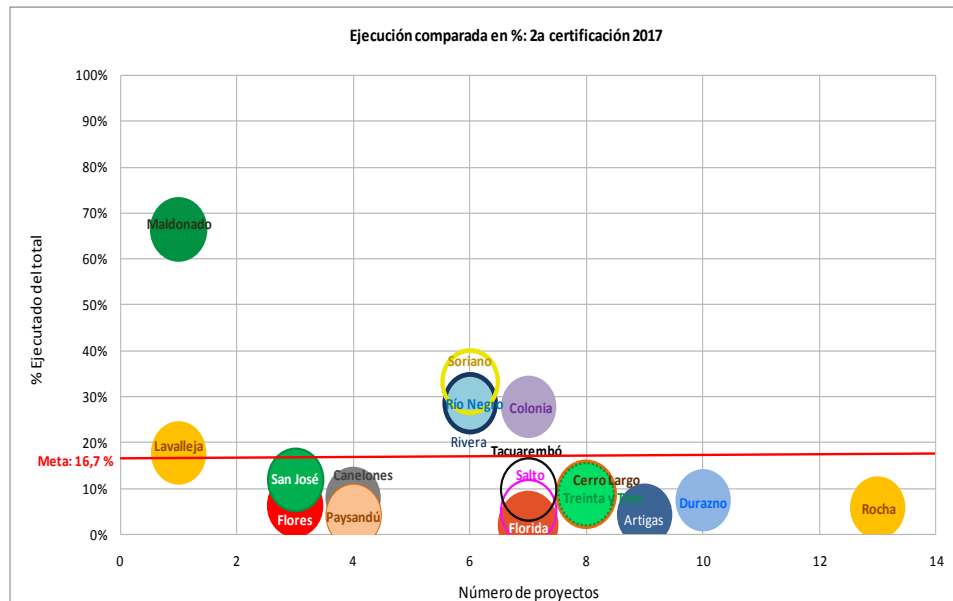
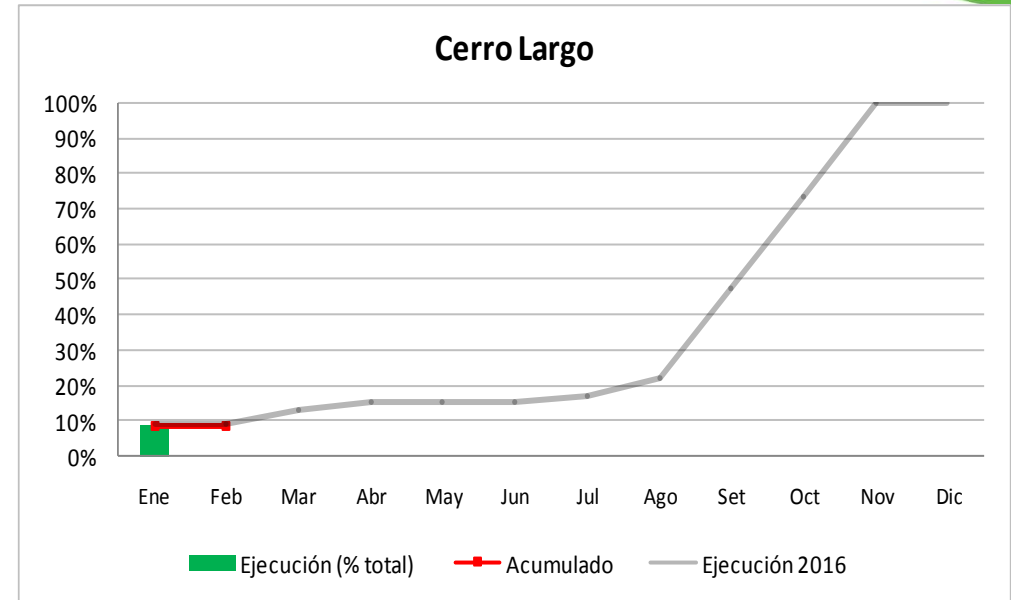


Informe de Ejecución Fondo de Desarrollo del Interior - OPP

Correspondiente a la ejecución de febrero 2017

CERRO LARGO

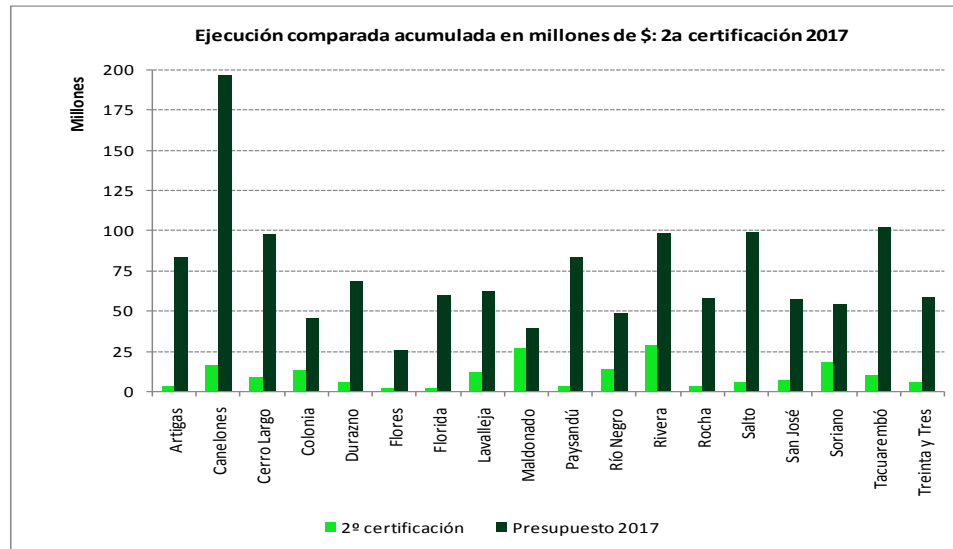

Nota: El gráfico muestra las certificaciones de ejecución otorgadas a la Intendencia en cada mes del año como porcentaje de la disponibilidad total ("Ejecución - % total"), el avance de todas las certificaciones de la Intendencia a la fecha ("Acumulado") y cómo fue el avance en la ejecución de la misma durante 2016 ("Ejecución 2016").

Alícuota Intendencia en FDI: 7,3% Disponibilidad anual 2017: \$ 97.454.060

- Total comprometido 2017: **\$ 130.543.710**
- Certificaciones acumuladas básico 2017: **\$ 8.477.961**
- Certificaciones acumuladas ajustadas 2017: **\$ 8.477.961**
- Saldo sin ejecutar básico: **\$ 88.976.099**
- Proyectos de mantenimiento/maquinaria (máx. permitido 20% de la disponibilidad anual): **9,9%**

Nota: La línea roja representa el avance mínimo en la ejecución deseable para este mes, correspondiente al porcentaje que se habría acumulado a la fecha (16,7%) si ésta fuera perfectamente uniforme a lo largo del año (8,33% por certificación, por haber doce certificaciones en el presente año), meta que contribuiría al objetivo de evitar riesgos de una ejecución "tardía" en el año.

Cartera de Proyectos – Evolución de la ejecución con respecto a lo planificado

Cod. proyecto	Nombre Proyecto	Estado Etapa Actual	Financiamiento FDI	% ejecución FDI	Fecha inicio previsto	Meses previstos de ejecución (incluye ampliaciones)	Meses reales de ejecución desde inicio previsto	Meses sin ejecución durante todo el período	Ejecución con respecto a lo planificado
PRY2015/1012	Reacondicionamiento y mejora de calle Joaquín de Paz de la ciudad de Río Branco	En Ejecución	49.945.218	85%	nov-2015	10	14	8	
PRY2016/1005	Gestión de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Melo y las Alcaldías	En Ejecución	21.400.874	0%	sin iniciar	3	0	0	
PRY2016/1015	Mantenimiento zona comercial de la ciudad de Río Branco	En Ejecución	18.652.056	53%	ago-2016	9	6	1	
PRY2016/1035	Reacondicionamiento urbano y pavimentación de las calles Agustín Muñoz, Ignacio Oribe y barrio Modelo	En Ejecución	21.420.301	43%	set-2016	5	5	1	
PRY2016/1036	Remodelación y jerarquización de la Avda. Suárez de Rondeló	En Ejecución	47.930.200	44%	set-2016	5	5	1	
PRY2016/1049	Adquisición de maquinaria Cerro Largo	En Ejecución	98.183.634	19%	oct-2016	60	4	no aplica	
PRY2016/1056	Tendido eléctrico de alta tensión para parque industrial de Melo	En Ejecución	19.741.439	0%	ene-2017	14	1	1	
PRY2016/1066	Reconstrucción y jerarquización del acceso oeste a la ciudad de Melo	En Ejecución	20.212.183	57%	oct-2016	6	4	3	
PRY2016/1037	Optimización vial y lumínica de la calle Aparicio Saravia	En Evaluación	33.744.654						
PRY2016/1038	Ampliación de los entubamientos de las aguas pluviales de la calle Luis Alberto de Herrera, entre las calles La Rosa y Darío Silva	En Evaluación	22.928.994						

Referencias:



La Intendencia ejecutó de acuerdo a lo planificado

La Intendencia tenía previsto ejecutar y no ejecutó

La Intendencia está fuera del plazo previsto de ejecución o no ha replanificado el proyecto
