
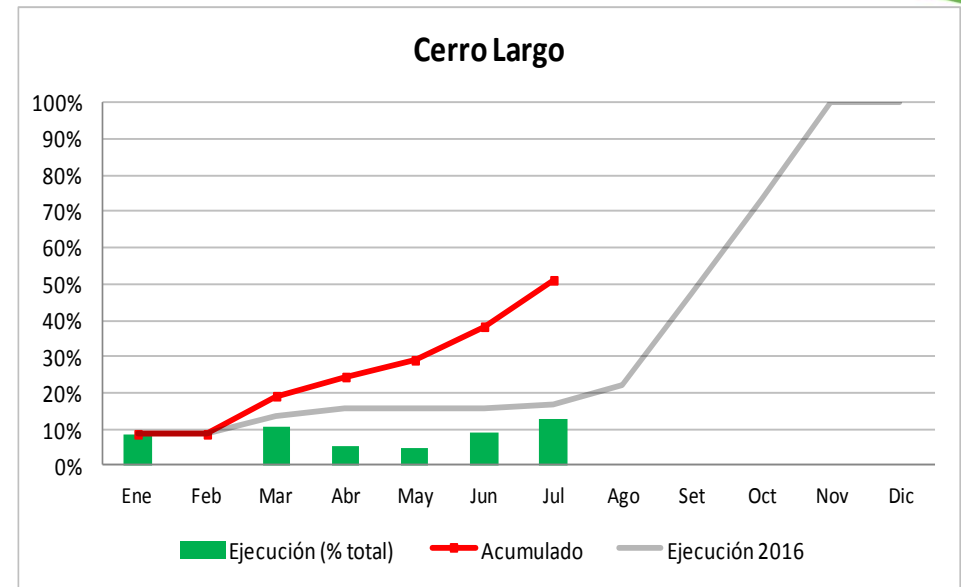



Informe de Ejecución Fondo de Desarrollo del Interior - OPP

Correspondiente a la ejecución de julio 2017

CERRO LARGO

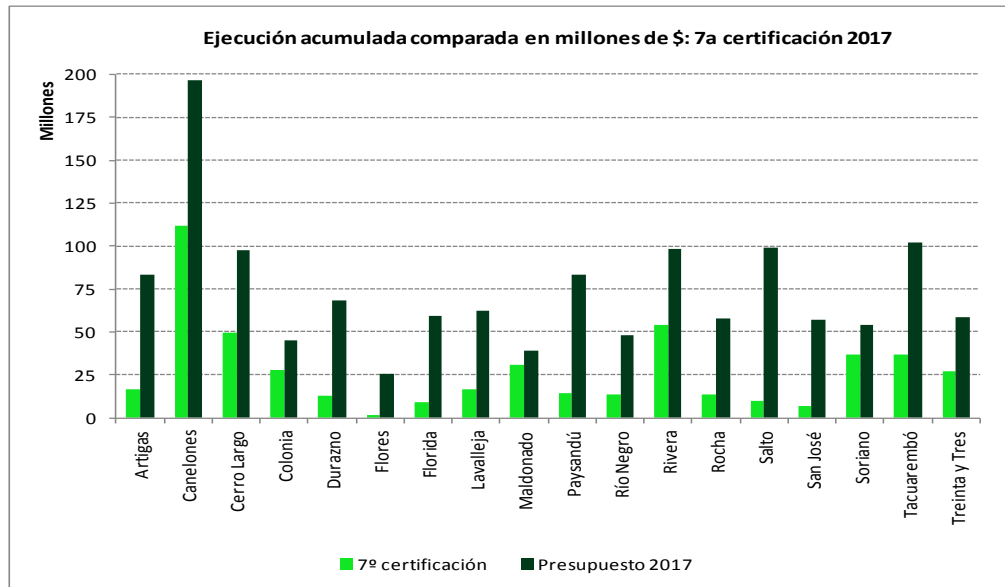

Nota: El gráfico muestra las certificaciones de ejecución otorgadas a la Intendencia en cada mes del año como porcentaje de la disponibilidad total ("Ejecución - % total"), el avance de todas las certificaciones de la Intendencia a la fecha ("Acumulado") y cómo fue el avance en la ejecución de la misma durante 2016 ("Ejecución 2016").

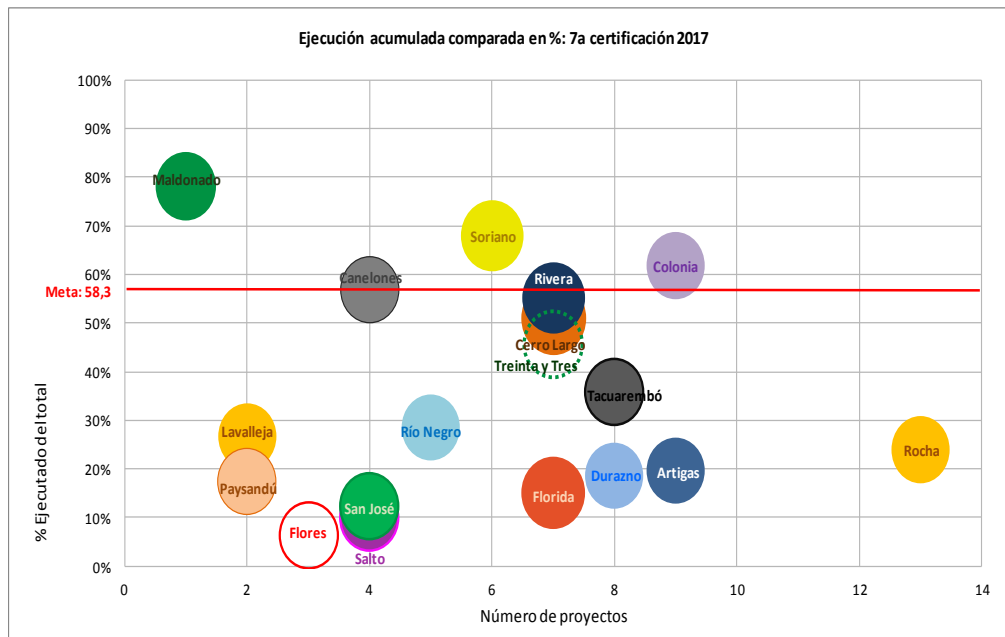

Nota: La línea roja representa el avance mínimo en la ejecución deseable para este mes, correspondiente al porcentaje que se habría acumulado a la fecha (58,3%) si ésta fuera perfectamente uniforme a lo largo del año (8,33% por certificación, por haber doce certificaciones en el presente año), meta que contribuiría al objetivo de evitar riesgos de una ejecución "tardía" en el año.

Alícuota Intendencia en FDI: 7,3% Disponibilidad anual 2017: \$ 97.454.060

- Total comprometido 2017: \$ 98.668.607
- Certificaciones acumuladas básico 2017: \$ 49.825.104
- Certificaciones acumuladas ajustadas 2017: \$ 49.801.777
- Saldo sin ejecutar básico: \$ 47.652.283
- Proyectos de mantenimiento/maquinaria (máx. permitido 20% de la disponibilidad anual): 20%

Cartera de Proyectos – Evolución de la ejecución con respecto a lo planificado

Cod. proyecto	Nombre Proyecto	Estado Etapa Actual	Financiamiento FDI	% ejecución FDI	Fecha inicio previsto	Meses previstos de ejecución (incluye ampliaciones)	Meses reales de ejecución desde inicio previsto	Meses sin ejecución durante todo el período	Ejecución con respecto a lo planificado
FDI2015/1012	Reacondicionamiento y mejora de calle Joaquín de Paz de la ciudad de Río Branco	Ejecución	49.857.917	87%	nov-2015	10	19	12	
FDI2016/1005	Gestión de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Melo y las Alcaldías	Ejecución	21.400.874	19%	dic-2017	3	0	0	
FDI2016/1035	Reacondicionamiento urbano y pavimentación de las calles Agustín Muñoz, Ignacio Oribe y barrio Modelo	Ejecución	21.420.301	84%	set-2016	8	10	3	
FDI2016/1036	Remodelación y jerarquización de la Avda. Suárez de Rondeló	Ejecución	47.930.200	52%	set-2016	5	10	3	
FDI2016/1049	Adquisición de maquinaria Cerro Largo	Ejecución	100.475.820	38%	oct-2016	60	9	no aplica	
FDI2016/1056	Tendido eléctrico de alta tensión para parque industrial de Melo	Ejecución	19.741.439	0%	ene-2017	14	6	5	
FDI2016/1066	Reconstrucción y jerarquización del acceso oeste a la ciudad de Melo	Ejecución	20.212.183	57%	oct-2016	6	9	7	
FDI2017/1013	Mejora de la zona comercial de Río Branco	Ejecución	7.956.540	68%	jul-2017	6	1	0	
FDI2016/1038	Ampliación de los entubamientos de las aguas pluviales de la calle Luis Alberto de Herrera, entre las calles La Rosa y Darío Silva	Evaluación	22.928.994						
FDI2017/1052	Reacondicionamiento urbano y pavimentación calles del barrio Feder Rufino y Bella Vista	Evaluación	53.636.007						
FDI2017/1051	Reacondicionamiento y jerarquización vial lumínica de acceso ruta 8	Evaluación	38.075.620						
FDI2017/1050	Recuperación y optimización urbana de la zona este - cañalización de la cañada Juan Pablo	Evaluación	72.517.494						

Referencias:



La Intendencia ejecutó de acuerdo a lo planificado

La Intendencia tenía previsto ejecutar y no ejecutó

La Intendencia está fuera del plazo previsto de ejecución o no ha replanificado el proyecto
