
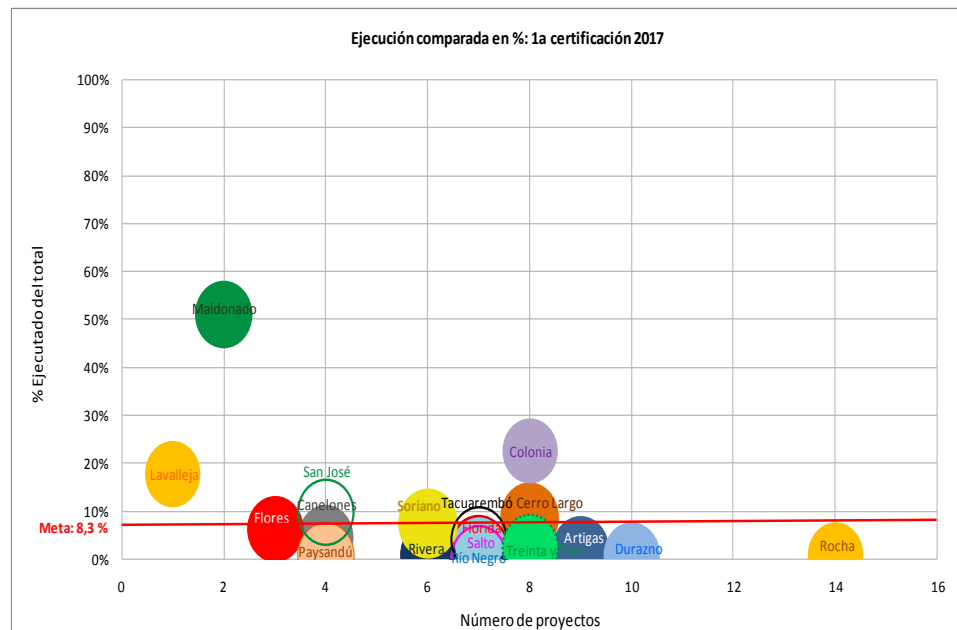
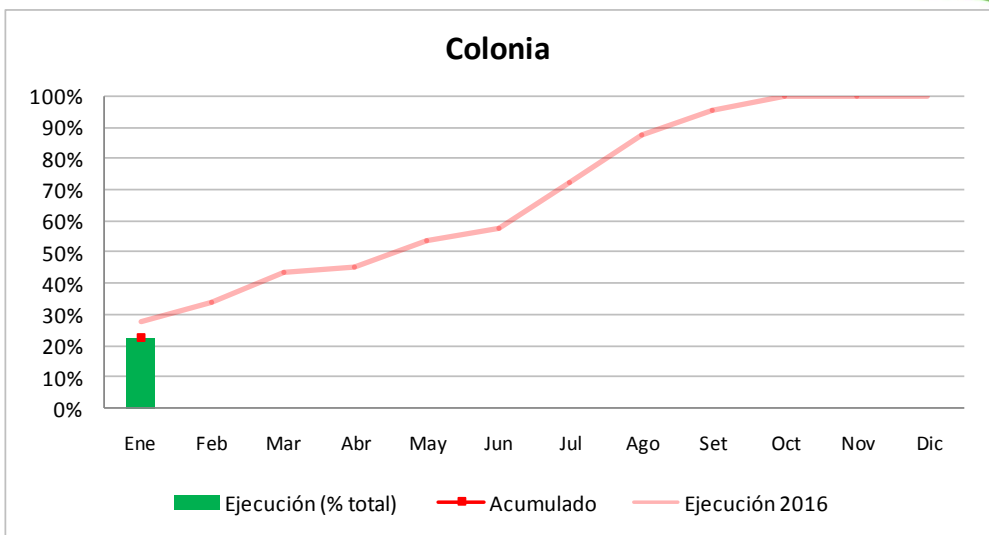


# Informe de Ejecución Fondo de Desarrollo del Interior - OPP

Correspondiente a la ejecución de enero 2017

**COLONIA**

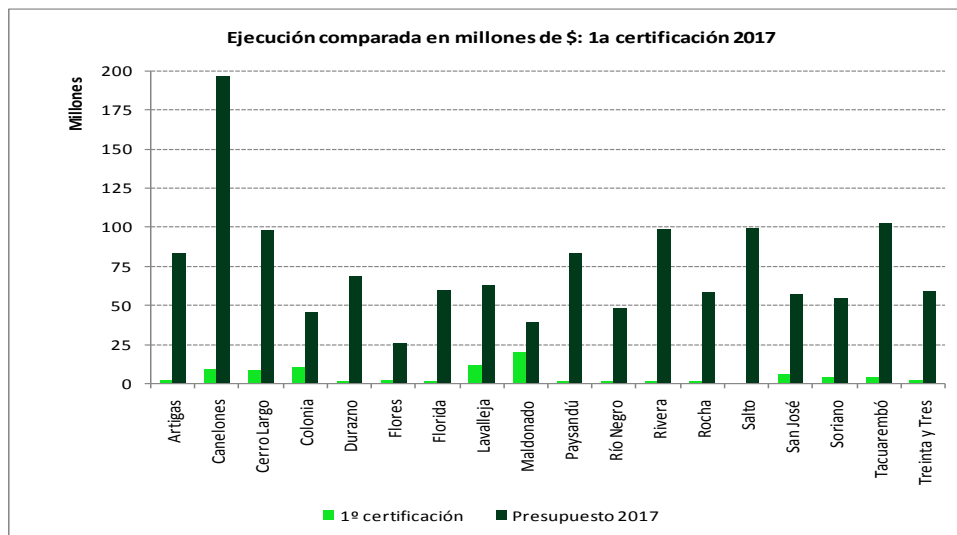

**Nota:** El gráfico muestra las certificaciones de ejecución otorgadas a la Intendencia en cada mes del año como porcentaje de la disponibilidad total ("Ejecución - % total"), el avance de todas las certificaciones de la Intendencia a la fecha ("Acumulado") y cómo fue el avance en la ejecución de la misma durante 2016 ("Ejecución 2016").

**Alícuota Intendencia en FDI: 3,4% Disponibilidad anual 2017: \$ 44.917.098**


- Total comprometido 2017: \$ 46.871.770
- Certificaciones acumuladas básico 2017: \$ 9.075.747
- Certificaciones acumuladas ajustadas 2017: \$ 10.153.873
- Saldo sin ejecutar básico: \$ 34.763.225
- Proyectos de mantenimiento/maquinaria (máx. permitido 20% de la disponibilidad anual): 8,3%

**Nota:** La línea roja representa el avance mínimo en la ejecución deseable para este mes, correspondiente al porcentaje que se habría acumulado a la fecha (8,33%) si ésta fuera perfectamente uniforme a lo largo del año (8,33% por certificación, por haber doce certificaciones en el presente año), meta que contribuiría al objetivo de evitar riesgos de una ejecución "tardía" en el año.

## Cartera de Proyectos – Evolución de la ejecución con respecto a lo planificado

Cod. proyecto	Nombre Proyecto	Estado Etapa Actual	Financiamiento FDI	% ejecución FDI	Fecha inicio previsto	Meses previstos de ejecución (incluye ampliaciones)	Meses reales de ejecución desde inicio previsto	Meses sin ejecución durante todo el período	Ejecución con respecto a lo planificado
PRY2012/1014	Programa Regional para el Desarrollo de la Quesería Artesanal - Fase II	En Ejecución	<b>2.372.844</b>	<b>82%</b>	jul-2013	36	40	2	
PRY2013/1077	Compra y acondicionamiento del ex cine Rex de la ciudad de Tarariras	En Ejecución	<b>25.737.614</b>	<b>70%</b>	set-2015	8	16	6	
PRY2015/1042	Asfaltado ruta 50 (PCR)	En Ejecución	<b>2.624.889</b>	<b>61%</b>	oct-2015	6	11	8	
PRY2015/1043	Remodelación de Avenida Rodó de Carmelo	En Ejecución	<b>22.907.746</b>	<b>100%</b>	abr-2016	12	9	1	
PRY2016/1019	Mantenimiento - Tratamiento bituminoso de sellado en calles de Tarariras	En Ejecución	<b>4.660.861</b>	<b>71%</b>	dic-2016	3	1	0	
PRY2016/1061	Pavimento e iluminación peatonal Rambla Cristóbal Colón en Colonia del Sacramento	En Ejecución	<b>12.230.259</b>	<b>0%</b>	sin iniciar	8	0	0	
PRY2016/1062	Remodelación Bvar. Rodó y Avda. José Pedro Varela de la ciudad de Rosario	En Ejecución	<b>14.208.388</b>	<b>0%</b>	sin iniciar	8	0	0	
PRY2016/1074	Acuerdo Interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal	En Ejecución	<b>2.666.280</b>	<b>0%</b>	sin iniciar	36	0	0	
PRY2016/1071	Construcción de pluviales y pavimentos en calle Gaydou y otras de Colonia Valdense	En Evaluación	<b>16.906.404</b>						
PRY2016/1076	Escuela Segura	En Evaluación	<b>2.778.857</b>						

Referencias:



La Intendencia ejecutó de acuerdo a lo planificado

La Intendencia tenía previsto ejecutar y no ejecutó

La intendencia está fuera del plazo previsto de ejecución o no ha replanificado el proyecto
