
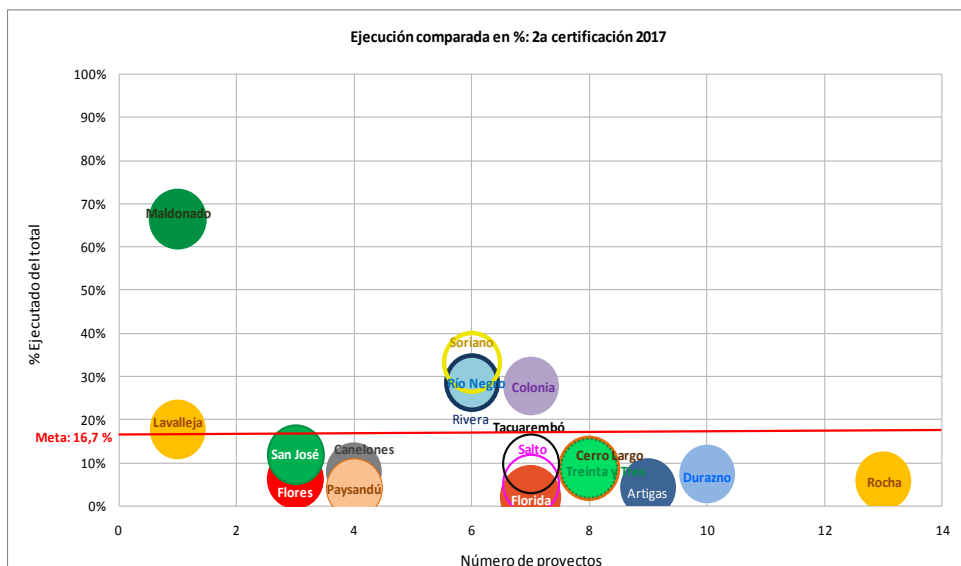
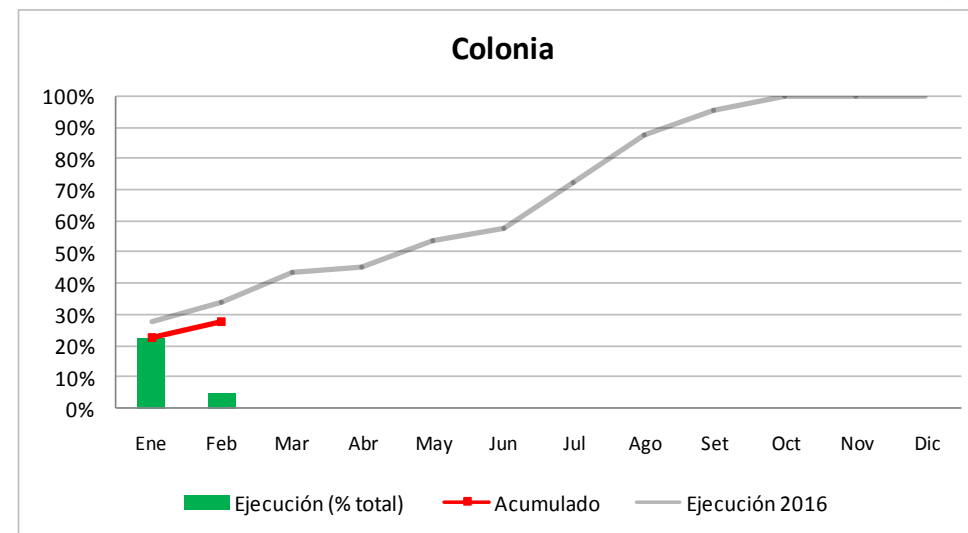


Informe de Ejecución Fondo de Desarrollo del Interior - OPP

Correspondiente a la ejecución de febrero 2017

COLONIA

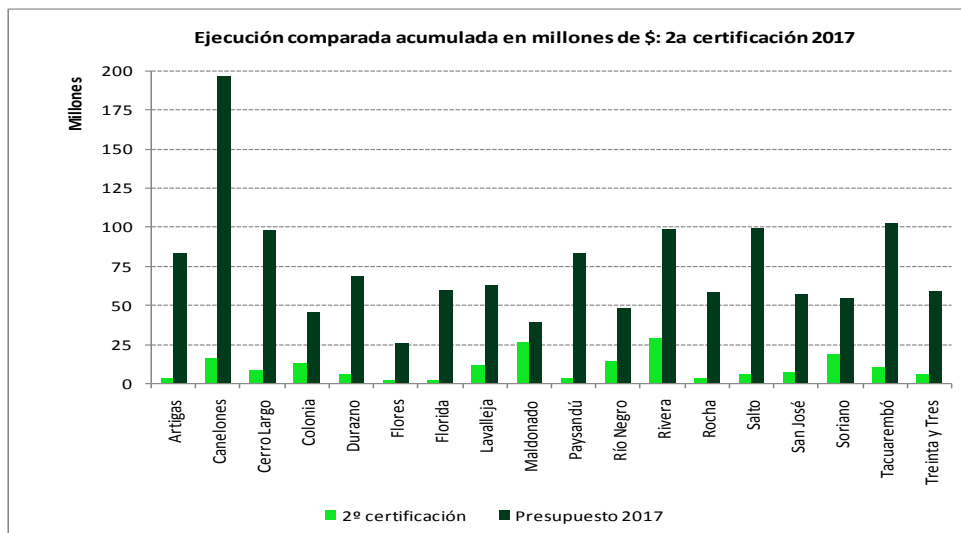

Nota: El gráfico muestra las certificaciones de ejecución otorgadas a la Intendencia en cada mes del año como porcentaje de la disponibilidad total ("Ejecución - % total"), el avance de todas las certificaciones de la Intendencia a la fecha ("Acumulado") y cómo fue el avance en la ejecución de la misma durante 2016 ("Ejecución 2016").

Alícuota Intendencia en FDI: 3,4% Disponibilidad anual 2017: \$ 44.917.098


- Total comprometido 2017: \$ 46.871.770
- Certificaciones acumuladas básico 2017: \$ 11.051.176
- Certificaciones acumuladas ajustadas 2017: \$ 12.466.446
- Saldo sin ejecutar básico: \$ 32.450.652
- Proyectos de mantenimiento/maquinaria (máx. permitido 20% de la disponibilidad anual): **8,3%**

Nota: La línea roja representa el avance mínimo en la ejecución deseable para este mes, correspondiente al porcentaje que se habría acumulado a la fecha (16,7%) si ésta fuera perfectamente uniforme a lo largo del año (8,33% por certificación, por haber doce certificaciones en el presente año), meta que contribuiría al objetivo de evitar riesgos de una ejecución "tardía" en el año.

Cartera de Proyectos – Evolución de la ejecución con respecto a lo planificado

| Cod. proyecto | Nombre Proyecto | Estado Etapa Actual | Financiamiento FDI | % ejecución FDI | Fecha inicio previsto | Meses previstos de ejecución (incluye ampliaciones) | Meses reales de ejecución desde inicio previsto | Meses sin ejecución durante todo el período | Ejecución con respecto a lo planificado |
|---------------|--|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---|---|---|---|
| PRY2012/1014 | Programa Regional para el Desarrollo de la Quesería Artesanal - Fase II | En Ejecución | 2.372.844 | 82% | jul-2013 | 36 | 41 | 3 | |
| PRY2013/1077 | Compra y acondicionamiento del ex cine Rex de la ciudad de Tarariras | En Ejecución | 25.737.614 | 78% | set-2015 | 8 | 17 | 6 | |
| PRY2015/1042 | Asfaltado ruta 50 (PCR) | En Ejecución | 2.624.889 | 61% | oct-2015 | 6 | 12 | 9 | |
| PRY2016/1019 | Mantenimiento - Tratamiento bituminoso de sellado en calles de Tarariras | En Ejecución | 4.660.861 | 71% | dic-2016 | 3 | 2 | 1 | |
| PRY2016/1061 | Pavimento e iluminación peatonal Rambla Cristóbal Colón en Colonia del Sacramento | En Ejecución | 12.230.259 | 0% | abril-2017 | 8 | 0 | 0 | |
| PRY2016/1062 | Remodelación Bvar. Rodó y Avda. José Pedro Varela de la ciudad de Rosario | En Ejecución | 14.208.388 | 0% | sin iniciar | 8 | 0 | 0 | |
| PRY2016/1074 | Acuerdo Interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal | En Ejecución | 2.666.280 | 0% | sin iniciar | 36 | 0 | 0 | |
| PRY2016/1071 | Construcción de pluviales y pavimentos en calle Gaydou y otras de Colonia Valdense | En Evaluación | 16.906.404 | | | | | | |
| PRY2016/1076 | Escuela Segura | En Evaluación | 2.778.857 | | | | | | |

Referencias:



La Intendencia ejecutó de acuerdo a lo planificado

La Intendencia tenía previsto ejecutar y no ejecutó

La intendencia está fuera del plazo previsto de ejecución o no ha replanificado el proyecto
