
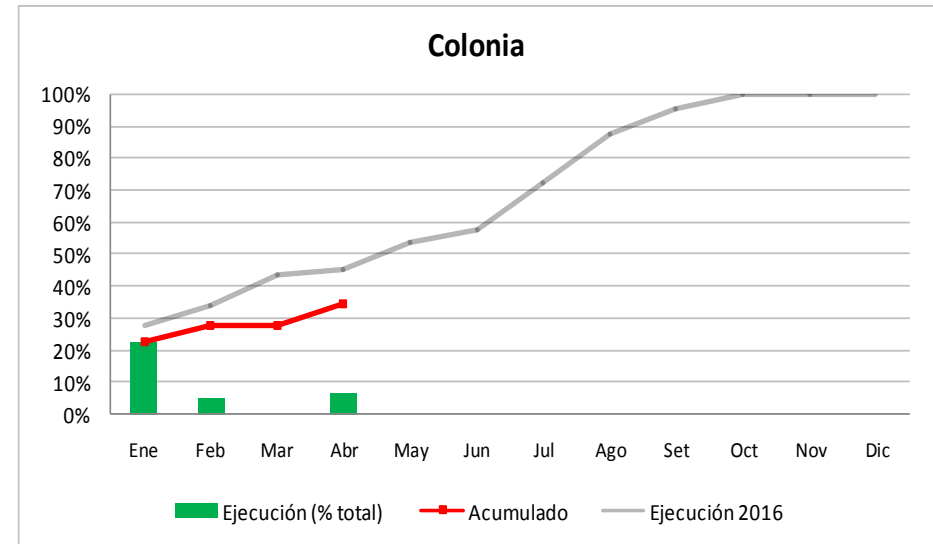



# Informe de Ejecución Fondo de Desarrollo del Interior - OPP

Correspondiente a la ejecución de abril 2017

COLONIA

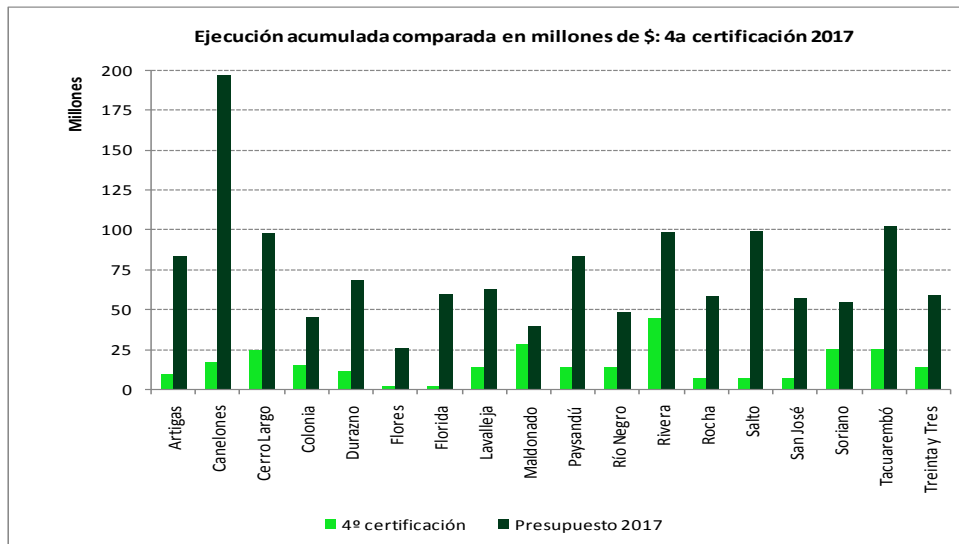

**Nota:** El gráfico muestra las certificaciones de ejecución otorgadas a la Intendencia en cada mes del año como porcentaje de la disponibilidad total ("Ejecución - % total"), el avance de todas las certificaciones de la Intendencia a la fecha ("Acumulado") y cómo fue el avance en la ejecución de la misma durante 2016 ("Ejecución 2016").

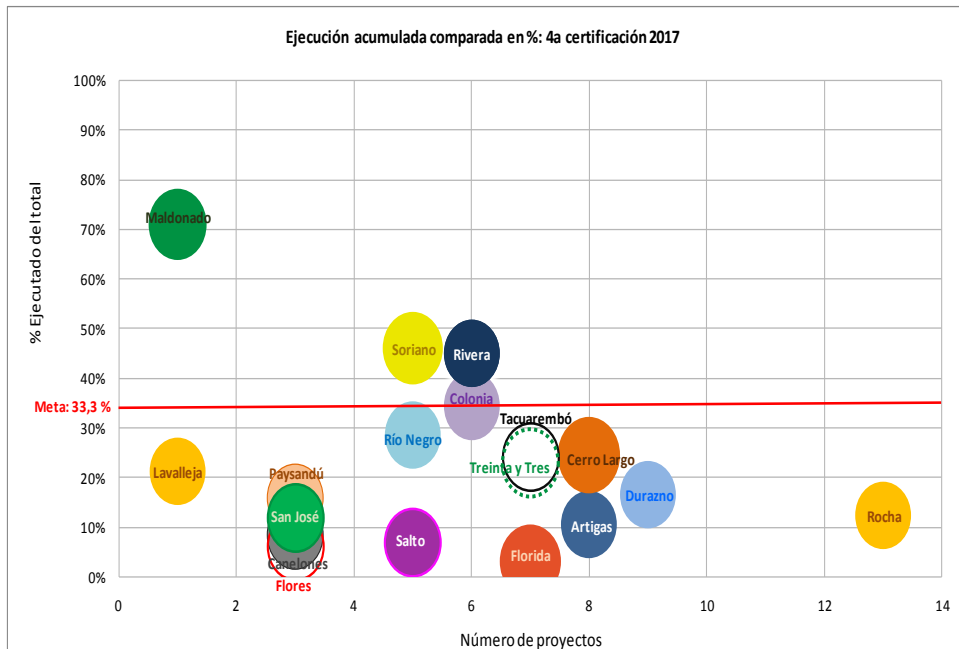

**Nota:** La línea roja representa el avance mínimo en la ejecución deseable para este mes, correspondiente al porcentaje que se habría acumulado a la fecha (33,3%) si ésta fuera perfectamente uniforme a lo largo del año (8,33% por certificación, por haber doce certificaciones en el presente año), meta que contribuiría al objetivo de evitar riesgos de una ejecución "tardía" en el año.

**Alícuota Intendencia en FDI: 3,4% Disponibilidad anual 2017: \$ 44.917.098**

- Total comprometido 2017: \$ 39.414.169
- Certificaciones acumuladas básico 2017: \$ 13.599.516
- Certificaciones acumuladas ajustadas 2017: \$ 15.451.742
- Saldo sin ejecutar básico: \$ 29.465.356
- Proyectos de mantenimiento/maquinaria (máx. permitido 20% de la disponibilidad anual): 18,7%

## Cartera de Proyectos – Evolución de la ejecución con respecto a lo planificado

Cod. proyecto	Nombre Proyecto	Estado Etapa Actual	Financiamiento FDI	% ejecución FDI	Fecha inicio previsto	Meses previstos de ejecución (incluye ampliaciones)	Meses reales de ejecución desde inicio previsto	Meses sin ejecución durante todo el período	Ejecución con respecto a lo planificado
PRY2012/1014	Programa Regional para el Desarrollo de la Quesería Artesanal - Fase II	Ejecución	<b>2.372.844</b>	<b>82%</b>	jul-2013	36	43	5	
PRY2013/1077	Compra y acondicionamiento del ex cine Rex de la ciudad de Tarariras	Ejecución	<b>25.737.614</b>	<b>78%</b>	set-2015	8	19	7	
PRY2015/1042	Asfaltado ruta 50 (PCR)	Ejecución	<b>2.624.889</b>	<b>61%</b>	oct-2015	6	14	11	
PRY2016/1019	Mantenimiento - Tratamiento bituminoso de sellado en calles de Tarariras	Ejecución	<b>4.660.861</b>	<b>71%</b>	dic-2016	3	4	3	
PRY2016/1061	Pavimento e iluminación peatonal Rambla Cristóbal Colón en Colonia del Sacramento	Ejecución	<b>12.230.260</b>	<b>0%</b>	abril-2017	8	0	1	
PRY2016/1062	Remodelación Bvar. Rodó y Avda. José Pedro Varela de la ciudad de Rosario	Ejecución	<b>14.901.647</b>	<b>0%</b>	sin iniciar	8	0	0	
PRY2016/1074	Acuerdo Interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal	Ejecución	<b>2.666.280</b>	<b>0%</b>	sin iniciar	36	0	0	

**Referencias:**



La Intendencia ejecutó de acuerdo a lo planificado

La Intendencia tenía previsto ejecutar y no ejecutó

La intendencia está fuera del plazo previsto de ejecución o no ha replanificado el proyecto
