
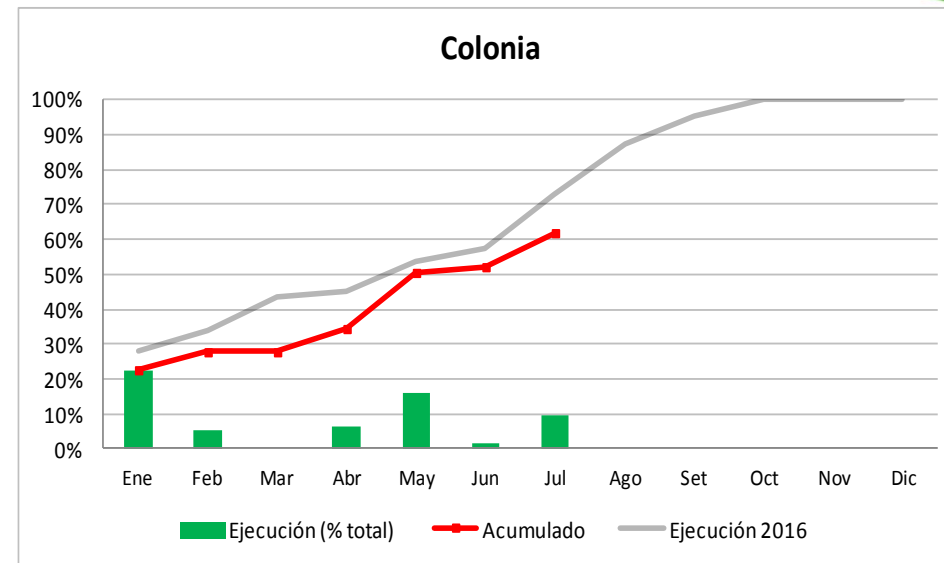



Informe de Ejecución Fondo de Desarrollo del Interior - OPP

Correspondiente a la ejecución de julio 2017

COLONIA

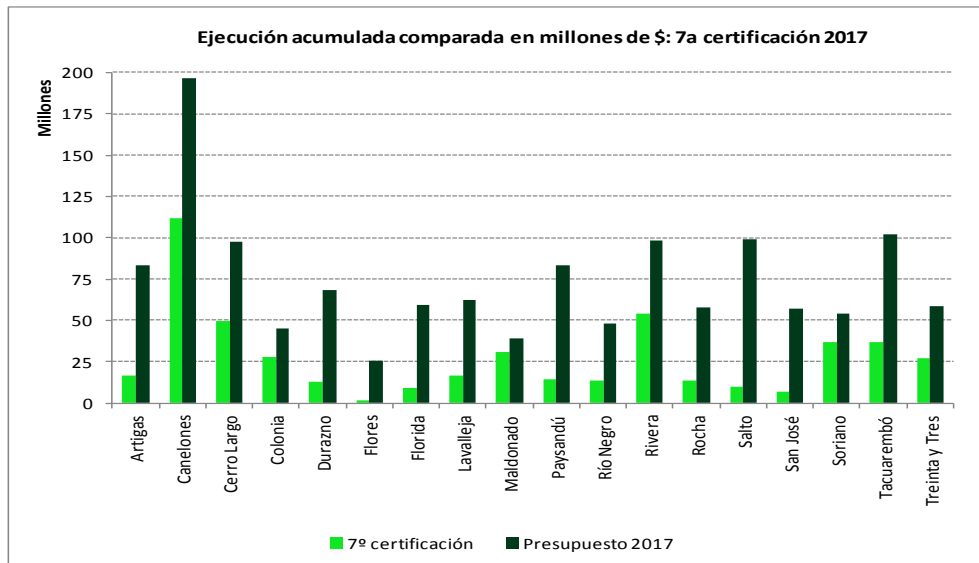

Nota: El gráfico muestra las certificaciones de ejecución otorgadas a la Intendencia en cada mes del año como porcentaje de la disponibilidad total ("Ejecución - % total"), el avance de todas las certificaciones de la Intendencia a la fecha ("Acumulado") y cómo fue el avance en la ejecución de la misma durante 2016 ("Ejecución 2016").

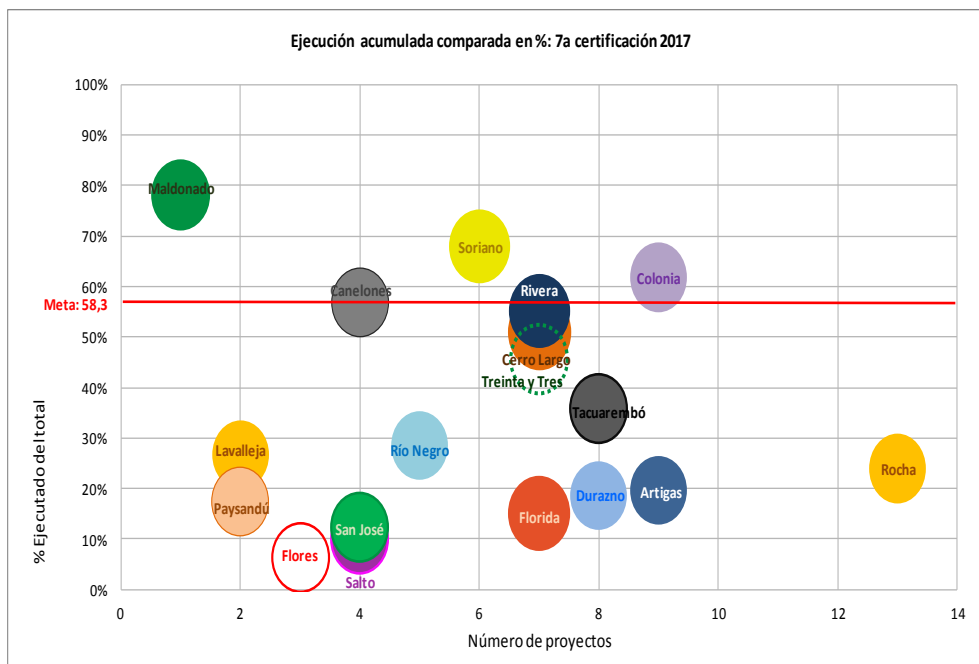

Nota: La línea roja representa el avance mínimo en la ejecución deseable para este mes, correspondiente al porcentaje que se habría acumulado a la fecha (58,3%) si ésta fuera perfectamente uniforme a lo largo del año (8,33% por certificación, por haber doce certificaciones en el presente año), meta que contribuiría al objetivo de evitar riesgos de una ejecución "tardía" en el año.

Alícuota Intendencia en FDI: 3,4% Disponibilidad anual 2017: \$ 44.917.098

- Total comprometido 2017: \$ 53.098.497
- Certificaciones acumuladas básico 2017: \$ 25.030.328
- Certificaciones acumuladas ajustadas 2017: \$ 27.778.679
- Saldo sin ejecutar básico: \$ 17.138.419
- Proyectos de mantenimiento/maquinaria (máx. permitido 20% de la disponibilidad anual): 18,7%

Cartera de Proyectos – Evolución de la ejecución con respecto a lo planificado

Cod. proyecto	Nombre Proyecto	Estado Etapa Actual	Financiamiento FDI	% ejecución FDI	Fecha inicio previsto	Meses previstos de ejecución (incluye ampliaciones)	Meses reales de ejecución desde inicio previsto	Meses sin ejecución durante todo el período	Ejecución con respecto a lo planificado
FDI2012/1014	Programa Regional para el Desarrollo de la Quesería Artesanal - Fase II	Ejecución	2.072.353	100%	jul-2013	36	46	6	
FDI2013/1077	Compra y acondicionamiento del ex cine Rex de la ciudad de Tarariras	Ejecución	27.436.537	97%	set-2015	8	22	7	
FDI2016/1019	Mantenimiento - Tratamiento bituminoso de sellado en calles de Tarariras	Ejecución	9.321.722	100%	dic-2016	3	7	4	
FDI2016/1061	Pavimento e iluminación peatonal Rambla Cristóbal Colón en Colonia del Sacramento	Ejecución	12.230.260	7%	abr-2017	8	3	3	
FDI2016/1062	Remodelación Bvar. Rodó y Avda. José Pedro Varela de la ciudad de Rosario	Ejecución	19.828.541	2%	set-2017	8	0	0	
FDI2016/1071	Construcción de pluviales y pavimento en calle Gaydou y otras de Colonia Valdense	Ejecución	10.409.684	0%	nov-17	6	0	0	
FDI2016/1074	Acuerdo Interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal	Ejecución	2.666.280	0%	sin iniciar	36	0	0	
FDI2016/1076	Escuela Segura	Ejecución	3.753.620	0%	jun-17	8	2	1	

Referencias:



La Intendencia ejecutó de acuerdo a lo planificado

La Intendencia tenía previsto ejecutar y no ejecutó

La Intendencia está fuera del plazo previsto de ejecución o no ha replanificado el proyecto
