
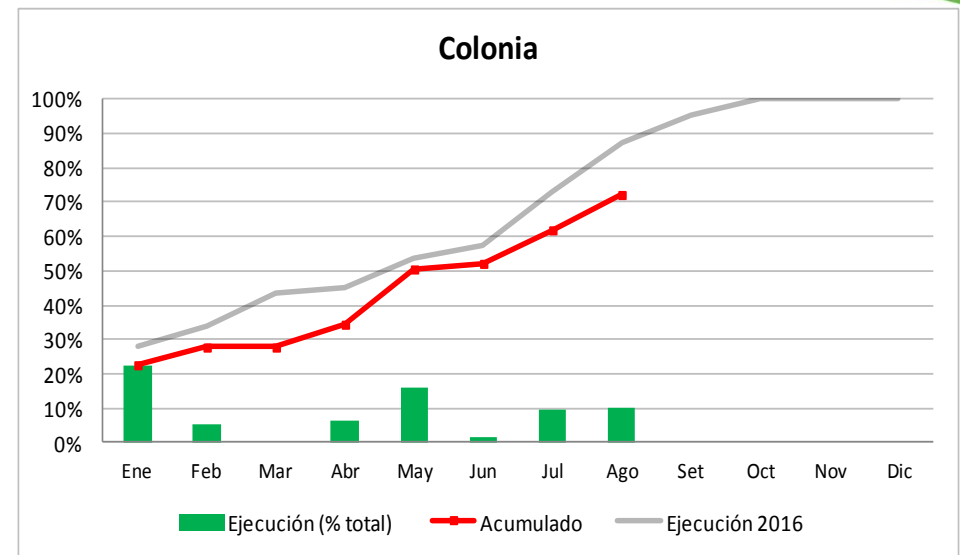



Informe de Ejecución Fondo de Desarrollo del Interior - OPP

Correspondiente a la ejecución de agosto 2017

COLONIA

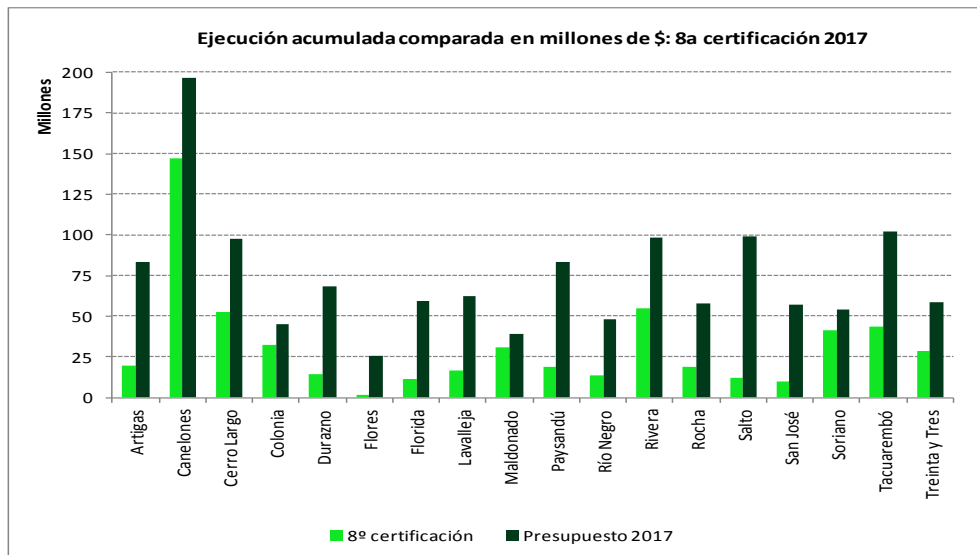

Nota: El gráfico muestra las certificaciones de ejecución otorgadas a la Intendencia en cada mes del año como porcentaje de la disponibilidad total ("Ejecución - % total"), el avance de todas las certificaciones de la Intendencia a la fecha ("Acumulado") y cómo fue el avance en la ejecución de la misma durante 2016 ("Ejecución 2016").

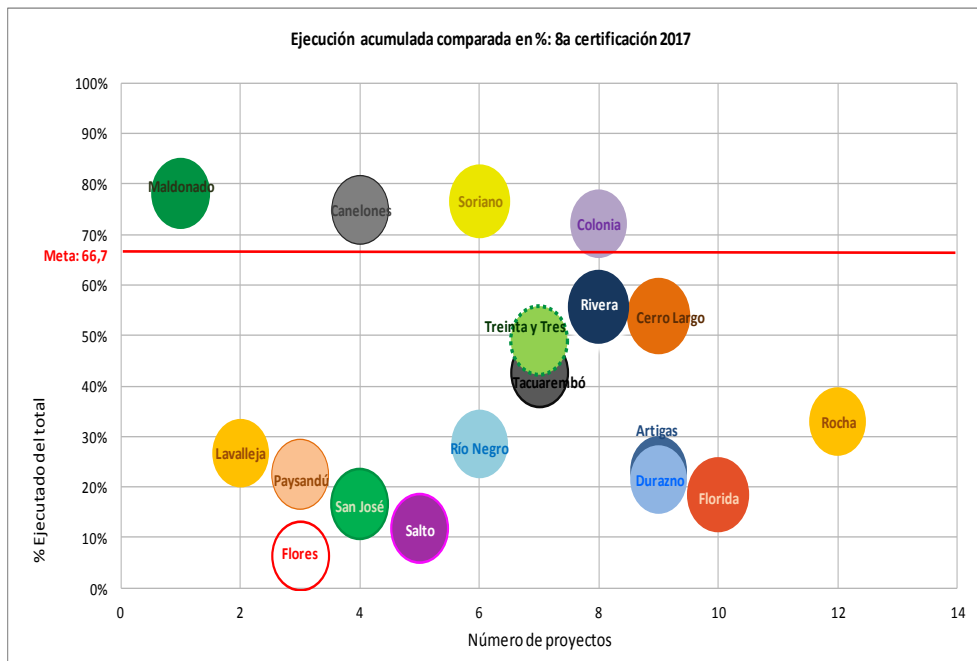

Nota: La línea roja representa el avance mínimo en la ejecución deseable para este mes, correspondiente al porcentaje que se habría acumulado a la fecha (66,7%) si ésta fuera perfectamente uniforme a lo largo del año (8,33% por certificación, por haber doce certificaciones en el presente año), meta que contribuiría al objetivo de evitar riesgos de una ejecución "tardía" en el año.




Alícuota Intendencia en FDI: 3,4% Disponibilidad anual 2017: \$ 44.917.098

- Total comprometido 2017: \$ 53.087.202
- Certificaciones acumuladas básico 2017: \$ 29.554.330
- Certificaciones acumuladas ajustadas 2017: \$ 32.396.351
- Saldo sin ejecutar: \$ 12.520.747
- Proyectos de mantenimiento/maquinaria (máx. permitido 20% de la disponibilidad anual): 18,7%

Cartera de Proyectos – Evolución de la ejecución con respecto a lo planificado

Cod. proyecto	Nombre Proyecto	Estado Etapa Actual	Financiamiento FDI	% ejecución FDI	Fecha inicio previsto	Meses previstos de ejecución (incluye ampliaciones)	Meses reales de ejecución desde inicio previsto	Meses sin ejecución durante todo el período	Ejecución con respecto a lo planificado
FDI2012/1014	Programa Regional para el Desarrollo de la Quesería Artesanal - Fase II	Ejecución	2.072.353	100%	jul-2013	36	47	7	
FDI2013/1077	Compra y acondicionamiento del ex cine Rex de la ciudad de Tarariras	Ejecución	27.436.537	97%	set-2015	8	23	8	
FDI2016/1061	Pavimento e iluminación peatonal Rambla Cristóbal Colón en Colonia del Sacramento	Ejecución	12.230.260	16%	abr-2017	8	4	3	
FDI2016/1062	Remodelación Bvar. Rodó y Avda. José Pedro Varela de la ciudad de Rosario	Ejecución	19.828.541	19%	set-2017	8	0	0	
FDI2016/1071	Construcción de pluviales y pavimento en calle Gaydou y otras de Colonia Valdense	Ejecución	10.409.684	0%	nov-17	6	0	0	
FDI2016/1074	Acuerdo Interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal	Ejecución	2.666.280	0%	sin iniciar	36	0	0	
FDI2016/1076	Escuela Segura	Ejecución	3.753.620	0%	jun-17	8	3	2	

Referencias:

-  La Intendencia ejecutó de acuerdo a lo planificado
-  La Intendencia tenía previsto ejecutar y no ejecutó
-  La Intendencia está fuera del plazo previsto de ejecución o no ha replanificado el proyecto
