
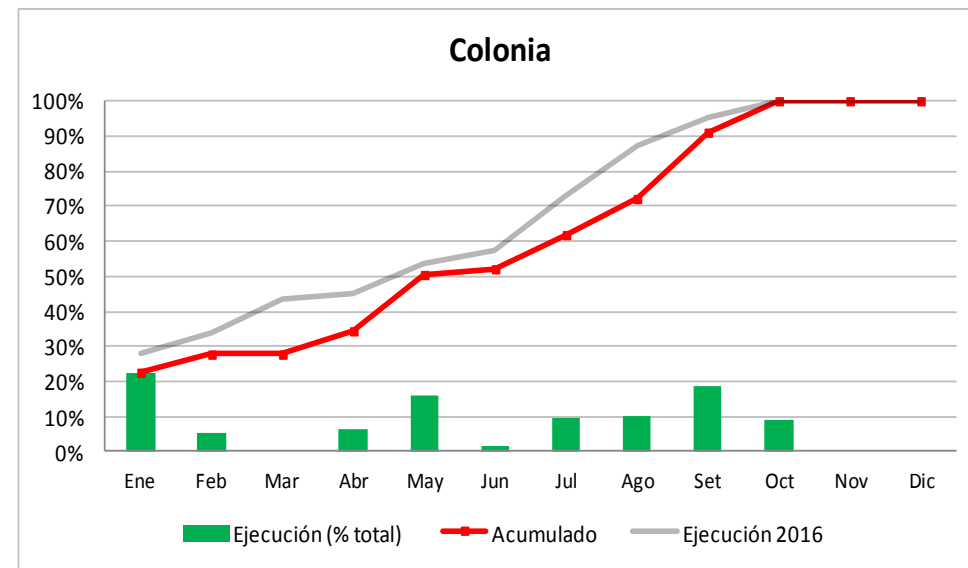



Informe de Ejecución Fondo de Desarrollo del Interior - OPP

Correspondiente a la ejecución de diciembre 2017

COLONIA

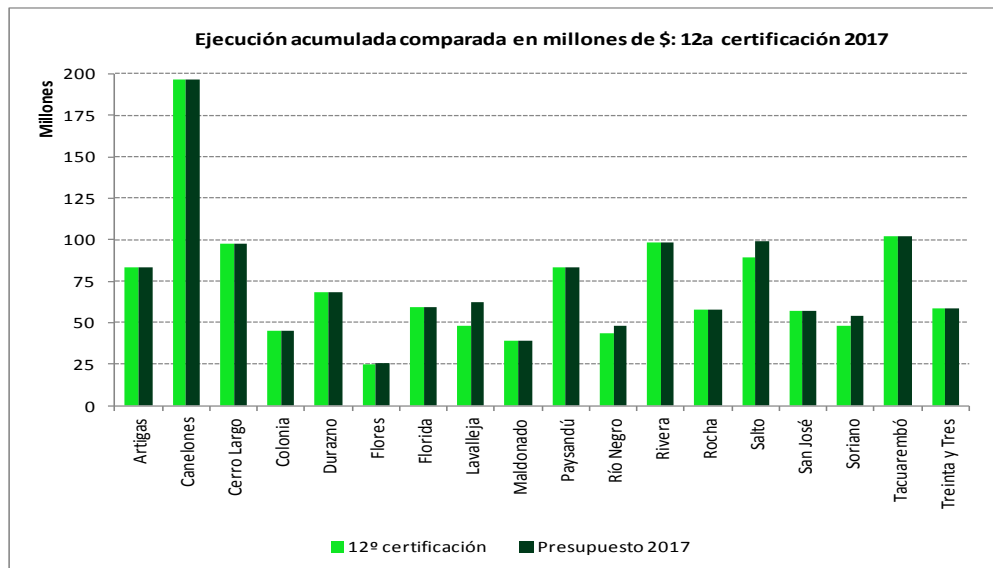

Nota: El gráfico muestra las certificaciones de ejecución otorgadas a la Intendencia en cada mes del año como porcentaje de la disponibilidad total ("Ejecución - % total"), el avance de todas las certificaciones de la Intendencia a la fecha ("Acumulado") y cómo fue el avance en la ejecución de la misma durante 2016 ("Ejecución 2016").

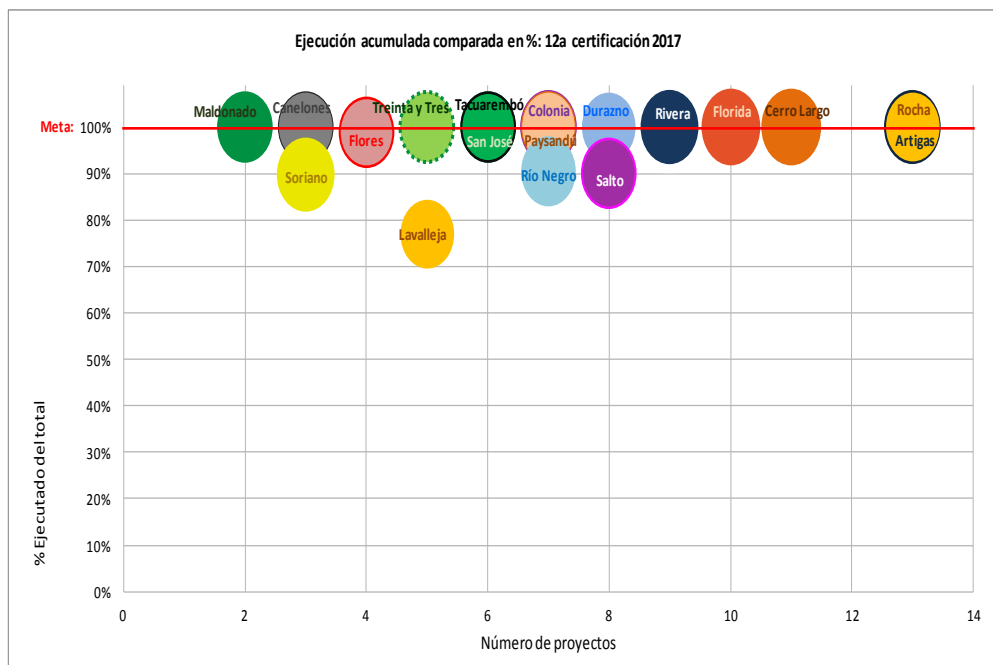

Nota: La línea roja representa el avance mínimo en la ejecución deseable para este mes, correspondiente al porcentaje que se habría acumulado a la fecha (100%) si ésta fuera perfectamente uniforme a lo largo del año (8,33% por certificación, por haber doce certificaciones en el presente año), meta que contribuiría al objetivo de evitar riesgos de una ejecución "tardía" en el año.

Alícuota Intendencia en FDI: 3,4% Disponibilidad anual 2017: \$ 44.917.098

- Total comprometido 2017: \$ 50.492.511
- Certificaciones acumuladas básico 2017: \$ 41.859.183
- Certificaciones acumuladas ajustadas 2017: \$ 44.917.098
- Saldo sin ejecutar: \$ 0
- Proyectos de mantenimiento/maquinaria (máx. permitido 20% de la disponibilidad anual): 18,7%

Cartera de Proyectos – Evolución de la ejecución con respecto a lo planificado

Cod. proyecto	Nombre Proyecto	Estado Etapa Actual	Financiamiento FDI	% ejecución FDI	Fecha inicio previsto	Meses previstos de ejecución (incluye ampliaciones)	Meses reales de ejecución desde inicio previsto	Meses sin ejecución durante todo el período	Ejecución con respecto a lo planificado
FDI2016/1061	Pavimento e iluminación peatonal Rambla Cristóbal Colón en Colonia del Sacramento	Ejecución	15.908.564	25%	abr-2017	8	8	6	
FDI2016/1062	Remodelación Bvar. Rodó y Avda. José Pedro Varela de la ciudad de Rosario	Ejecución	14.954.681	53%	set-2017	8	4	2	
FDI2016/1071	Construcción de pluviales y pavimento en calle Gaydou y otras de Colonia Valdense	Ejecución	6.806.814	8%	nov-2017	6	2	2	
FDI2016/1074	Acuerdo Interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal	Ejecución	2.666.281	0%	ene-2018	24	0	0	
FDI2016/1076	Escuela Segura	Ejecución	3.753.620	0%	jun-2017	8	7	6	
FDI2017/1068	Rehabilitación camino Calera de las Huérfanas	Ejecución	6.658.280	71%	jun-2017	4	7	5	
FDI2017/1076	Remodelación de calle Atanasio Sierra de la ciudad de Colonia	Evaluación	17.462.939						

Referencias:



La Intendencia ejecutó de acuerdo a lo planificado

La Intendencia tenía previsto ejecutar y no ejecutó

La Intendencia está fuera del plazo previsto de ejecución o no ha replanificado el proyecto
