
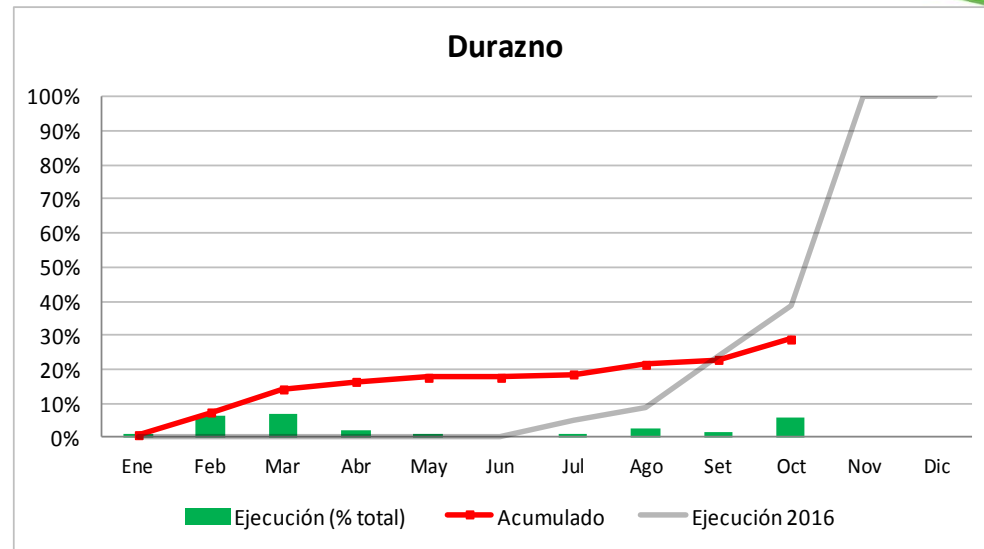



Informe de Ejecución Fondo de Desarrollo del Interior - OPP

Correspondiente a la ejecución de octubre 2017

DURAZNO

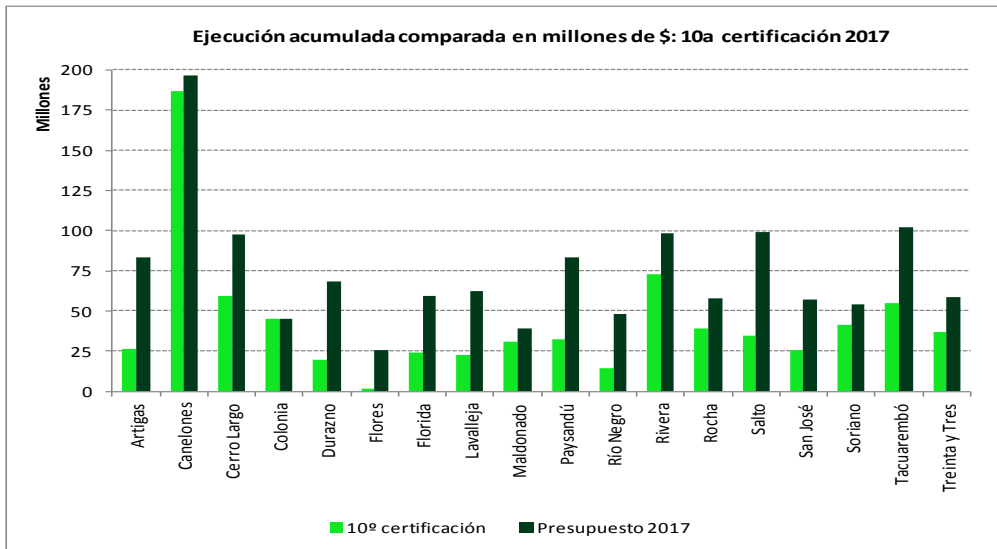

Nota: El gráfico muestra las certificaciones de ejecución otorgadas a la Intendencia en cada mes del año como porcentaje de la disponibilidad total ("Ejecución - % total"), el avance de todas las certificaciones de la Intendencia a la fecha ("Acumulado") y cómo fue el avance en la ejecución de la misma durante 2016 ("Ejecución 2016").

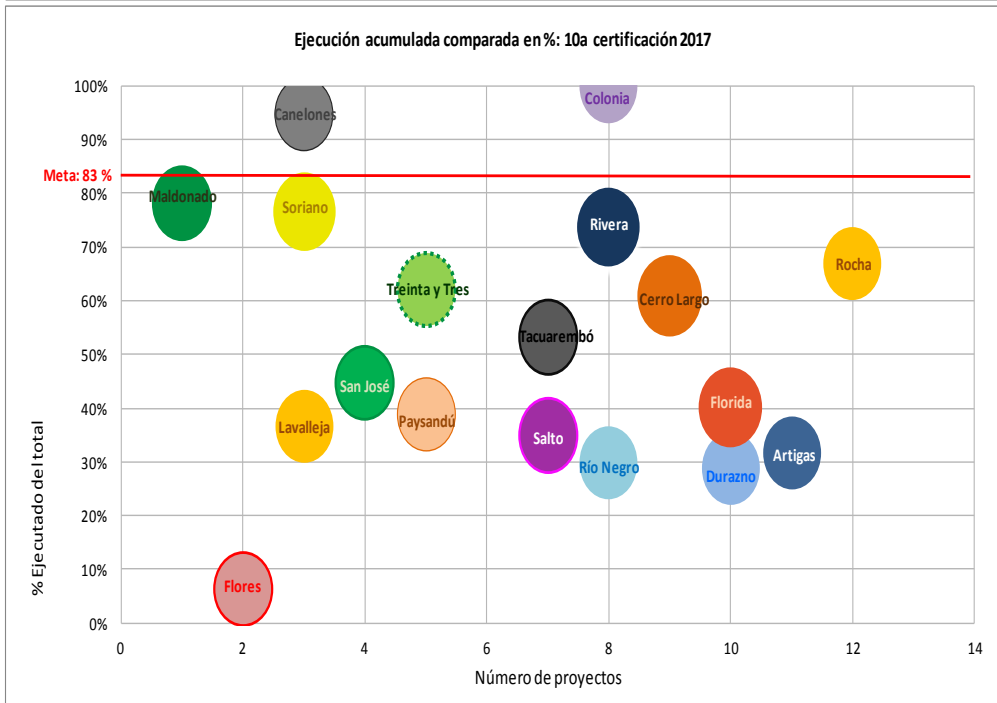

Nota: La línea roja representa el avance mínimo en la ejecución deseable para este mes, correspondiente al porcentaje que se habría acumulado a la fecha (83%) si ésta fuera perfectamente uniforme a lo largo del año (8,33% por certificación, por haber doce certificaciones en el presente año), meta que contribuiría al objetivo de evitar riesgos de una ejecución "tardía" en el año.

Alícuota Intendencia en FDI: 5,1% Disponibilidad anual 2017: \$ 68.311.420

- Total comprometido 2017: \$ 67.734.916
- Certificaciones acumuladas básico 2017: \$ 19.235.381
- Certificaciones acumuladas ajustadas 2017: \$ 19.705.621
- Saldo sin ejecutar: \$ 48.605.799
- Proyectos de mantenimiento/maquinaria (máx. permitido 20% de la disponibilidad anual): 10,7%

Cartera de Proyectos – Evolución de la ejecución con respecto a lo planificado

Cod. proyecto	Nombre Proyecto	Estado Etapa Actual	Financiamiento FDI	% ejecución FDI	Fecha inicio previsto	Meses previstos de ejecución (incluye ampliaciones)	Meses reales de ejecución desde inicio previsto	Meses sin ejecución durante todo el período	Ejecución con respecto a lo planificado
FDI2016/1004	Rehabilitación de pavimentos en barrio Plaza Artigas de la ciudad de Durazno	Ejecución	13.071.339	100%	set-2016	4	14	7	
FDI2016/1014	Remodelación Plaza Artigas en Villa del Carmen	Ejecución	12.603.305	86%	set-2016	6	14	7	
FDI2016/1021	Consolidación urbana en barrios de la ciudad de Sarandí del Yí	Ejecución	20.130.981	67%	set-2016	8	14	7	
FDI2016/1022	Reparación y construcción alcantarilla H sobre Aº Sarandí	Ejecución	6.458.871	75%	oct-2016	6	14	9	
FDI2016/1034	Adquisición de maquinaria Durazno	Ejecución	41.333.293	39%	oct-2016	24	13	no aplica	
FDI2016/1048	Circunvalación Este de la ciudad de Durazno	Ejecución	53.156.515	8%	oct-2016	12	13	8	
FDI2016/1051	Fondo rotatorio para microempresas del departamento	Ejecución	4.200.000	88%	dic-2016	24	11	9	
FDI2016/1068	Mejora de eficiencia energética y alumbrado público en la ciudad de Durazno	Ejecución	6.724.775	22%	ago-2017	3	2	1	
FDI2017/1009	Construcción de dos alcantarillas tipo H y terraplenado en la calle Instrucciones del año XIII de la ciudad de Durazno	Ejecución	11.504.284	0%	oct-2017	6	1	1	
FDI2017/1024	Gimnasio y centro barrial de Santa Bernardina	Ejecución	14.507.119	6%	set-2017	6	2	1	
FDI2016/1055	Construcción de Sala de Extracción de miel en San Jorge y compra de materiales para los apiarios	Evaluación	2.850.000						

Referencias:



La Intendencia ejecutó de acuerdo a lo planificado

La Intendencia tenía previsto ejecutar y no ejecutó

La Intendencia está fuera del plazo previsto de ejecución o no ha replanificado el proyecto
