
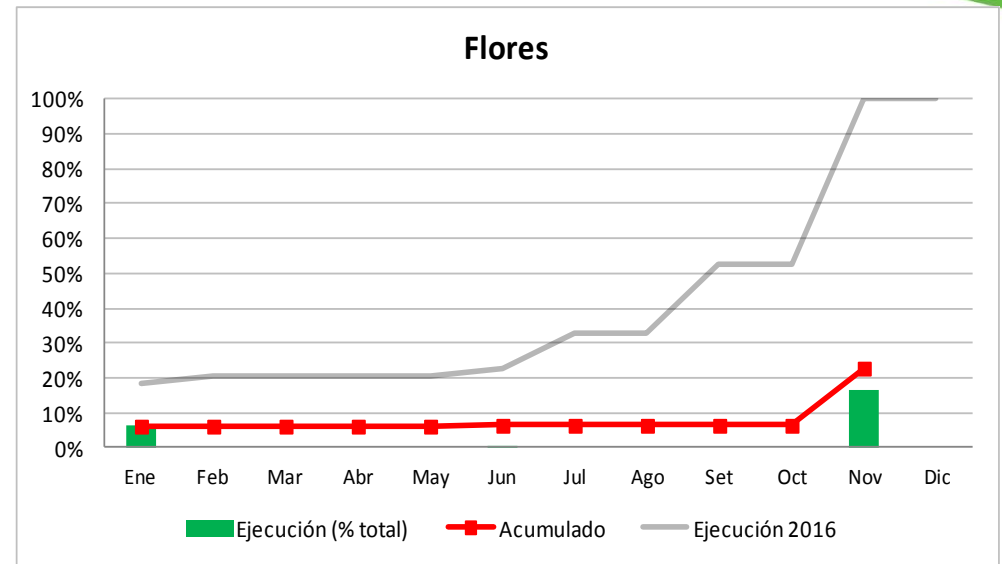



Informe de Ejecución Fondo de Desarrollo del Interior - OPP

Correspondiente a la ejecución de noviembre 2017

FLORES

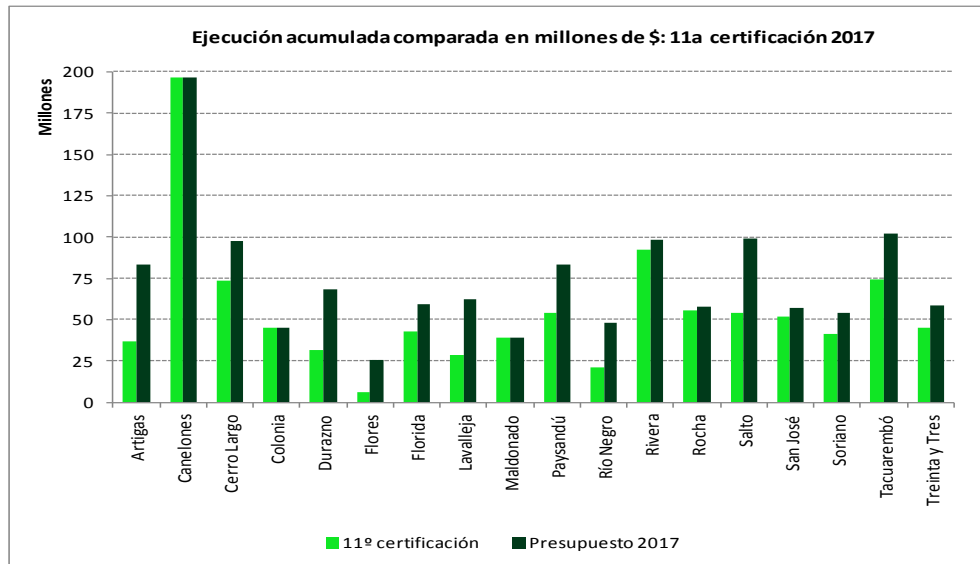

Nota: El gráfico muestra las certificaciones de ejecución otorgadas a la Intendencia en cada mes del año como porcentaje de la disponibilidad total ("Ejecución - % total"), el avance de todas las certificaciones de la Intendencia a la fecha ("Acumulado") y cómo fue el avance en la ejecución de la misma durante 2016 ("Ejecución 2016").

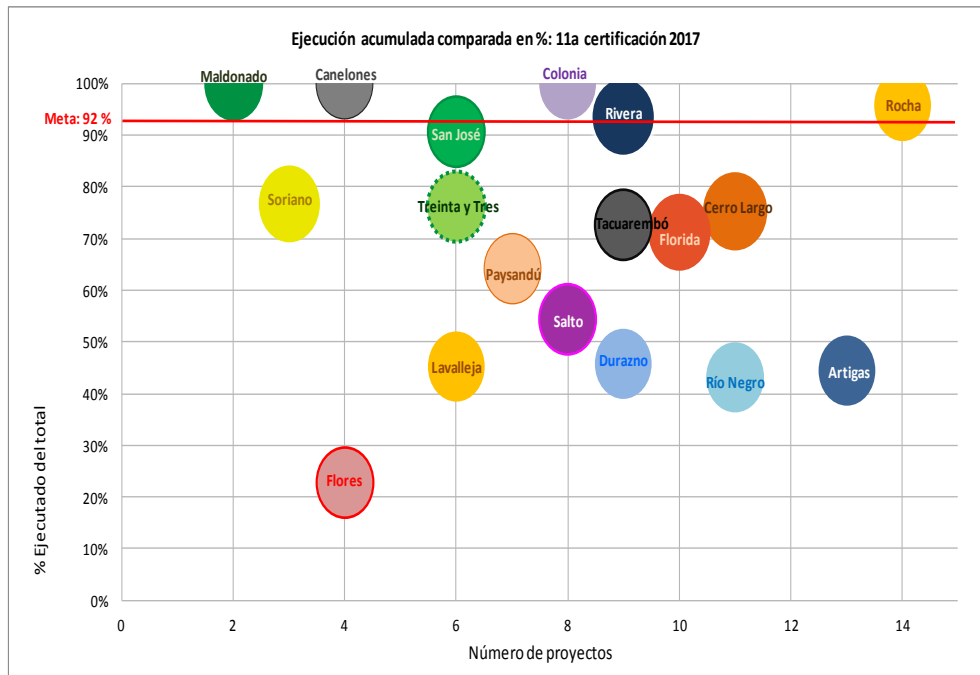

Alícuota Intendencia en FDI: 1,9% Disponibilidad anual 2017: \$ 25.265.868

- Total comprometido 2017: \$ 25.876.272
- Certificaciones acumuladas básico 2017: \$ 5.454.798
- Certificaciones acumuladas ajustadas 2017: \$ 5.751.845
- Saldo sin ejecutar: \$ 19.514.023
- Proyectos de mantenimiento/maquinaria (máx. permitido 20% de la disponibilidad anual): 0%


Nota: La línea roja representa el avance mínimo en la ejecución deseable para este mes, correspondiente al porcentaje que se habría acumulado a la fecha (92%) si ésta fuera perfectamente uniforme a lo largo del año (8,33% por certificación, por haber doce certificaciones en el presente año), meta que contribuiría al objetivo de evitar riesgos de una ejecución "tardía" en el año.

Cartera de Proyectos – Evolución de la ejecución con respecto a lo planificado

FLORES

Cod. proyecto	Nombre Proyecto	Estado Etapa Actual	Financiamiento FDI	% ejecución FDI	Fecha inicio previsto	Meses previstos de ejecución (incluye ampliaciones)	Meses reales de ejecución desde inicio previsto	Meses sin ejecución durante todo el período	Ejecución con respecto a lo planificado
FDI2015/1044	Recargo ex ruta 57 desde km 164 de ruta 3 hasta tramo 53 (PCR)	Ejecución	8.833.439	96%	set-2015	7	25	20	
FDI2016/1074	Acuerdo Interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal	Ejecución	503.073	0%	ene-2018	24	0	0	
FDI2017/1008	Consolidación urbana cuadrante sureste de la ciudad de Trinidad	Ejecución	46.849.056	9%	oct-2017	18	2	1	
FDI2017/1082	Plan de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado público	Ejecución	7.929.351	0%	dic-2017	20	0	0	

Referencias:



La Intendencia ejecutó de acuerdo a lo planificado

La Intendencia tenía previsto ejecutar y no ejecutó

La intendencia está fuera del plazo previsto de ejecución o no ha replanificado el proyecto
