
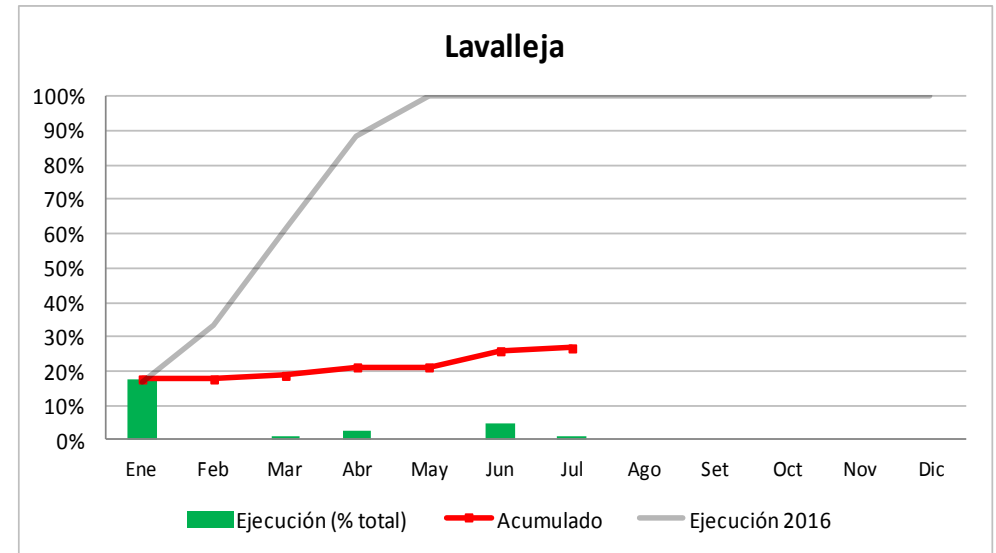



# Informe de Ejecución Fondo de Desarrollo del Interior - OPP

Correspondiente a la ejecución de julio 2017

LAVALLEJA

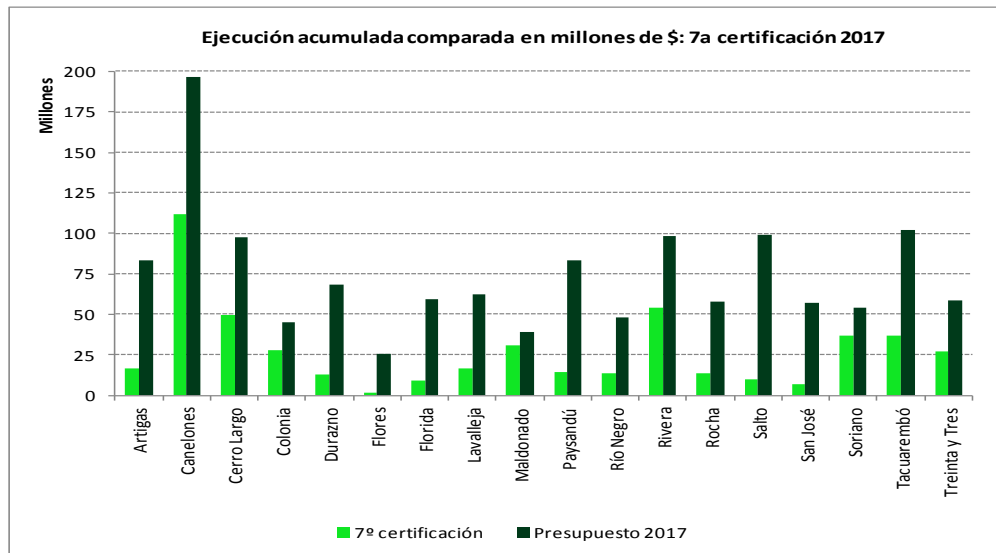

**Nota:** El gráfico muestra las certificaciones de ejecución otorgadas a la Intendencia en cada mes del año como porcentaje de la disponibilidad total ("Ejecución - % total"), el avance de todas las certificaciones de la Intendencia a la fecha ("Acumulado") y cómo fue el avance en la ejecución de la misma durante 2016 ("Ejecución 2016").

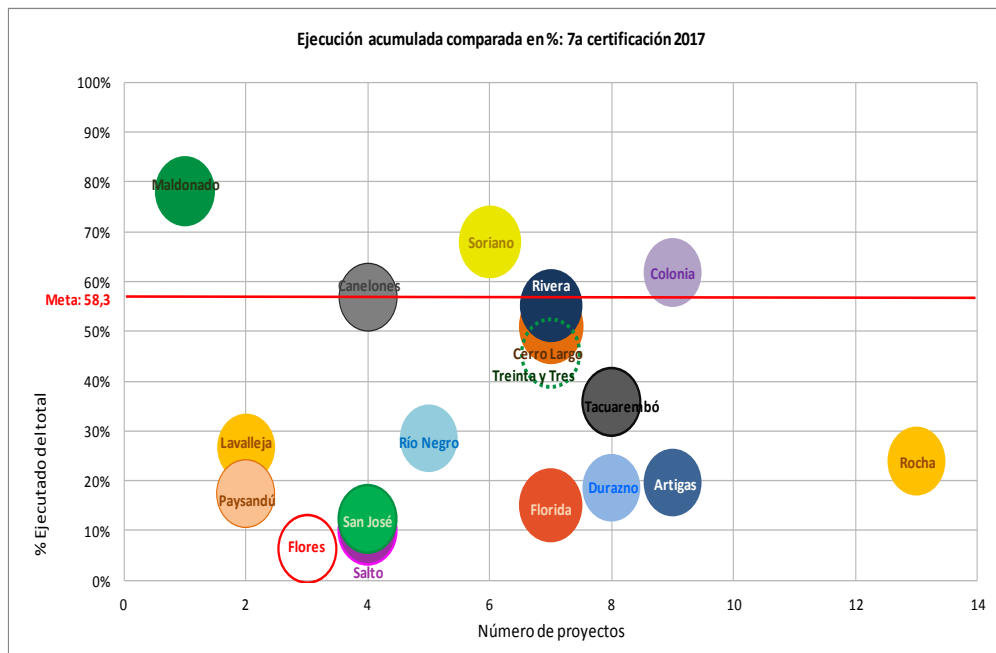

**Nota:** La línea roja representa el avance mínimo en la ejecución deseable para este mes, correspondiente al porcentaje que se habría acumulado a la fecha (58,3%) si ésta fuera perfectamente uniforme a lo largo del año (8,33% por certificación, por haber doce certificaciones en el presente año), meta que contribuiría al objetivo de evitar riesgos de una ejecución "tardía" en el año.

**Alícuota Intendencia en FDI: 4,7% Disponibilidad anual 2017: \$ 62.429.419**

- Total comprometido 2017: \$ 16.273.241
- Certificaciones acumuladas básico 2017: \$ 13.529.856
- Certificaciones acumuladas ajustadas 2017: \$ 16.675.369
- Saldo sin ejecutar básico: \$ 45.754.050
- Proyectos de mantenimiento/maquinaria (máx. permitido 20% de la disponibilidad anual): 0%

## Cartera de Proyectos – Evolución de la ejecución con respecto a lo planificado

Cod. proyecto	Nombre Proyecto	Estado Etapa Actual	Financiamiento FDI	% ejecución FDI	Fecha inicio previsto	Meses previstos de ejecución (incluye ampliaciones)	Meses reales de ejecución desde inicio previsto	Meses sin ejecución durante todo el período	Ejecución con respecto a lo planificado
FDI2015/1003	Doble vía en la Avenida Javier Barrios Amorin	Ejecución	<b>92.927.516</b>	<b>100%</b>	may-2015	18	23	5	
FDI2017/1005	Pavimentación del barrio Las Delicias de la ciudad de Minas	Ejecución	<b>3.151.188</b>	<b>17%</b>	may-2017	4	3	2	
FDI2017/1028	Consolidación del barrio de las Delicias de la ciudad de Minas	Evaluación	<b>28.788.080</b>						
FDI2017/1029	Recuperación de calles urbanas en Departamento de Lavalleja	Evaluación	<b>40.356.047</b>						

## Referencias:



La Intendencia ejecutó de acuerdo a lo planificado

La Intendencia tenía previsto ejecutar y no ejecutó

La intendencia está fuera del plazo previsto de ejecución o no ha replanificado el proyecto
