
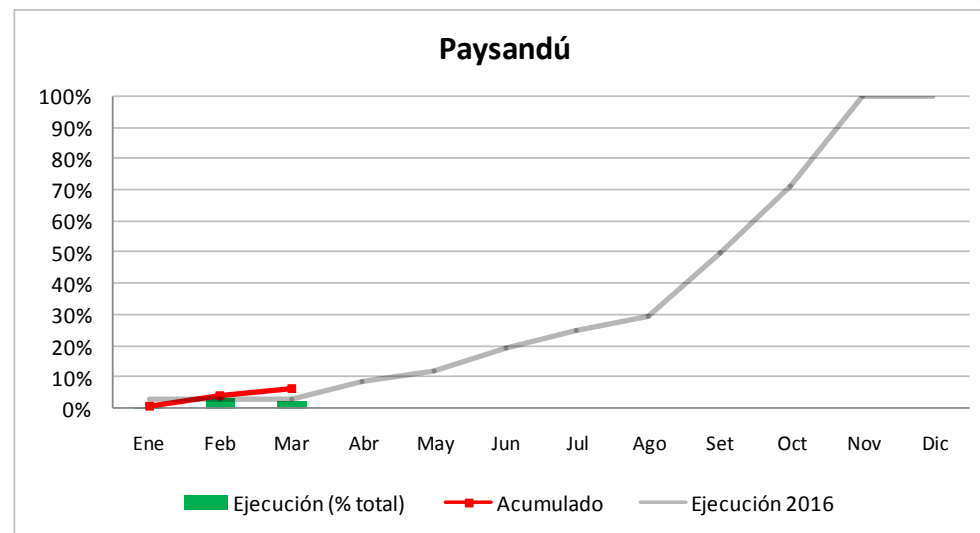



Informe de Ejecución Fondo de Desarrollo del Interior - OPP

Correspondiente a la ejecución de marzo 2017

PAYSANDÚ

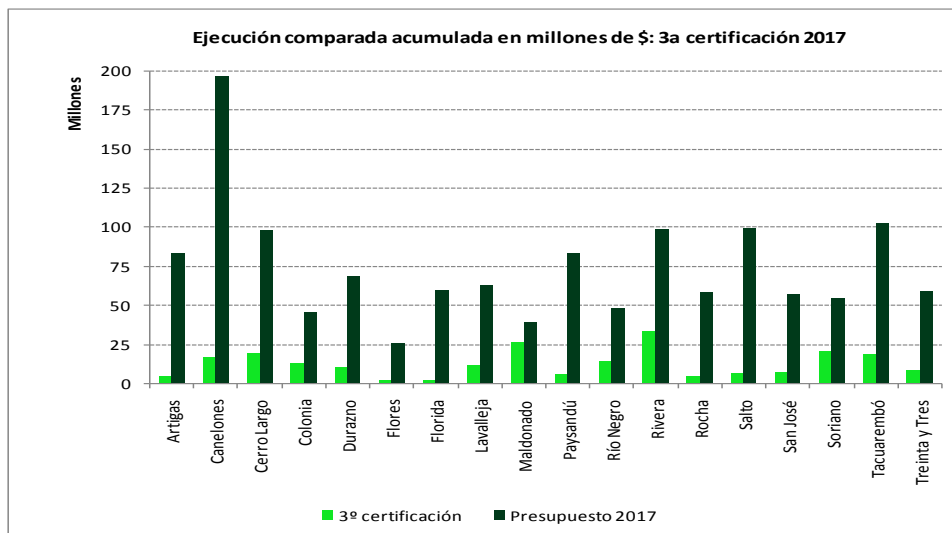

Nota: El gráfico muestra las certificaciones de ejecución otorgadas a la Intendencia en cada mes del año como porcentaje de la disponibilidad total ("Ejecución - % total"), el avance de todas las certificaciones de la Intendencia a la fecha ("Acumulado") y cómo fue el avance en la ejecución de la misma durante 2016 ("Ejecución 2016").

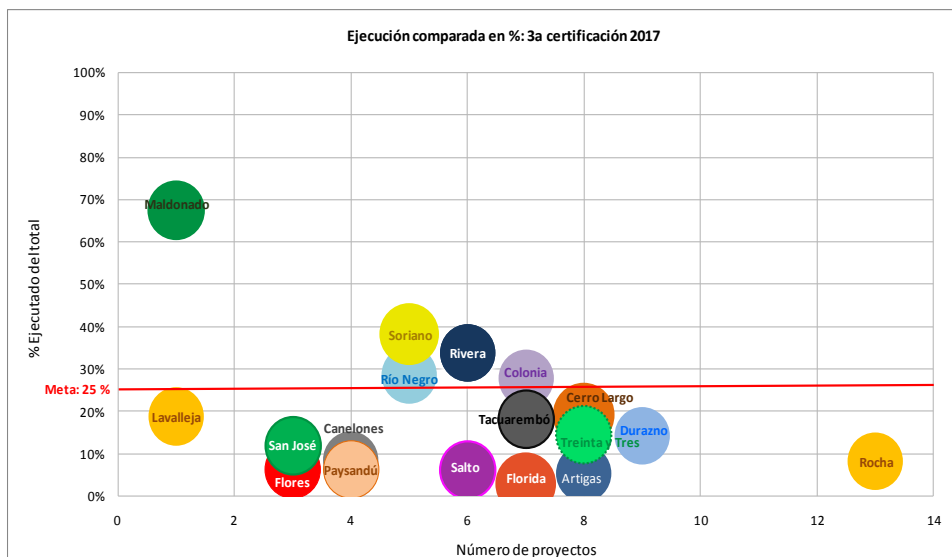

Nota: La línea roja representa el avance mínimo en la ejecución deseable para este mes, correspondiente al porcentaje que se habría acumulado a la fecha (25%) si ésta fuera perfectamente uniforme a lo largo del año (8,33% por certificación, por haber doce certificaciones en el presente año), meta que contribuiría al objetivo de evitar riesgos de una ejecución "tardía" en el año.


Alícuota Intendencia en FDI: 6,3% Disponibilidad anual 2017: \$ 83.551.149

- Total comprometido 2017: \$ 28.825.283
- Certificaciones acumuladas básico 2017: \$ 5.070.169
- Certificaciones acumuladas ajustadas 2017: \$ 5.172.459
- Saldo sin ejecutar básico: \$ 78.378.690
- Proyectos de mantenimiento/maquinaria (máx. permitido 20% de la disponibilidad anual): 3,3%

Cartera de Proyectos – Evolución de la ejecución con respecto a lo planificado

Cod. proyecto	Nombre Proyecto	Estado Etapa Actual	Financiamiento FDI	% ejecución FDI	Fecha inicio previsto	Meses previstos de ejecución (incluye ampliaciones)	Meses reales de ejecución desde inicio previsto	Meses sin ejecución durante todo el período	Ejecución con respecto a lo planificado
PRY2011/1088	Gestión integral de residuos sólidos urbanos	En Ejecución	54.320.327	91%	dic-2012	26	50	25	
PRY2015/1065	Recuperación de camino a Tres Bocas (PCR)	En Ejecución	16.553.041	90%	nov-2015	12	15	11	
PRY2016/1018	Desagües pluviales, cordón cuneta, pavimentación y alumbrado del barrio La Curtiembre de la ciudad de Paysandú	En Ejecución	39.282.603	60%	set-2016	7	6	0	
PRY2016/1029	Desagües pluviales, cordón cuneta, pavimentación y alumbrado público del barrio Delpero	En Ejecución	13.413.541	89%	ago-2016	6	7	2	
PRY2016/1046	Rehabilitación y construcción de infraestructura en Termas de Guaviyú	En Evaluación	21.048.334						
PRY2016/1040	Recalificación de la Plaza Varela, ciudad de Paysandú. Hacia una ciudad inclusiva e integradora	En Evaluación	6.200.353						

Referencias:



La Intendencia ejecutó de acuerdo a lo planificado

La Intendencia tenía previsto ejecutar y no ejecutó

La intendencia está fuera del plazo previsto de ejecución o no ha replanificado el proyecto
