
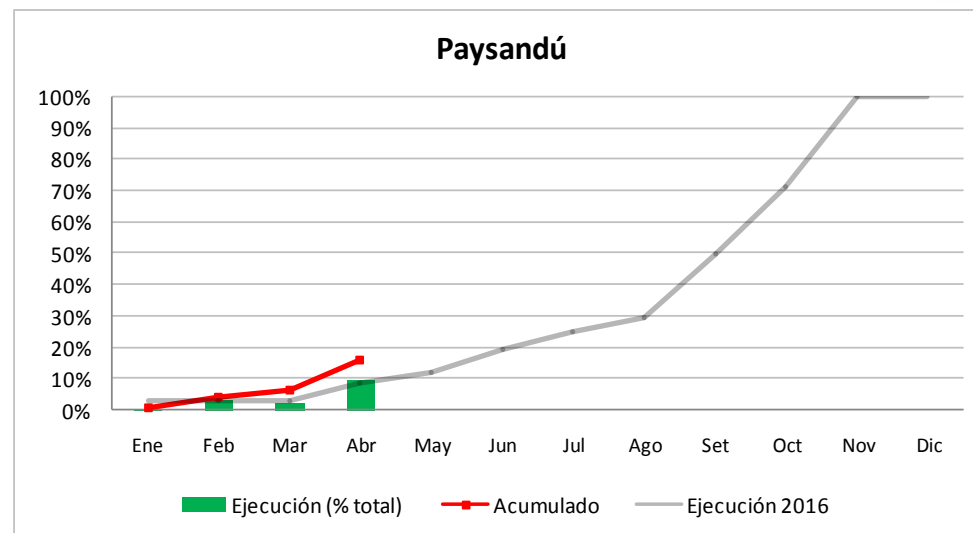



# Informe de Ejecución Fondo de Desarrollo del Interior - OPP

Correspondiente a la ejecución de abril 2017

PAYSANDÚ

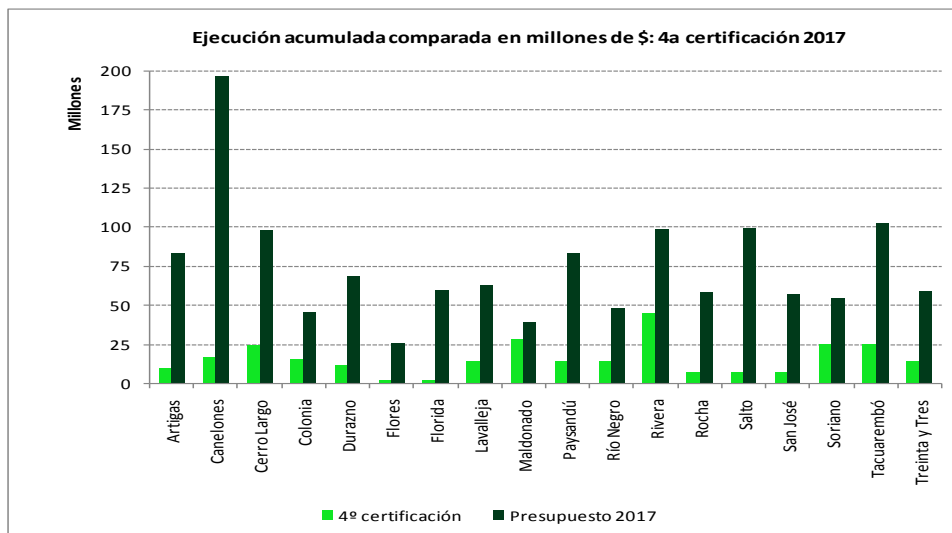

**Nota:** El gráfico muestra las certificaciones de ejecución otorgadas a la Intendencia en cada mes del año como porcentaje de la disponibilidad total ("Ejecución - % total"), el avance de todas las certificaciones de la Intendencia a la fecha ("Acumulado") y cómo fue el avance en la ejecución de la misma durante 2016 ("Ejecución 2016").

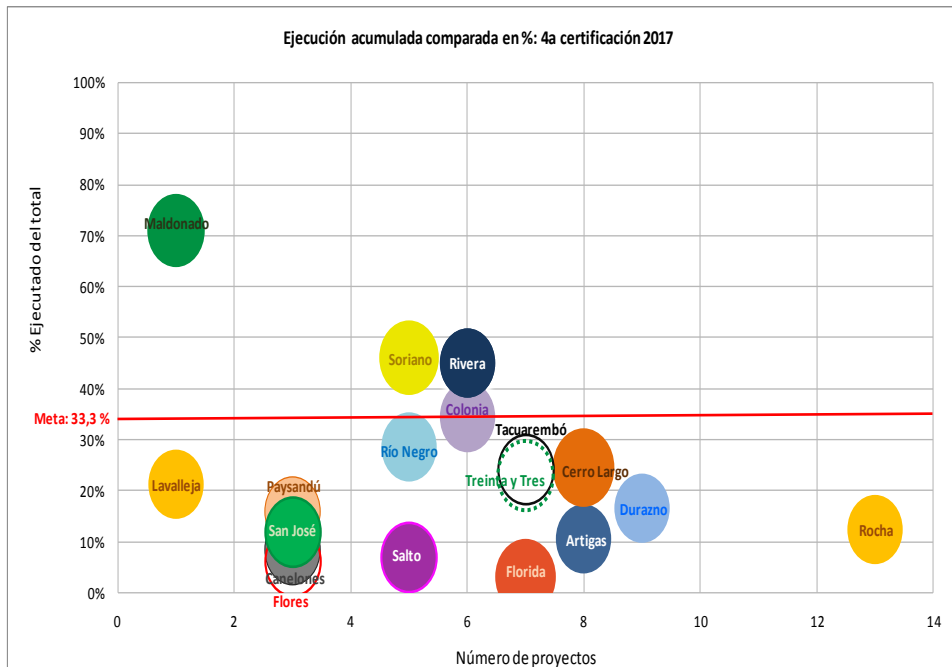

**Nota:** La línea roja representa el avance mínimo en la ejecución deseable para este mes, correspondiente al porcentaje que se habría acumulado a la fecha (33,3%) si ésta fuera perfectamente uniforme a lo largo del año (8,33% por certificación, por haber doce certificaciones en el presente año), meta que contribuiría al objetivo de evitar riesgos de una ejecución "tardía" en el año.


**Alícuota Intendencia en FDI: 6,3% Disponibilidad anual 2017: \$ 83.551.149**

- Total comprometido 2017: \$ 26.160.568
- Certificaciones acumuladas básico 2017: \$ 12.944.819
- Certificaciones acumuladas ajustadas 2017: \$ 13.236.350
- Saldo sin ejecutar básico: \$ 70.314.799
- Proyectos de mantenimiento/maquinaria (máx. permitido 20% de la disponibilidad anual): 10,2%

## Cartera de Proyectos – Evolución de la ejecución con respecto a lo planificado

Cod. proyecto	Nombre Proyecto	Estado Etapa Actual	Financiamiento FDI	% ejecución FDI	Fecha inicio previsto	Meses previstos de ejecución (incluye ampliaciones)	Meses reales de ejecución desde inicio previsto	Meses sin ejecución durante todo el período	Ejecución con respecto a lo planificado
PRY2011/1088	Gestión integral de residuos sólidos urbanos	Ejecución	<b>54.320.327</b>	<b>91%</b>	dic-2012	26	51	25	
PRY2015/1065	Recuperación de camino a Tres Bocas (PCR)	Ejecución	<b>16.553.041</b>	<b>90%</b>	nov-2015	12	16	12	
PRY2016/1018	Desagües pluviales, cordón cuneta, pavimentación y alumbrado del barrio La Curtiembre de la ciudad de Paysandú	Ejecución	<b>39.282.603</b>	<b>60%</b>	set-2016	7	7	0	
PRY2016/1029	Desagües pluviales, cordón cuneta, pavimentación y alumbrado público del barrio Delpero	Ejecución	<b>13.413.541</b>	<b>89%</b>	ago-2016	6	8	3	
PRY 2016/1046	Rehabilitación y construcción de infraestructura en Termas de Guaviyú	Evaluación	<b>21.048.334</b>						
PRY2016/1040	Recalificación de la Plaza Varela, ciudad de Paysandú. Hacia una ciudad inclusiva e integradora	Evaluación	<b>6.200.353</b>						
PRY 2017/1011	Ciclovía sobre la ruta de acceso N°90 de la ciudad de Paysandú	Evaluación	<b>9.107.135</b>						

**Referencias:**



La Intendencia ejecutó de acuerdo a lo planificado

La Intendencia tenía previsto ejecutar y no ejecutó

La intendencia está fuera del plazo previsto de ejecución o no ha replanificado el proyecto
