



# Informe de Ejecución Fondo de Desarrollo del Interior - OPP

Correspondiente a la ejecución de febrero 2017

**ROCHA**

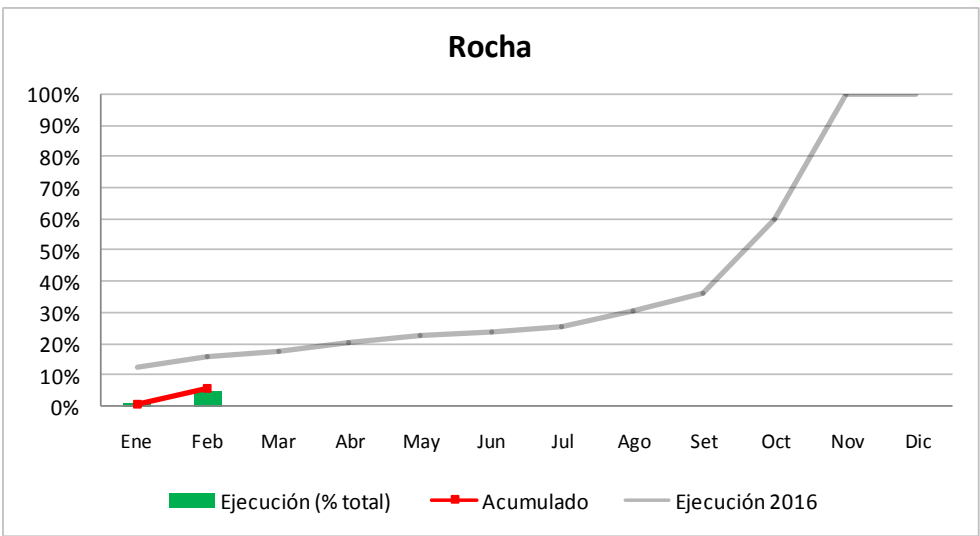

**Nota:** El gráfico muestra las certificaciones de ejecución otorgadas a la Intendencia en cada mes del año como porcentaje de la disponibilidad total ("Ejecución - % total"), el avance de todas las certificaciones de la Intendencia a la fecha ("Acumulado") y cómo fue el avance en la ejecución de la misma durante 2016 ("Ejecución 2016").

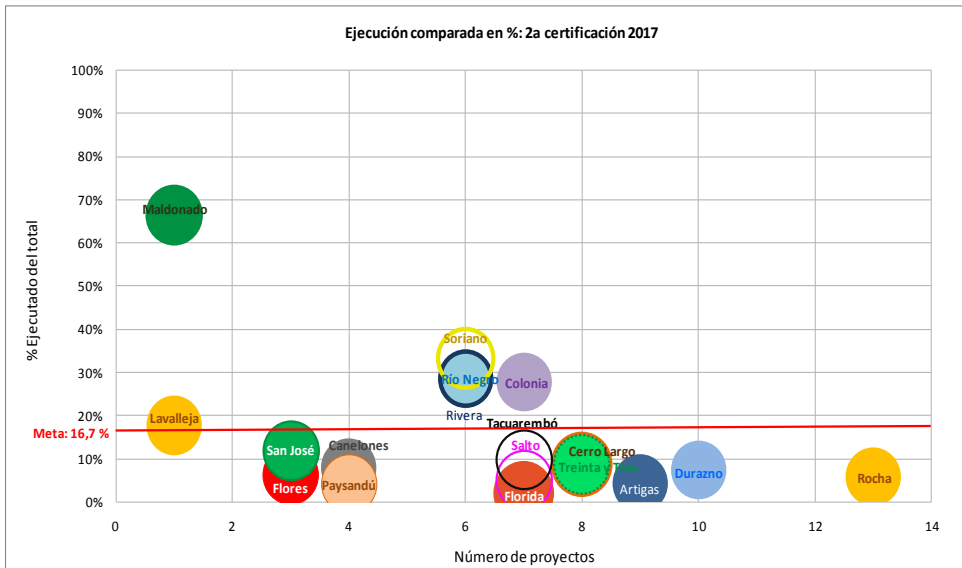

**Nota:** La línea roja representa el avance mínimo en la ejecución deseable para este mes, correspondiente al porcentaje que se habría acumulado a la fecha (16,7%) si ésta fuera perfectamente uniforme a lo largo del año (8,33% por certificación, por haber doce certificaciones en el presente año), meta que contribuiría al objetivo de evitar riesgos de una ejecución "tardía" en el año.

**Alícuota Intendencia en FDI: 4,3% Disponibilidad anual 2017: \$ 58.017.918**

- Total comprometido 2017: \$ 28.835.429
- Certificaciones acumuladas básico 2017: \$ 3.116.622
- Certificaciones acumuladas ajustadas 2017: \$ 3.362.622
- Saldo sin ejecutar básico: \$ 54.655.296
- Proyectos de mantenimiento/maquinaria (máx. permitido 20% de la disponibilidad anual): **10,8%**

## Cartera de Proyectos – Evolución de la ejecución con respecto a lo planificado

Cod. proyecto	Nombre Proyecto	Estado Etapa Actual	Financiamiento FDI	% ejecución FDI	Fecha inicio previsto	Meses previstos de ejecución (incluye ampliaciones)	Meses reales de ejecución desde inicio previsto	Meses sin ejecución durante todo el período	Ejecución con respecto a lo planificado
PRY2015/1004	Pavimentación de calle Amarin Brum	En Ejecución	2.873.464	98%	jun-2015	2	20	16	
PRY2015/1005	Mantenimiento barrio Machado	En Ejecución	2.370.742	87%	jun-2015	2	20	17	
PRY2015/1046	Pavimentación de calles en barrio Galeano de la ciudad de Rocha	En Ejecución	19.921.019	94%	nov-2015	14	17	6	
PRY2015/1058	Pavimentación Avda. Peregrina Balboa	En Ejecución	3.874.787	82%	nov-2015	7	15	10	
PRY2016/1003	Terminal de ómnibus de Rocha	En Ejecución	12.115.977	75%	mar-2016	10	11	3	
PRY2016/1006	Pavimentación de calles en barrio del Puerto de la ciudad de Castillos	En Ejecución	3.164.913	92%	mar-2016	3	11	6	
PRY2016/1011	Pavimentación y desagües pluviales del barrio La Alegría en la ciudad de Rocha	En Ejecución	5.568.450	100%	jul-2016	4	7	3	
PRY2016/1013	Pavimentación y desagües pluviales en los barrios Jardín y Unión en la ciudad de Rocha	En Ejecución	5.478.460	87%	sep-2016	4	5	2	
PRY2016/1028	Pavimentación y desagües pluviales en el barrio Hospital de la ciudad de Lascano	En Ejecución	3.483.656	22%	ago-2016	4	6	5	
PRY2016/1032	Pavimentación y desagües pluviales en el barrio Tito Fernández de la ciudad del Chuy	En Ejecución	8.125.812	0%	sin iniciar	4	0	0	
PRY2016/1041	Pavimentación de acceso al barrio Mirador España	En Ejecución	4.919.721	95%	oct-2016	3	4	1	
PRY2016/1042	Pavimentación de calles en barrio Obrero	En Ejecución	8.870.106	74%	oct-2016	4	4	1	
PRY2016/1058	Adquisición de maquinaria	En Ejecución	5.971.046	0%	oct-2016	sin dato	3	no aplica	
PRY2015/1045	Acceso a terminal de Chuy	En Evaluación	7.032.401						

**Referencias:**


La Intendencia ejecutó de acuerdo a lo planificado

La Intendencia tenía previsto ejecutar y no ejecutó

La Intendencia está fuera del plazo previsto de ejecución o no ha replanificado el proyecto
