
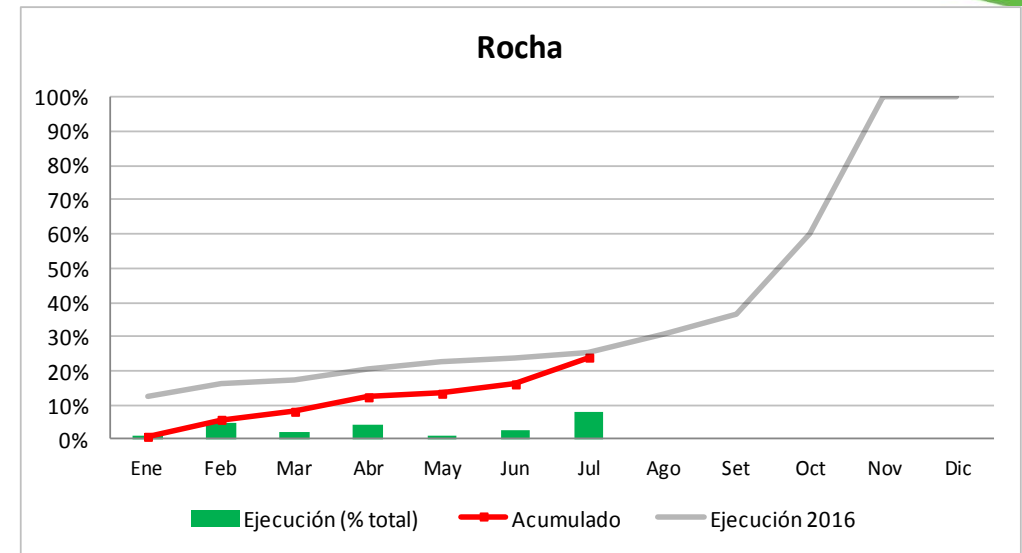



# Informe de Ejecución Fondo de Desarrollo del Interior - OPP

Correspondiente a la ejecución de julio 2017

ROCHA

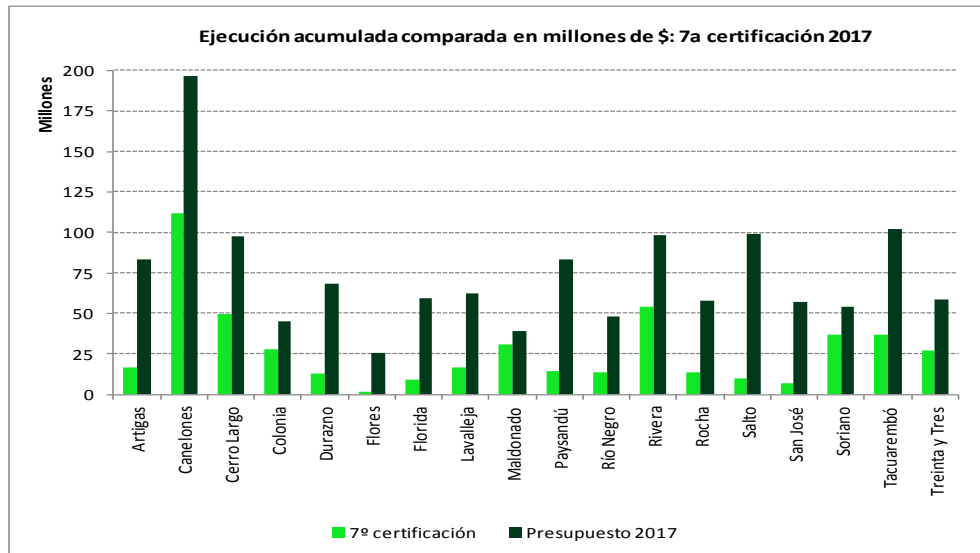

**Nota:** El gráfico muestra las certificaciones de ejecución otorgadas a la Intendencia en cada mes del año como porcentaje de la disponibilidad total ("Ejecución - % total"), el avance de todas las certificaciones de la Intendencia a la fecha ("Acumulado") y cómo fue el avance en la ejecución de la misma durante 2016 ("Ejecución 2016").

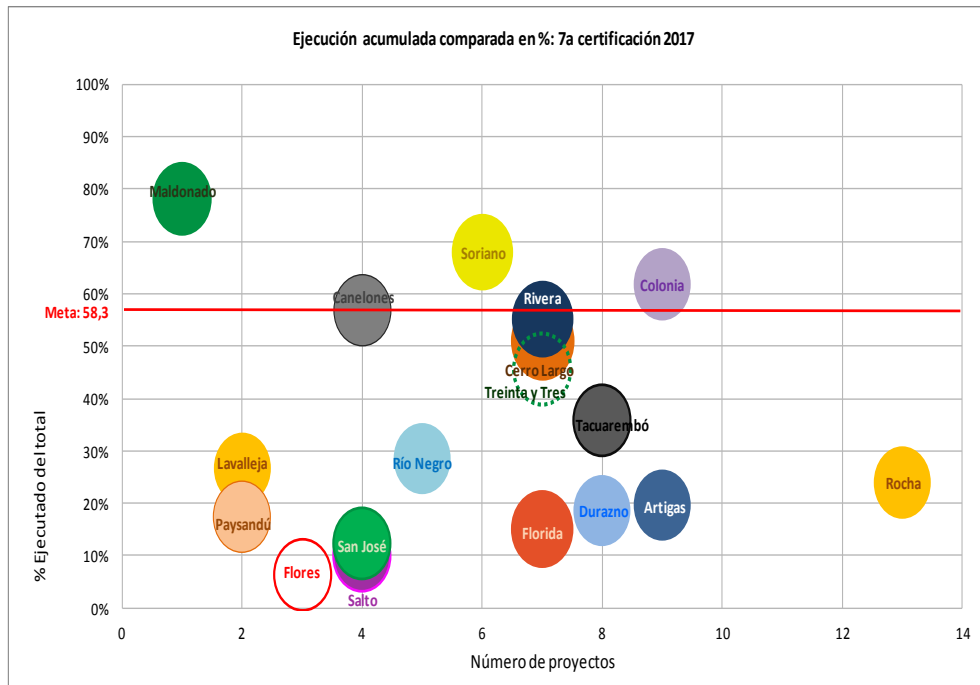

**Alícuota Intendencia en FDI: 4,3% Disponibilidad anual 2017: \$ 58.017.918**

- Total comprometido 2017: \$ 30.682.541
- Certificaciones acumuladas básico 2017: \$ 13.403.272
- Certificaciones acumuladas ajustadas 2017: \$ 13.905.982
- Saldo sin ejecutar básico: \$ 44.111.936
- Proyectos de mantenimiento/maquinaria (máx. permitido 20% de la disponibilidad anual): 10,8%

**Nota:** La línea roja representa el avance mínimo en la ejecución deseable para este mes, correspondiente al porcentaje que se habría acumulado a la fecha (58,3%) si ésta fuera perfectamente uniforme a lo largo del año (8,33% por certificación, por haber doce certificaciones en el presente año), meta que contribuiría al objetivo de evitar riesgos de una ejecución "tardía" en el año.

## Cartera de Proyectos – Evolución de la ejecución con respecto a lo planificado

Cod. proyecto	Nombre Proyecto	Estado Etapa Actual	Financiamiento FDI	% ejecución FDI	Fecha inicio previsto	Meses previstos de ejecución (incluye ampliaciones)	Meses reales de ejecución desde inicio previsto	Meses sin ejecución durante todo el período	Ejecución con respecto a lo planificado
FDI2015/1004	Pavimentación de calle Amarin Brum	Ejecución	<b>2.873.464</b>	<b>98%</b>	jun-2015	2	25	21	
FDI2015/1005	Mantenimiento barrio Machado	Ejecución	<b>2.370.742</b>	<b>87%</b>	jun-2015	2	25	22	
FDI2015/1046	Pavimentación de calles en barrio Galeano de la ciudad de Rocha	Ejecución	<b>19.921.019</b>	<b>94%</b>	nov-2015	14	22	11	
FDI2015/1058	Pavimentación Avda. Peregrina Balboa	Ejecución	<b>5.368.289</b>	<b>67%</b>	nov-2015	7	20	14	
FDI2016/1003	Terminal de ómnibus de Rocha	Ejecución	<b>13.596.943</b>	<b>90%</b>	mar-2016	10	16	3	
FDI2016/1006	Pavimentación de calles en barrio del Puerto de la ciudad de Castillos	Ejecución	<b>3.164.913</b>	<b>92%</b>	mar-2016	3	16	11	
FDI2016/1011	Pavimentación y desagües pluviales del barrio La Alegría en la ciudad de Rocha	Ejecución	<b>5.568.450</b>	<b>100%</b>	jul-2016	4	12	8	
FDI2016/1013	Pavimentación y desagües pluviales en los barrios Jardín y Unión en la ciudad de Rocha	Ejecución	<b>5.478.460</b>	<b>96%</b>	sep-2016	4	10	6	
FDI2016/1028	Pavimentación y desagües pluviales en el barrio Hospital de la ciudad de Lascano	Ejecución	<b>3.483.656</b>	<b>75%</b>	ago-2016	4	11	8	
FDI2016/1032	Pavimentación y desagües pluviales en el barrio Tito Fernández de la ciudad del Chuy	Ejecución	<b>8.125.812</b>	<b>0%</b>	jun-2017	6	2	2	
FDI2016/1041	Pavimentación de acceso al barrio Mirador España	Ejecución	<b>5.612.244</b>	<b>98%</b>	oct-2016	3	9	4	
FDI2016/1058	Adquisición de maquinaria	Ejecución	<b>5.971.046</b>	<b>50%</b>	oct-2016	sin dato	8	no aplica	
FDI2015/1045	Acceso a terminal de Chuy	Evaluación	<b>7.032.401</b>						
FDI2017/1026	Piscina abierta en la ciudad de Lascano	Evaluación	<b>4.000.000</b>						
FDI 2017/1057	Reparación de cordón cuneta y badenes de hormigón en Avenida Gral. Artigas de la ciudad de Velázquez	Evaluación	<b>3.832.395</b>						
FDI 2017/1058	Acondicionamiento de acceso a Rocha por Avda. Martínez Rodríguez	Evaluación	<b>24.910.977</b>						
