
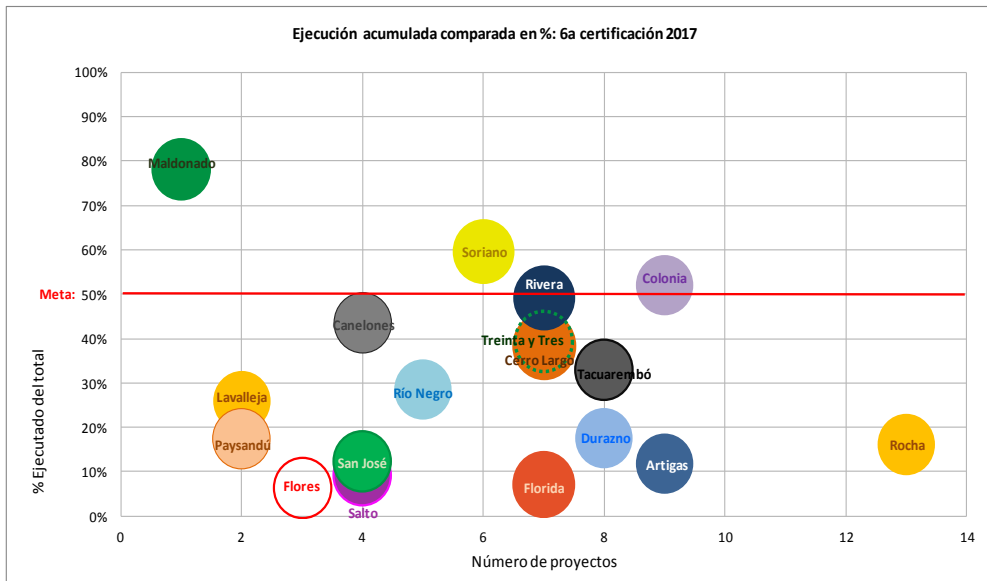
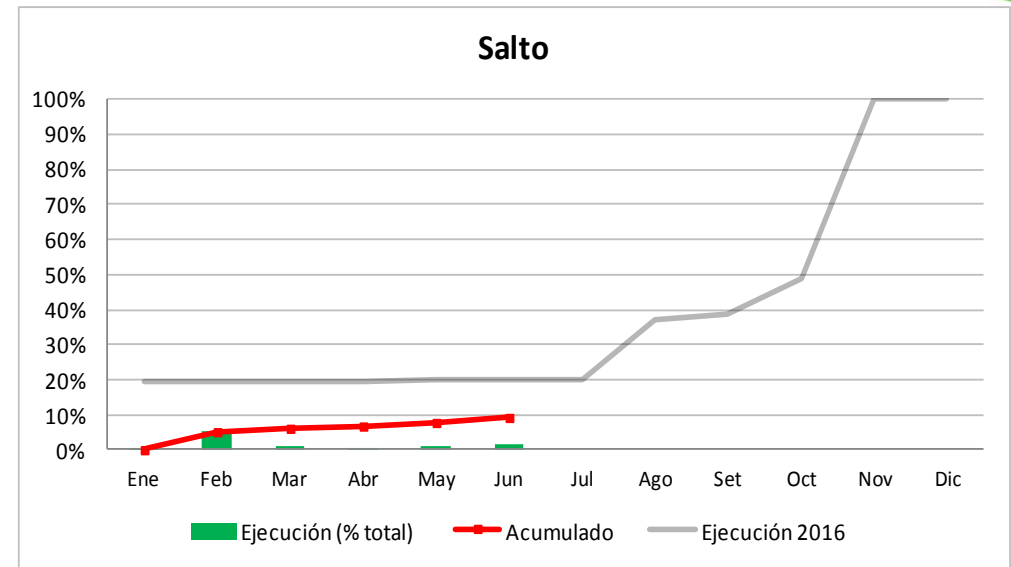


Informe de Ejecución Fondo de Desarrollo del Interior - OPP

Correspondiente a la ejecución de junio 2017

SALTO

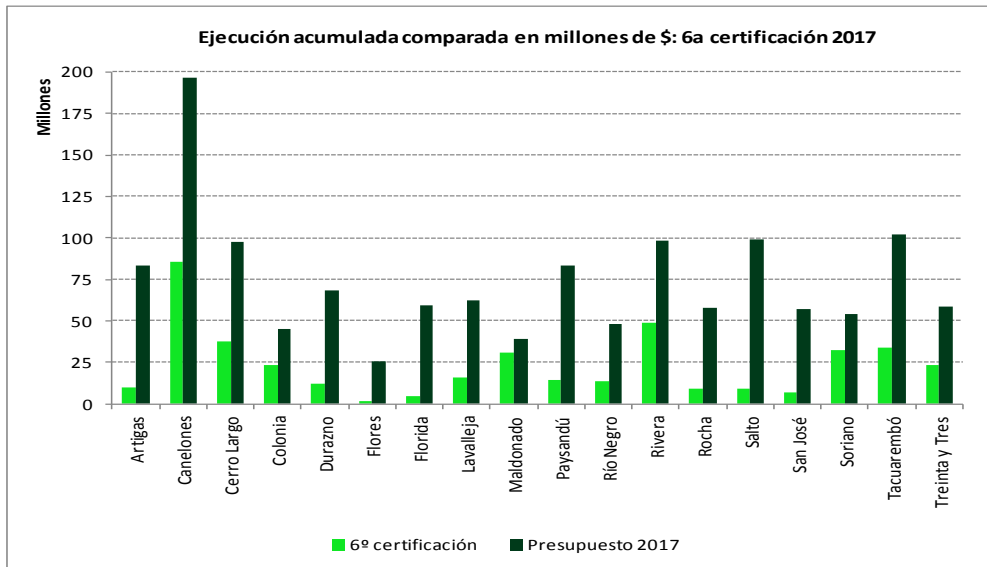

Nota: El gráfico muestra las certificaciones de ejecución otorgadas a la Intendencia en cada mes del año como porcentaje de la disponibilidad total ("Ejecución - % total"), el avance de todas las certificaciones de la Intendencia a la fecha ("Acumulado") y cómo fue el avance en la ejecución de la misma durante 2016 ("Ejecución 2016").

Alícuota Intendencia en FDI: 7,4% Disponibilidad anual 2017: \$ 99.058.242

- Total comprometido 2017: \$ 95.122.500
- Certificaciones acumuladas básico 2017: \$ 8.971.828
- Certificaciones acumuladas ajustadas 2017: \$ 9.112.377
- Saldo sin ejecutar básico: \$ 89.945.865
- Proyectos de mantenimiento/maquinaria (máx. permitido 20% de la disponibilidad anual): **6,1%**

Nota: La línea roja representa el avance mínimo en la ejecución deseable para este mes, correspondiente al porcentaje que se habría acumulado a la fecha (50%) si ésta fuera perfectamente uniforme a lo largo del año (8,33% por certificación, por haber doce certificaciones en el presente año), meta que contribuiría al objetivo de evitar riesgos de una ejecución "tardía" en el año.

Cartera de Proyectos – Evolución de la ejecución con respecto a lo planificado

Cod. proyecto	Nombre Proyecto	Estado Etapa Actual	Financiamiento FDI	% ejecución FDI	Fecha inicio previsto	Meses previstos de ejecución (incluye ampliaciones)	Meses reales de ejecución desde inicio previsto	Meses sin ejecución durante todo el período	Ejecución con respecto a lo planificado
PRY2013/1075	Mejora vial y urbana del eje vial Carlos Reyes en la ciudad de Salto	Ejecución	44.586.655	16%	oct-2014	8	30	25	
PRY2014/1028	Mejora urbana de barrios en la zona Este de Salto	Ejecución	63.806.296	28%	nov-2014	12	30	22	
PRY2016/1047	Fortalecimiento institucional - Capitalización fondo de garantía	Ejecución	850.000	100%	dic-2016	sin dato	6	5	
PRY2016/1063	Bacheo y pavimentación en Avda. Patulé	Ejecución	27.603.602	89%	nov-2016	2	7	5	
PRY2017/1016	Renovación urbana de Zelmar Michelini de la ciudad de Salto	Evaluación	21.584.818						

Referencias:



La Intendencia ejecutó de acuerdo a lo planificado

La Intendencia tenía previsto ejecutar y no ejecutó

La intendencia está fuera del plazo previsto de ejecución o no ha replanificado el proyecto
