
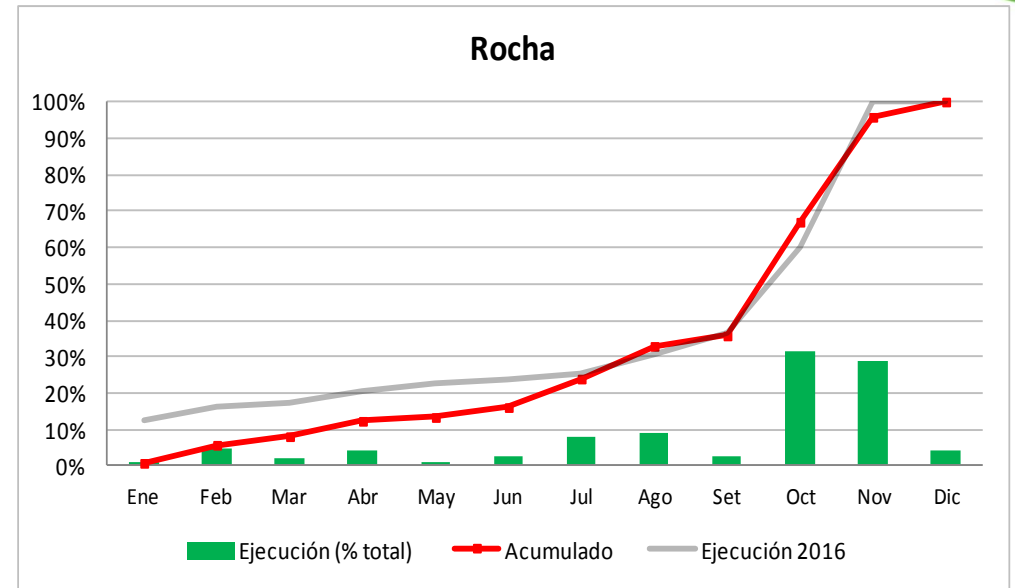



Informe de Ejecución Fondo de Desarrollo del Interior - OPP

Correspondiente a la ejecución de diciembre 2017

SALTO

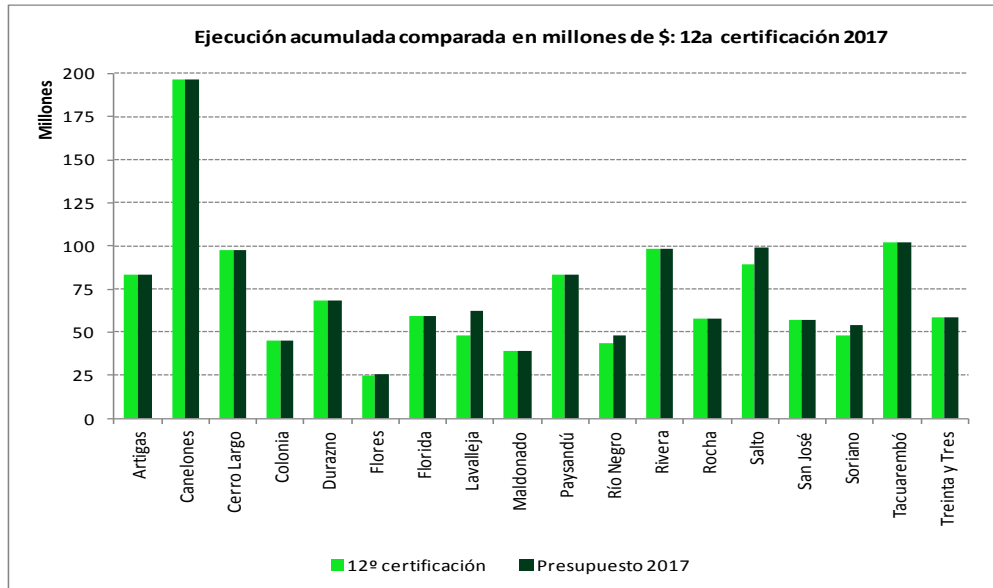

Nota: El gráfico muestra las certificaciones de ejecución otorgadas a la Intendencia en cada mes del año como porcentaje de la disponibilidad total ("Ejecución - % total"), el avance de todas las certificaciones de la Intendencia a la fecha ("Acumulado") y cómo fue el avance en la ejecución de la misma durante 2016 ("Ejecución 2016").

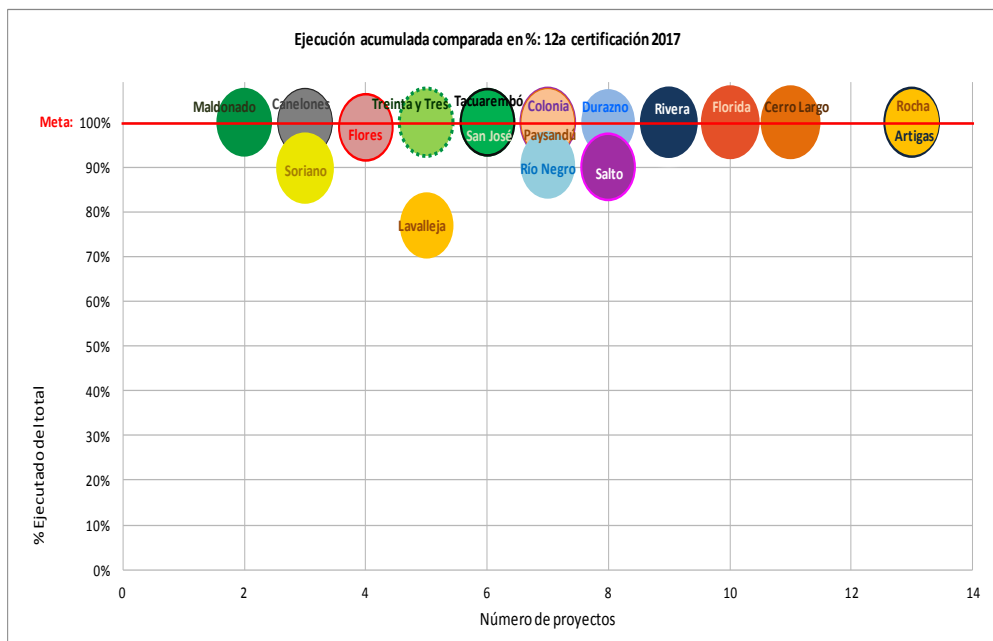

Alícuota Intendencia en FDI: 7,4% Disponibilidad anual 2017: \$ 99.058.242

- Total comprometido 2017: \$ 165.474.810
- Certificaciones acumuladas básico 2017: \$ 87.621.334
- Certificaciones acumuladas ajustadas 2017: \$ 89.214.422
- Saldo sin ejecutar: \$ 9.843.820
- Proyectos de mantenimiento/maquinaria (máx. permitido 20% de la disponibilidad anual): 20%

Nota: La línea roja representa el avance mínimo en la ejecución deseable para este mes, correspondiente al porcentaje que se habría acumulado a la fecha (100%) si ésta fuera perfectamente uniforme a lo largo del año (8,33% por certificación, por haber doce certificaciones en el presente año), meta que contribuiría al objetivo de evitar riesgos de una ejecución "tardía" en el año.

Cartera de Proyectos – Evolución de la ejecución con respecto a lo planificado

Cod. proyecto	Nombre Proyecto	Estado Etapa Actual	Financiamiento FDI	% ejecución FDI	Fecha inicio previsto	Meses previstos de ejecución (incluye ampliaciones)	Meses reales de ejecución desde inicio previsto	Meses sin ejecución durante todo el período	Ejecución con respecto a lo planificado
FDI2013/1075	Mejora vial y urbana del eje vial Carlos Reyles en la ciudad de Salto	Ejecución	41.684.489	18%	oct-2014	8	36	30	
FDI2014/1028	Mejora urbana de barrios en la zona Este de Salto	Ejecución	62.640.881	47%	nov-2014	12	36	22	
FDI2016/1047	Fortalecimiento institucional - Capitalización fondo de garantía	Ejecución	850.000	100%	dic-2016	sin dato	12	11	
FDI2016/1063	Bacheo y pavimentación en Avda. Patulé	Ejecución	27.603.602	89%	nov-2016	2	13	11	
FDI2017/1016	Renovación urbana de Zelmar Michelini de la ciudad de Salto	Ejecución	45.472.815	56%	oct-2017	8	3	0	
FDI2017/1032	Mantenimiento en carpeta asfáltica delgada de calles zona urbana Salto	Ejecución	32.282.575	67%	set-2017	4	4	0	
FDI2017/1047	Plan de eficiencia energética en instalación de alumbrado público Salto	Ejecución	20.027.020	100%	dic-2017	1	1	0	
FDI2017/1059	Conservación del camino a la Colonia Gestido	Ejecución	15.705.896	0%	ene-2018	12	0	0	

Referencias:


La Intendencia ejecutó de acuerdo a lo planificado

La Intendencia tenía previsto ejecutar y no ejecutó

La Intendencia está fuera del plazo previsto de ejecución o no ha replanificado el proyecto
