


Informe de Ejecución Fondo de Desarrollo del Interior - OPP


Correspondiente a la ejecución de diciembre 2017

SAN JOSÉ

Ejecución acumulada comparada en millones de \$: 12a certificación 2017

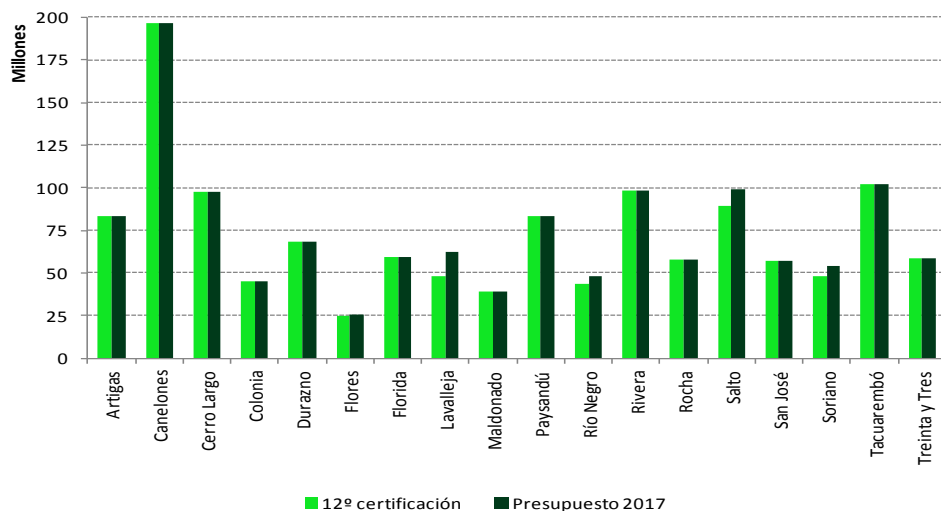


Salto

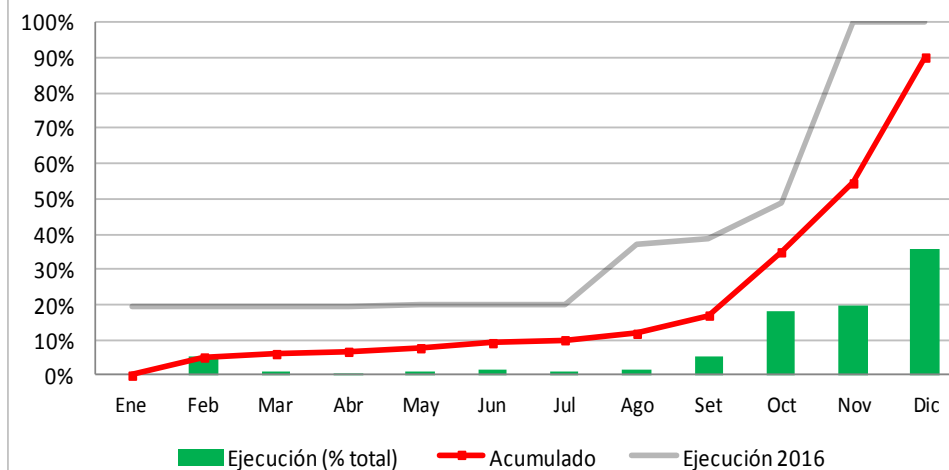

Nota: El gráfico muestra las certificaciones de ejecución otorgadas a la Intendencia en cada mes del año como porcentaje de la disponibilidad total ("Ejecución - % total"), el avance de todas las certificaciones de la Intendencia a la fecha ("Acumulado") y cómo fue el avance en la ejecución de la misma durante 2016 ("Ejecución 2016").

Ejecución acumulada comparada en %: 12a certificación 2017

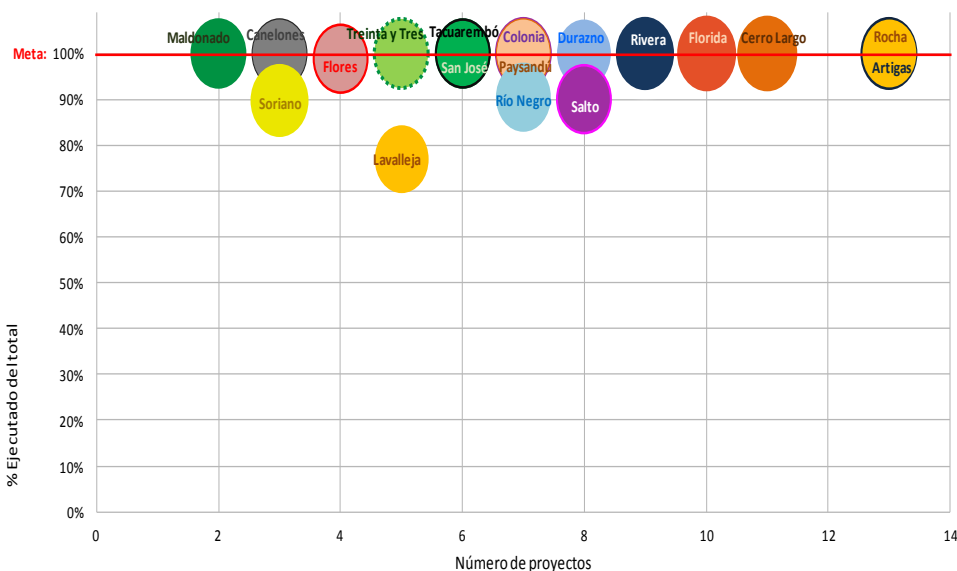

Nota: La línea roja representa el avance mínimo en la ejecución deseable para este mes, correspondiente al porcentaje que se habría acumulado a la fecha (100%) si ésta fuera perfectamente uniforme a lo largo del año (8,33% por certificación, por haber doce certificaciones en el presente año), meta que contribuiría al objetivo de evitar riesgos de una ejecución "tardía" en el año.




Alícuota Intendencia en FDI: 4,3% Disponibilidad anual 2017: \$ 57.215.827

- Total comprometido 2017: \$ 59.730.302
- Certificaciones acumuladas básico 2017: \$ 54.580.001
- Certificaciones acumuladas ajustadas 2017: \$ 57.215.827
- Saldo sin ejecutar: \$ 0
- Proyectos de mantenimiento/maquinaria (máx. permitido 20% de la disponibilidad anual): 0%

Cartera de Proyectos – Evolución de la ejecución con respecto a lo planificado

Cod. proyecto	Nombre Proyecto	Estado Etapa Actual	Financiamiento FDI	% ejecución FDI	Fecha inicio previsto	Meses previstos de ejecución (incluye ampliaciones)	Meses reales de ejecución desde inicio previsto	Meses sin ejecución durante todo el período	Ejecución con respecto a lo planificado
FDI2015/1039	Diversificación productiva y economía social	Ejecución	700.000	91%	abr-2016	12	20	13	
FDI2016/1074	Acuerdo Interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal	Ejecución	3.773.038	9%	ene-2018	24	0	0	
FDI2017/1027	By Pass norte de la ciudad de San José	Ejecución	33.820.859	98%	may-2016	4	8	3	
PRY2017/1040	Tramo 114 Camino Rincón de la Torre	Ejecución	59.700.082	0%	ene-2018	14	0	0	
PRY2017/1041	Pavimentación y revestimiento taludes y banquetas	Ejecución	16.867.167	28%	nov-2017	15	2	1	
FDI2017/1069	Pavimentación y construcción de alcantarillas en el tramo 337	Ejecución	43.760.559	24%	set-2017	12	4	2	
FDI2016/1070	Plaza de Deportes en Sarandí	Evaluación	16.620.100						
FDI2017/1039	Tramo 40 camino Paso de la Piedra	Evaluación	35.930.637						

Referencias:

-  La Intendencia ejecutó de acuerdo a lo planificado
-  La Intendencia tenía previsto ejecutar y no ejecutó
-  La Intendencia está fuera del plazo previsto de ejecución o no ha replanificado el proyecto
