
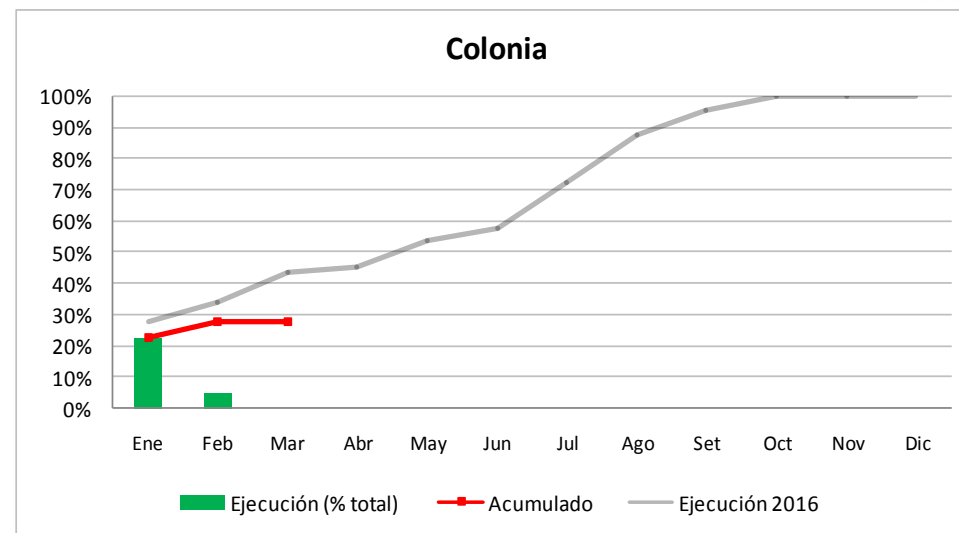



# Informe de Ejecución Fondo de Desarrollo del Interior - OPP

Correspondiente a la ejecución de marzo 2017

COLONIA

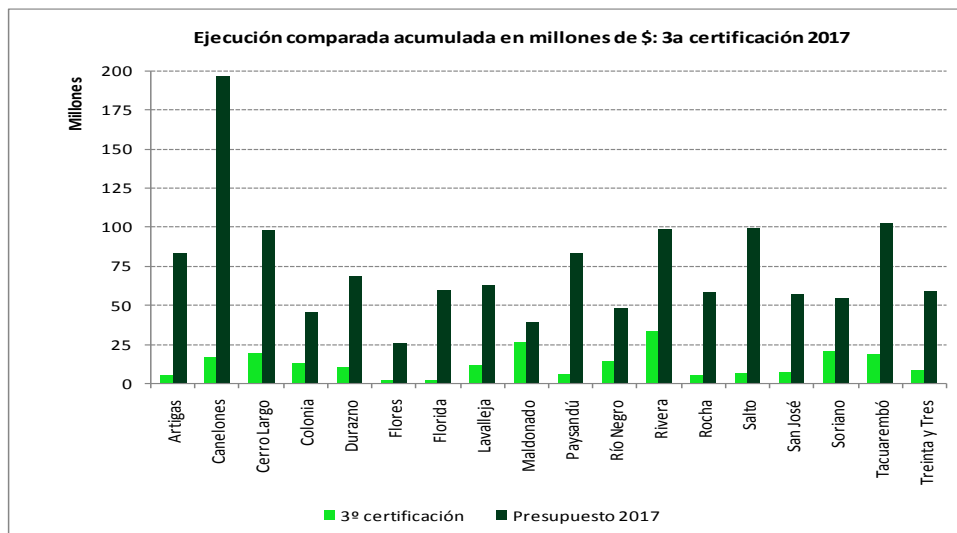

**Nota:** El gráfico muestra las certificaciones de ejecución otorgadas a la Intendencia en cada mes del año como porcentaje de la disponibilidad total ("Ejecución - % total"), el avance de todas las certificaciones de la Intendencia a la fecha ("Acumulado") y cómo fue el avance en la ejecución de la misma durante 2016 ("Ejecución 2016").

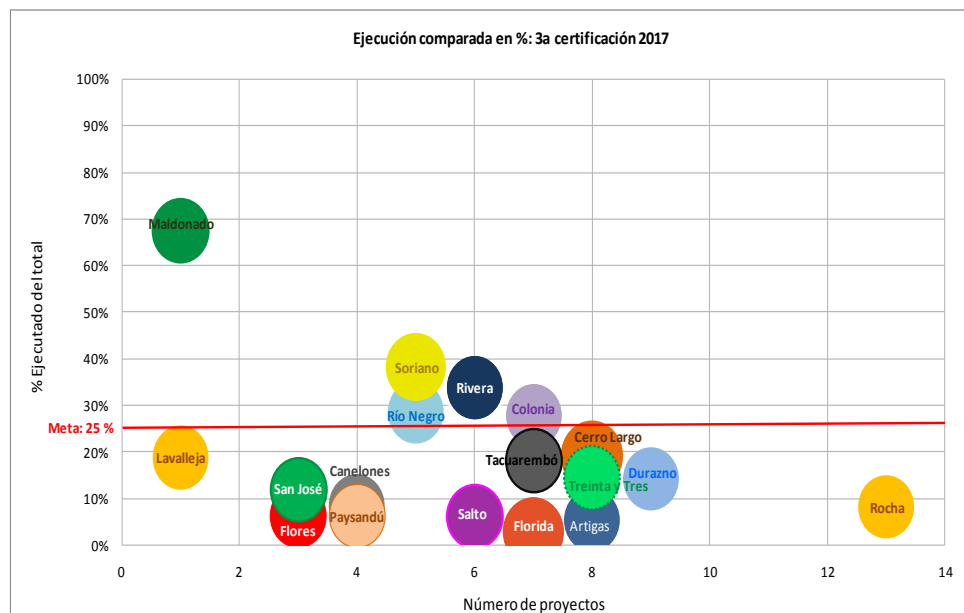

**Nota:** La línea roja representa el avance mínimo en la ejecución deseable para este mes, correspondiente al porcentaje que se habría acumulado a la fecha (25%) si ésta fuera perfectamente uniforme a lo largo del año (8,33% por certificación, por haber doce certificaciones en el presente año), meta que contribuiría al objetivo de evitar riesgos de una ejecución "tardía" en el año.


**Alícuota Intendencia en FDI: 3,4% Disponibilidad anual 2017: \$ 44.917.098**

- Total comprometido 2017: \$ 29.834.879
- Certificaciones acumuladas básico 2017: \$ 11.051.176
- Certificaciones acumuladas ajustadas 2017: \$ 12.466.446
- Saldo sin ejecutar básico: \$ 32.450.652
- Proyectos de mantenimiento/maquinaria (máx. permitido 20% de la disponibilidad anual): 8,3%

## Cartera de Proyectos – Evolución de la ejecución con respecto a lo planificado

| Cod. proyecto | Nombre Proyecto  | Estado Etapa Actual | Financiamiento FDI | % ejecución FDI | Fecha inicio previsto | Meses previstos de ejecución (incluye ampliaciones) | Meses reales de ejecución desde inicio previsto | Meses sin ejecución durante todo el período | Ejecución con respecto a lo planificado |
|---------------|--|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---|---|---|---|
| PRY2012/1014  | Programa Regional para el Desarrollo de la Quesería Artesanal - Fase II            | En Ejecución        | 2.372.844          | 82%             | jul-2013              | 36  | 42  | 4   |   |
| PRY2013/1077  | Compra y acondicionamiento del ex cine Rex de la ciudad de Tarariras               | En Ejecución        | 25.737.614         | 78%             | set-2015              | 8   | 18  | 7   |   |
| PRY2015/1042  | Asfaltado ruta 50 (PCR)  | En Ejecución        | 2.624.889          | 61%             | oct-2015              | 6   | 13  | 10  |   |
| PRY2016/1019  | Mantenimiento - Tratamiento bituminoso de sellado en calles de Tarariras           | En Ejecución        | 4.660.861          | 71%             | dic-2016              | 3   | 3   | 2   |   |
| PRY2016/1061  | Pavimento e iluminación peatonal Rambla Cristóbal Colón en Colonia del Sacramento  | En Ejecución        | 12.230.260         | 0%              | abril-2017            | 8   | 0   | 0   |   |
| PRY2016/1062  | Remodelación Bvar. Rodó y Avda. José Pedro Varela de la ciudad de Rosario          | En Ejecución        | 14.901.647         | 0%              | sin iniciar           | 8   | 0   | 0   |   |
| PRY2016/1074  | Acuerdo Interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal             | En Ejecución        | 2.666.280          | 0%              | sin iniciar           | 36  | 0   | 0   |   |
| PRY2016/1071  | Construcción de pluviales y pavimentos en calle Gaydou y otras de Colonia Valdense | En Evaluación       | 16.906.404         |                 |                       |   |   |   |   |
| PRY2016/1076  | Escuela Segura   | En Evaluación       | 2.778.857          |                 |                       |   |   |   |   |

**Referencias:**



La Intendencia ejecutó de acuerdo a lo planificado

La Intendencia tenía previsto ejecutar y no ejecutó

La intendencia está fuera del plazo previsto de ejecución o no ha replanificado el proyecto
