
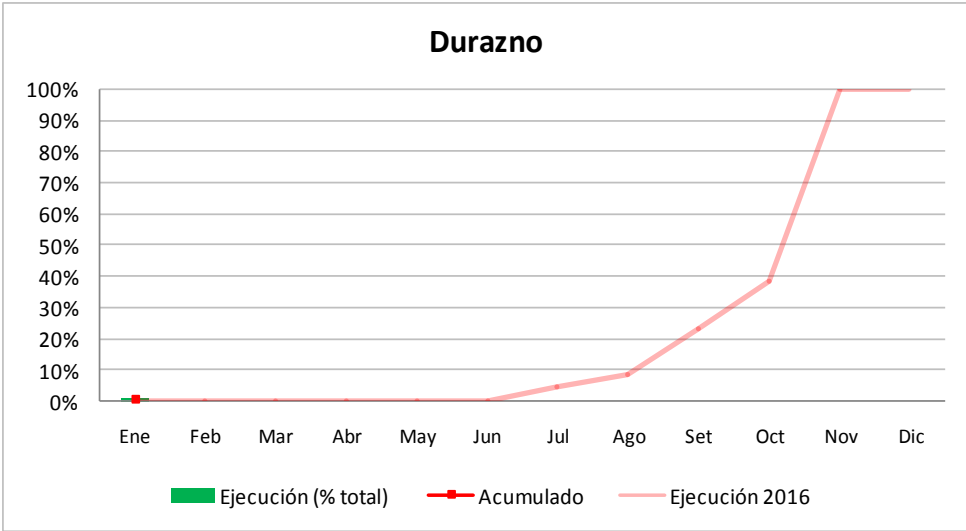



Informe de Ejecución Fondo de Desarrollo del Interior - OPP

Correspondiente a la ejecución de enero 2017

DURAZNO

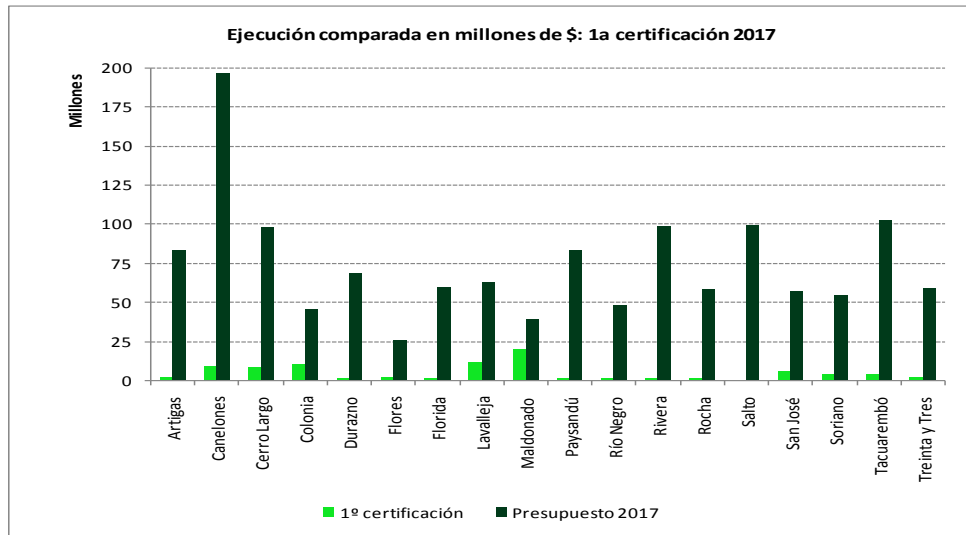

Nota: El gráfico muestra las certificaciones de ejecución otorgadas a la Intendencia en cada mes del año como porcentaje de la disponibilidad total ("Ejecución - % total"), el avance de todas las certificaciones de la Intendencia a la fecha ("Acumulado") y cómo fue el avance en la ejecución de la misma durante 2016 ("Ejecución 2016").

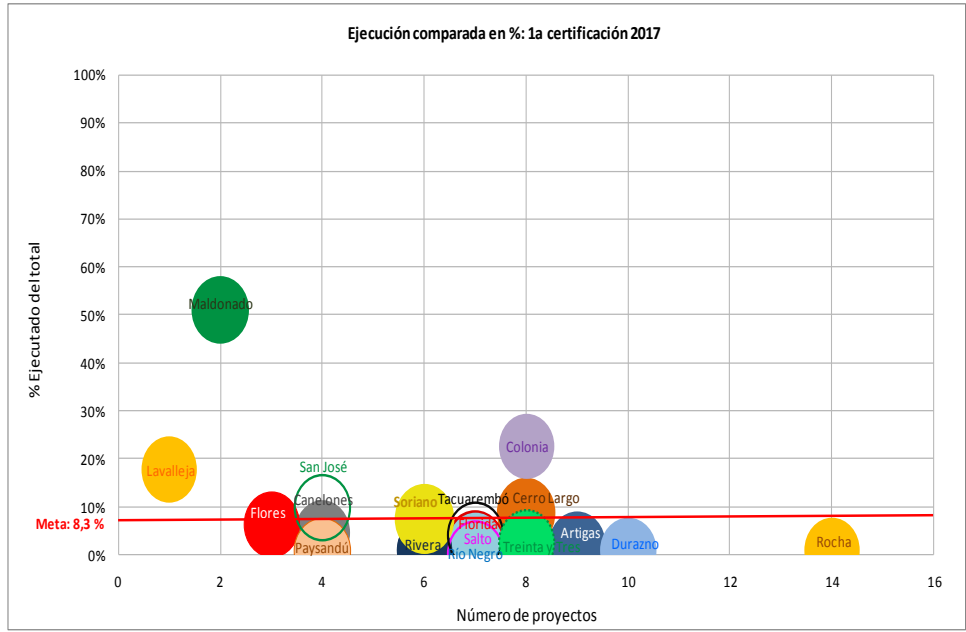

Nota: La línea roja representa el avance mínimo en la ejecución deseable para este mes, correspondiente al porcentaje que se habría acumulado a la fecha (8,33%) si ésta fuera perfectamente uniforme a lo largo del año (8,33% por certificación, por haber doce certificaciones en el presente año), meta que contribuiría al objetivo de evitar riesgos de una ejecución "tardía" en el año.

Alícuota Intendencia en FDI: 5,1% Disponibilidad anual 2017: \$ 68.311.420

- Total comprometido 2017: \$ 111.742.660
- Certificaciones acumuladas básico 2017: \$ 522.027
- Certificaciones acumuladas ajustadas 2017: \$ 547.345
- Saldo sin ejecutar básico: \$ 67.764.075
- Proyectos de mantenimiento/maquinaria (máx. permitido 20% de la disponibilidad anual): 10,6%

Cartera de Proyectos – Evolución de la ejecución con respecto a lo planificado

Cod. proyecto	Nombre Proyecto	Estado Etapa Actual	Financiamiento FDI	% ejecución FDI	Fecha inicio previsto	Meses previstos de ejecución (incluye ampliaciones)	Meses reales de ejecución desde inicio previsto	Meses sin ejecución durante todo el período	Ejecución con respecto a lo planificado
PRY2011/1084	Instalación de invernáculos y huertas familiares	En Ejecución	2.562.523	98%	feb-2012	36	57	20	
PRY2016/1004	Rehabilitación de pavimentos en barrio Plaza Artigas de la ciudad de Durazno	En Ejecución	13.071.339	66%	set-2016	4	4	1	
PRY2016/1008	Remodelación Plaza Dr. J. Enamorado	En Ejecución	13.285.203	98%	jun-2016	6	7	2	
PRY2016/1014	Remodelación Plaza Artigas en Villa del Carmen	En Ejecución	12.216.079	75%	set-2016	6	4	0	
PRY2016/1021	Consolidación urbana en barrios de la ciudad de Sarandí del Yí	En Ejecución	20.103.512	37%	set-2016	6	4	2	
PRY2016/1022	Reparación y construcción alcantarilla H sobre Aº Sarandí	En Ejecución	5.397.916	83%	set-2016	6	4	1	
PRY2016/1034	Adquisición de maquinaria Durazno	En Ejecución	41.333.293	39%	oct-2016	24	3	no aplica	
PRY2016/1048	Circunvalación Este de la ciudad de Durazno	En Ejecución	76.242.988	1%	oct-2016	12	3	2	
PRY2016/1051	Fondo rotatorio para microempresas del departamento	En Ejecución	4.200.000	88%	dic-2016	24	1	0	
PRY2016/1068	Mejora de eficiencia energética y alumbrado público en la ciudad de Durazno	En Ejecución	6.724.775	0%	sin iniciar	3	0	0	
PRY2016/1052	Proyecto Desarrollo de Granja 2016	En Evaluación	3.840.000						
PRY2016/1055	Construcción de Sala de Extracción de miel en San Jorge y compra de materiales para los apiarios	En Evaluación	2.850.000						
PRY2016/1053	Fomentar la actividad productiva de la mujer rural	En Evaluación	1.600.000						
PRY2017/1002	Remodelación plaza de deportes Nº1 de la ciudad de Durazno	En Evaluación	62.821.158						

Referencias:



La Intendencia ejecutó de acuerdo a lo planificado

La Intendencia tenía previsto ejecutar y no ejecutó

La intendencia está fuera del plazo previsto de ejecución o no ha replanificado el proyecto
