
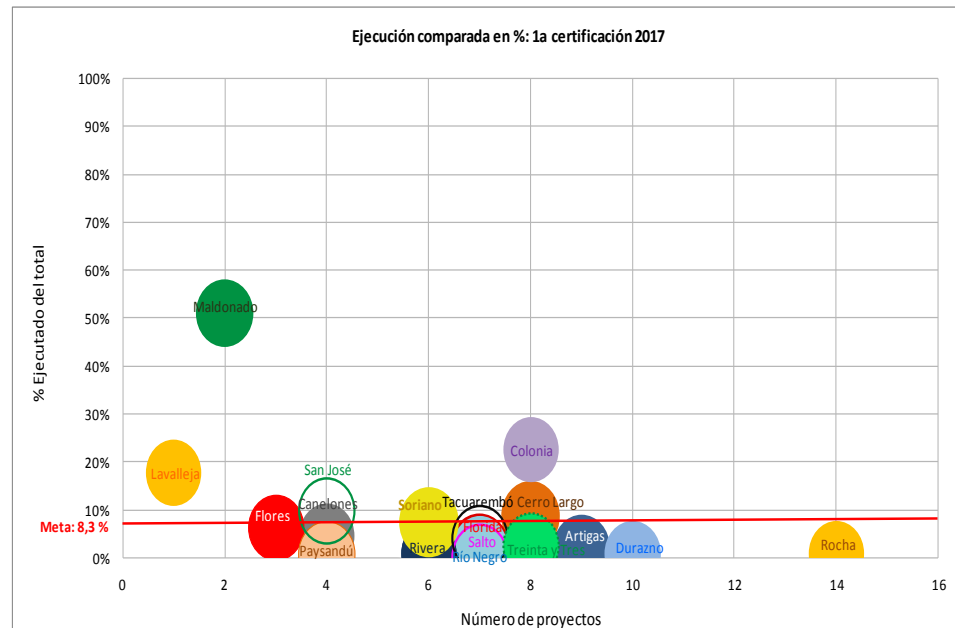
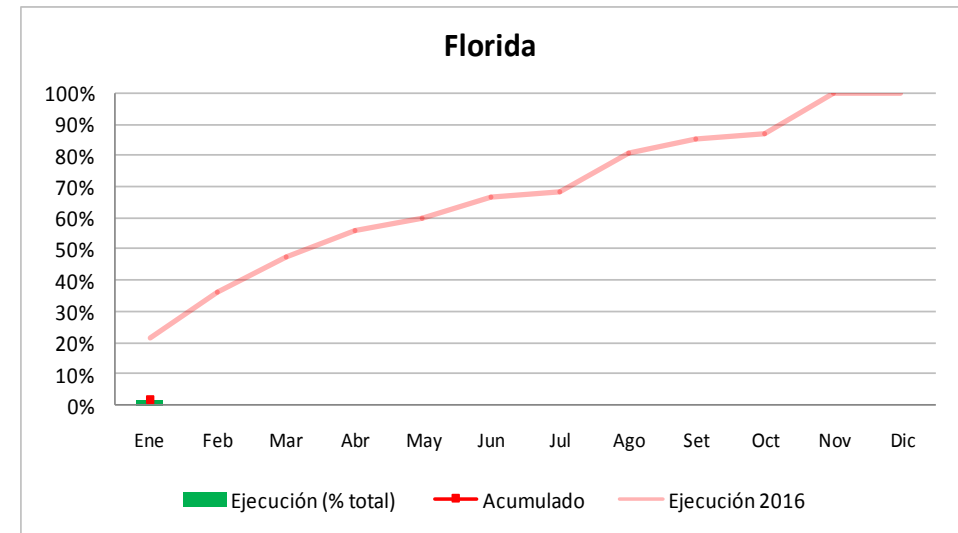


# Informe de Ejecución Fondo de Desarrollo del Interior - OPP

Correspondiente a la ejecución de enero 2017

FLORIDA

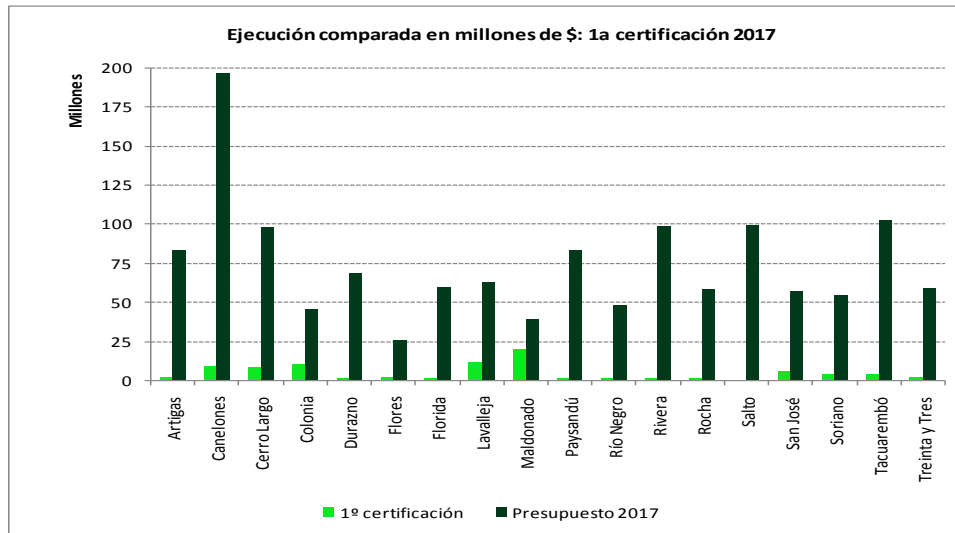

**Nota:** El gráfico muestra las certificaciones de ejecución otorgadas a la Intendencia en cada mes del año como porcentaje de la disponibilidad total ("Ejecución - % total"), el avance de todas las certificaciones de la Intendencia a la fecha ("Acumulado") y cómo fue el avance en la ejecución de la misma durante 2016 ("Ejecución 2016").

**Alícuota Intendencia en FDI: 4,5% Disponibilidad anual 2017: \$ 59.622.100**

- Total comprometido 2017: \$ 18.696.578
- Certificaciones acumuladas básico 2017: \$ 1.003.260
- Certificaciones acumuladas ajustadas 2017: \$ 1.003.260
- Saldo sin ejecutar básico: \$ 58.618.840
- Proyectos de mantenimiento/maquinaria (máx. permitido 20% de la disponibilidad anual): 0%

**Nota:** La línea roja representa el avance mínimo en la ejecución deseable para este mes, correspondiente al porcentaje que se habría acumulado a la fecha (8,33%) si ésta fuera perfectamente uniforme a lo largo del año (8,33% por certificación, por haber doce certificaciones en el presente año), meta que contribuiría al objetivo de evitar riesgos de una ejecución "tardía" en el año.

**Cartera de Proyectos – Evolución de la ejecución con respecto a lo planificado**

Cod. proyecto	Nombre Proyecto	Estado Etapa Actual	Financiamiento FDI	% ejecución FDI	Fecha inicio previsto	Meses previstos de ejecución (incluye ampliaciones)	Meses reales de ejecución desde inicio previsto	Meses sin ejecución durante todo el período	Ejecución con respecto a lo planificado
PRY2013/1053	Unidad de promoción del emprendedurismo y fondo de garantía	En Ejecución	<b>3.236.526</b>	<b>89%</b>	mar-2014	36	33	0	
PRY2014/1025	Plaza pública, multibarrial, deportiva y recreativa de la ciudad de Florida	En Ejecución	<b>49.591.714</b>	<b>98%</b>	ene-2015	9	23	9	
PRY2015/1011	Consolidación de infraestructura urbana en la localidad de Mendoza	En Ejecución	<b>11.422.829</b>	<b>74%</b>	oct-2015	12	14	3	
PRY2015/1038	Fortalecimiento institucional de la Dirección de Desarrollo con enfoque territorial	En Ejecución	<b>250.000</b>	<b>99%</b>	may-2016	6	8	4	
PRY2015/1040	Programa de inclusión social y trabajo	En Ejecución	<b>1.750.000</b>	<b>47%</b>	nov-2015	24	11	7	
PRY2015/1041	Unidad productiva para el desarrollo y difusión de la huerta orgánica familiar	En Ejecución	<b>1.915.725</b>	<b>57%</b>	oct-2015	12	14	6	
PRY2016/1054	Regularización de desagües pluviales en barrio Curuchet	En Ejecución	<b>10.330.137</b>	<b>4%</b>	nov-2016	10	2	1	
PRY2017/1001	Mejoras de la infraestructura urbana en la localidad de Casupá	En Evaluación	<b>15.186.622</b>						
PRY2017/1003	Mejoras en la infraestructura urbana en la localidad de Sarandí Grande	En Evaluación	<b>29.686.314</b>						

- Referencias:**
- La Intendencia ejecutó de acuerdo a lo planificado
  - La Intendencia tenía previsto ejecutar y no ejecutó
  - La intendencia está fuera del plazo previsto de ejecución o no ha replanificado el proyecto
