
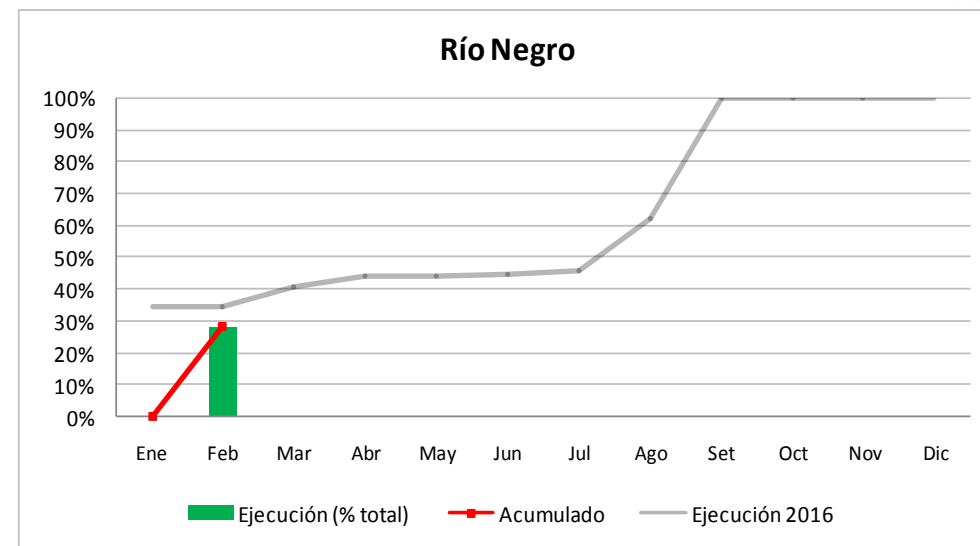



# Informe de Ejecución Fondo de Desarrollo del Interior - OPP

Correspondiente a la ejecución de febrero 2017

RÍO NEGRO

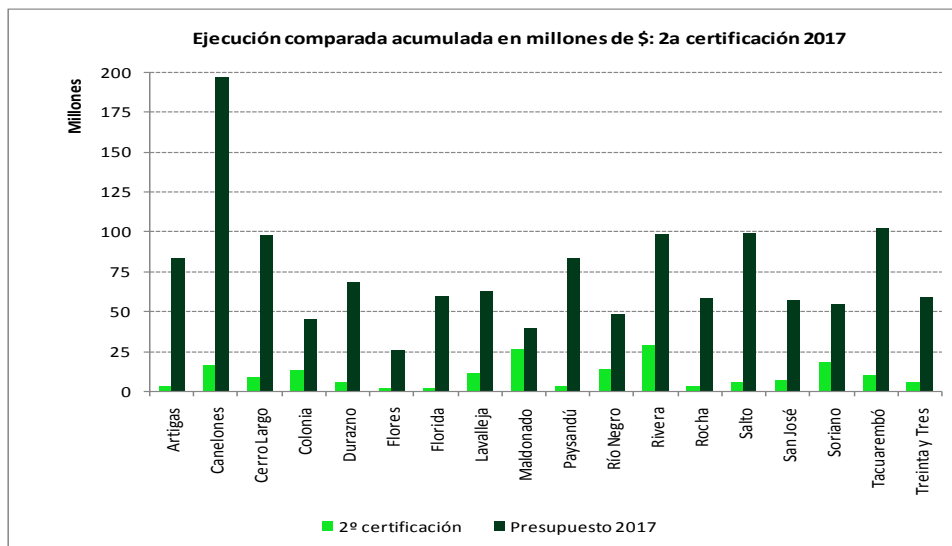

**Nota:** El gráfico muestra las certificaciones de ejecución otorgadas a la Intendencia en cada mes del año como porcentaje de la disponibilidad total ("Ejecución - % total"), el avance de todas las certificaciones de la Intendencia a la fecha ("Acumulado") y cómo fue el avance en la ejecución de la misma durante 2016 ("Ejecución 2016").

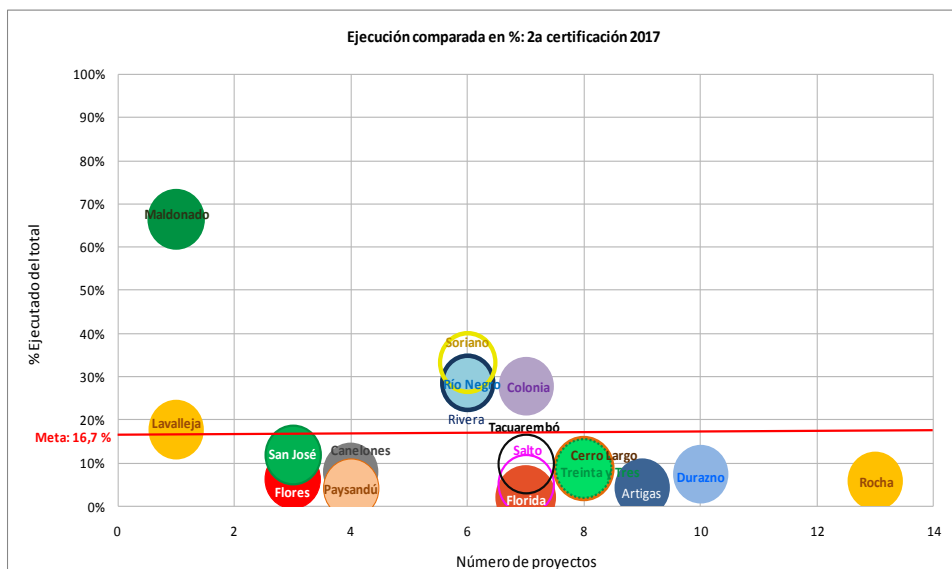

**Nota:** La línea roja representa el avance mínimo en la ejecución deseable para este mes, correspondiente al porcentaje que se habría acumulado a la fecha (16,7%) si ésta fuera perfectamente uniforme a lo largo del año (8,33% por certificación, por haber doce certificaciones en el presente año), meta que contribuiría al objetivo de evitar riesgos de una ejecución "tardía" en el año.

**Alícuota Intendencia en FDI: 3,6% Disponibilidad anual 2017: \$ 48.259.144**

- Total comprometido 2017: \$ 30.135.783
- Certificaciones acumuladas básico 2017: \$ 13.966.345
- Certificaciones acumuladas ajustadas 2017: \$ 14.564.278
- Saldo sin ejecutar básico: \$ 33.694.866
- Proyectos de mantenimiento/maquinaria (máx. permitido 20% de la disponibilidad anual): 0%

## Cartera de Proyectos – Evolución de la ejecución con respecto a lo planificado

Cod. proyecto	Nombre Proyecto	Estado Etapa Actual	Financiamiento FDI	% ejecución FDI	Fecha inicio previsto	Meses previstos de ejecución (incluye ampliaciones)	Meses reales de ejecución desde inicio previsto	Meses sin ejecución durante todo el período	Ejecución con respecto a lo planificado
PRY2012/1023	Centro de Rehabilitación Ecuestre en la Localidad de San Javier	En Ejecución	<b>2.072.501</b>	<b>100%</b>	set-2013	7	40	27	
PRY2015/1018	Consolidación de Avda. 18 de julio en la ciudad de Fray Bentos	En Ejecución	<b>17.742.438</b>	<b>88%</b>	set-2015	4	16	6	
PRY2015/1019	Rehabilitación de Avda. Zeballos de la ciudad de Young	En Ejecución	<b>6.487.591</b>	<b>82%</b>	set-2015	4	16	10	
PRY2015/1020	Consolidación Rambla Dr. Cuervo de la ciudad de Fray Bentos	En Ejecución	<b>11.683.653</b>	<b>90%</b>	set-2015	4	16	11	
PRY2015/1021	Rehabilitación de calle 25 de agosto en la ciudad de Young	En Ejecución	<b>11.798.983</b>	<b>80%</b>	set-2015	4	16	9	
PRY2016/1059	Recuperación de pavimentos en calles del departamento de Río Negro	En Ejecución	<b>47.446.615</b>	<b>80%</b>	set-2016	4	5	1	

## Referencias:



La Intendencia ejecutó de acuerdo a lo planificado

La Intendencia tenía previsto ejecutar y no ejecutó

La Intendencia está fuera del plazo previsto de ejecución o no ha replanificado el proyecto
