
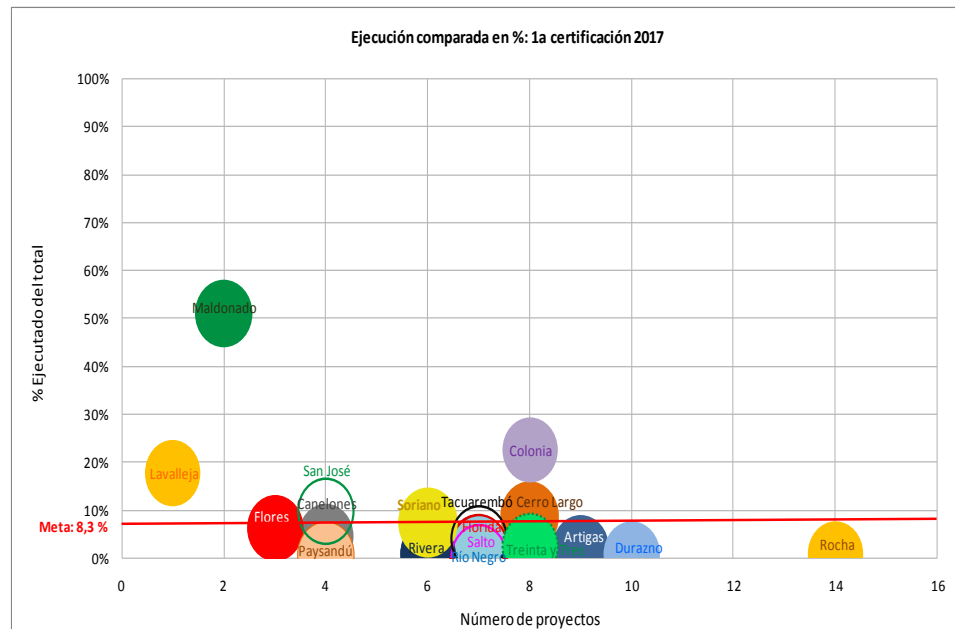
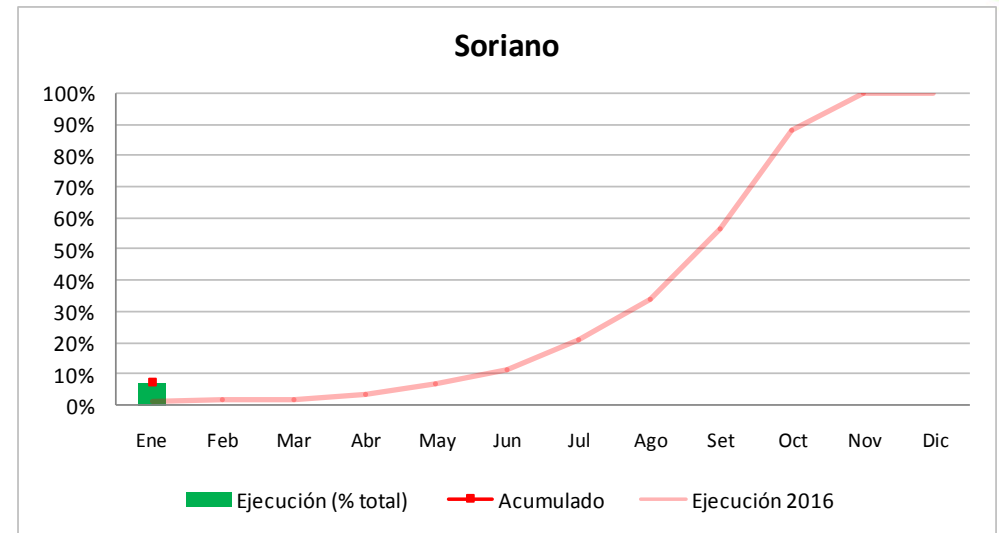


Informe de Ejecución Fondo de Desarrollo del Interior - OPP

Correspondiente a la ejecución de enero 2017

SORIANO

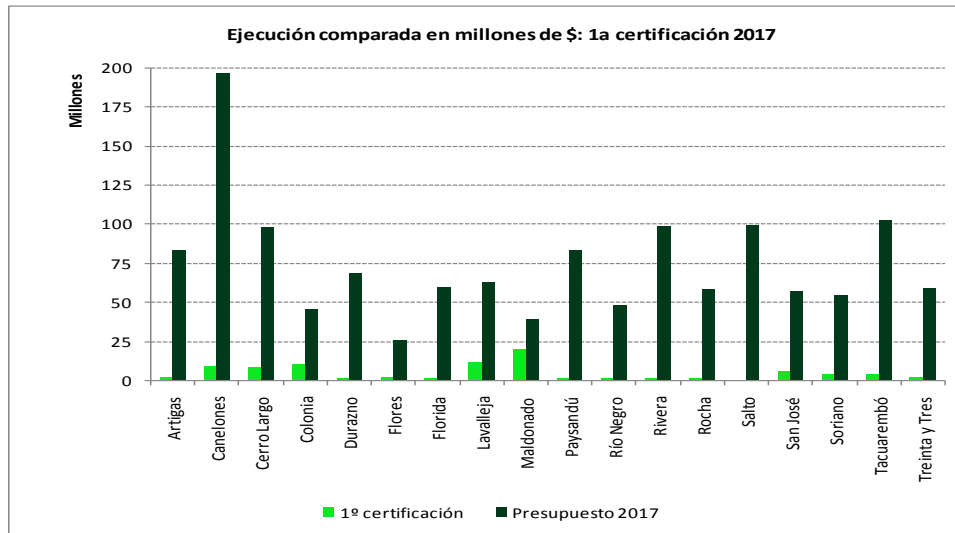

Nota: El gráfico muestra las certificaciones de ejecución otorgadas a la Intendencia en cada mes del año como porcentaje de la disponibilidad total ("Ejecución - % total"), el avance de todas las certificaciones de la Intendencia a la fecha ("Acumulado") y cómo fue el avance en la ejecución de la misma durante 2016 ("Ejecución 2016").


Alícuota Intendencia en FDI: 4,0% Disponibilidad anual 2017: \$ 53.740.100

- Total comprometido 2017: \$ 45.521.038
- Certificaciones acumuladas básico 2017: \$ 3.761.166
- Certificaciones acumuladas ajustadas 2017: \$ 4.006.711
- Saldo sin ejecutar básico: \$ 49.733.389
- Proyectos de mantenimiento/maquinaria (máx. permitido 20% de la disponibilidad anual): 0%

Nota: La línea roja representa el avance mínimo en la ejecución deseable para este mes, correspondiente al porcentaje que se habría acumulado a la fecha (8,33%) si ésta fuera perfectamente uniforme a lo largo del año (8,33% por certificación, por haber doce certificaciones en el presente año), meta que contribuiría al objetivo de evitar riesgos de una ejecución "tardía" en el año.

Cartera de Proyectos – Evolución de la ejecución con respecto a lo planificado

| Cod. proyecto | Nombre Proyecto | Estado Etapa Actual | Financiamiento FDI | % ejecución FDI | Fecha inicio previsto | Meses previstos de ejecución (incluye ampliaciones) | Meses reales de ejecución desde inicio previsto | Meses sin ejecución durante todo el período | Ejecución con respecto a lo planificado |
|---------------|---|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---|---|---|---|
| PRY2012/1014 | Programa Regional para el Desarrollo de la Quesería Artesanal - Fase II | En Ejecución | 677.956 | 46% | jul-2013 | 36 | 40 | 2 | |
| PRY2015/1001 | Acondicionamiento urbano del barrio Esperanza de la ciudad de Mercedes | En Ejecución | 22.336.956 | 87% | may-2016 | 9 | 8 | 0 | |
| PRY2015/1002 | Acondicionamiento urbano del barrio Hipódromo de la ciudad de Mercedes | En Ejecución | 36.902.279 | 20% | ene-2016 | 8 | 4 | 2 | |
| PRY2015/1066 | Camino a balneario La Concordia (PCR) | En Ejecución | 8.136.749 | 71% | nov-2015 | 7 | 13 | 9 | |
| PRY2016/1045 | Reforma de la semipeatonal de la ciudad de Mercedes | En Ejecución | 16.059.968 | 61% | oct-2016 | 5 | 3 | 0 | |
| PRY2016/1074 | Acuerdo Interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal | En Ejecución | 905.529 | 0% | sin iniciar | 36 | 0 | 0 | |
| PRY2016/1075 | Reconstrucción y reacondicionamiento de calles de zona 1 de la ciudad de Mercedes | En Evaluación | 20.526.168 | | | | | | |

Referencias:


La Intendencia ejecutó de acuerdo a lo planificado

La Intendencia tenía previsto ejecutar y no ejecutó

La intendencia está fuera del plazo previsto de ejecución o no ha replanificado el proyecto
