
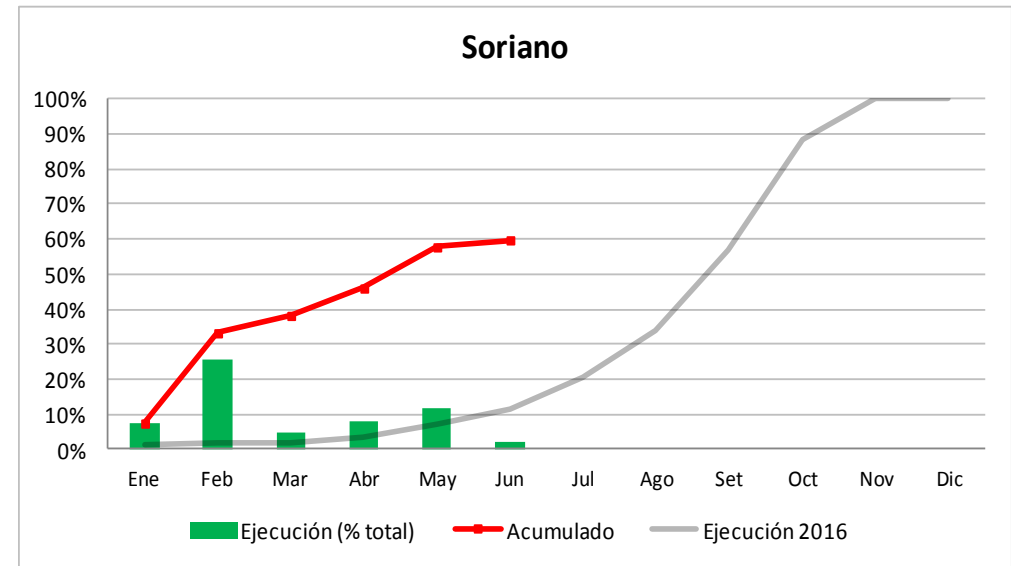



Informe de Ejecución Fondo de Desarrollo del Interior - OPP

Correspondiente a la ejecución de junio 2017

SORIANO

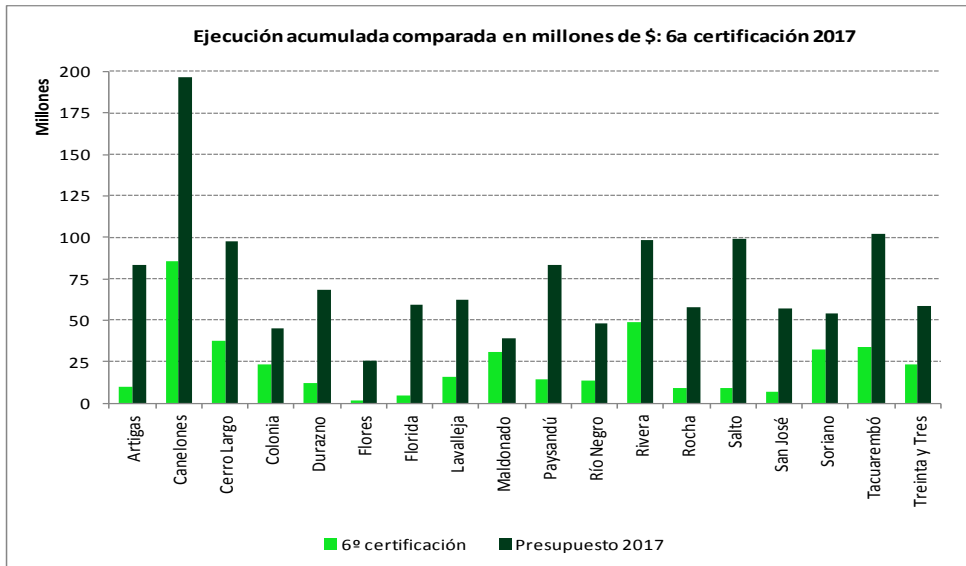

Nota: El gráfico muestra las certificaciones de ejecución otorgadas a la Intendencia en cada mes del año como porcentaje de la disponibilidad total ("Ejecución - % total"), el avance de todas las certificaciones de la Intendencia a la fecha ("Acumulado") y cómo fue el avance en la ejecución de la misma durante 2016 ("Ejecución 2016").

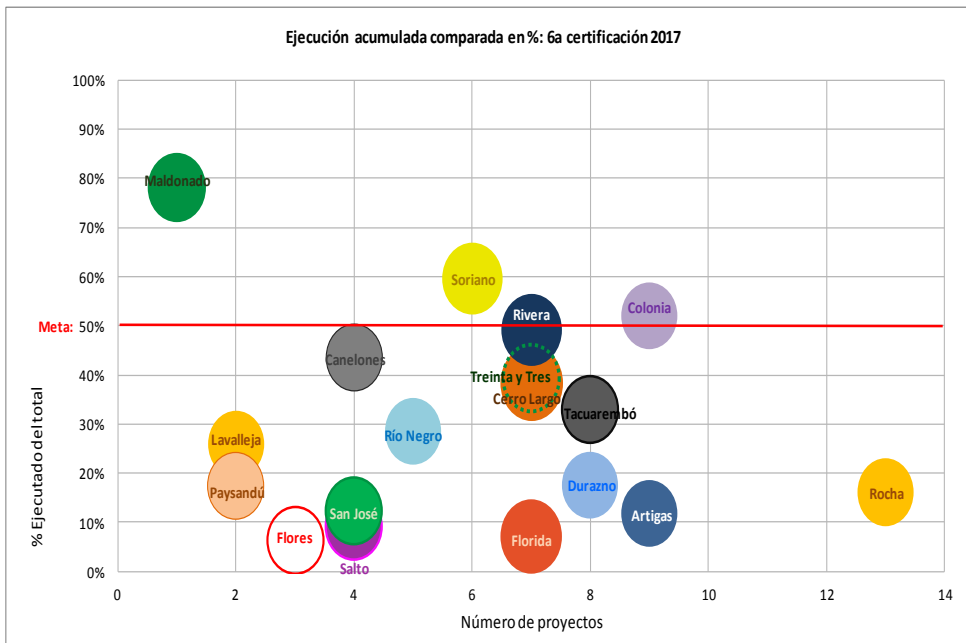

Nota: La línea roja representa el avance mínimo en la ejecución deseable para este mes, correspondiente al porcentaje que se habría acumulado a la fecha (50%) si ésta fuera perfectamente uniforme a lo largo del año (8,33% por certificación, por haber doce certificaciones en el presente año), meta que contribuiría al objetivo de evitar riesgos de una ejecución "tardía" en el año.


Alícuota Intendencia en FDI: 4,0% Disponibilidad anual 2017: \$ 53.740.100

- Total comprometido 2017: \$ 49.603.022
- Certificaciones acumuladas básico 2017: \$ 30.613.466
- Certificaciones acumuladas ajustadas 2017: \$ 32.080.899
- Saldo sin ejecutar básico: \$ 21.659.201
- Proyectos de mantenimiento/maquinaria (máx. permitido 20% de la disponibilidad anual): 0%

Cartera de Proyectos – Evolución de la ejecución con respecto a lo planificado

Cod. proyecto	Nombre Proyecto	Estado Etapa Actual	Financiamiento FDI	% ejecución FDI	Fecha inicio previsto	Meses previstos de ejecución (incluye ampliaciones)	Meses reales de ejecución desde inicio previsto	Meses sin ejecución durante todo el período	Ejecución con respecto a lo planificado
PRY2012/1014	Programa Regional para el Desarrollo de la Quesería Artesanal - Fase II	Ejecución	677.956	87%	jul-2013	36	45	4	
PRY2015/1002	Acondicionamiento urbano del barrio Hipódromo de la ciudad de Mercedes	Ejecución	36.902.279	72%	ene-2016	8	9	2	
PRY2015/1066	Camino a balneario La Concordia (PCR)	Ejecución	8.136.749	71%	nov-2015	7	18	14	
PRY2016/1045	Reforma de la semipeatonal de la ciudad de Mercedes	Ejecución	16.059.968	88%	oct-2016	5	8	0	
PRY2016/1074	Acuerdo Interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal	Ejecución	905.529	0%	sin iniciar	36	0	0	
PRY2016/1075	Reconstrucción y reacondicionamiento de calles de zona 1 de la ciudad de Mercedes	Ejecución	33.407.035	0%	set-2017	8	0	0	

Referencias:



La Intendencia ejecutó de acuerdo a lo planificado

La Intendencia tenía previsto ejecutar y no ejecutó

La intendencia está fuera del plazo previsto de ejecución o no ha replanificado el proyecto
