
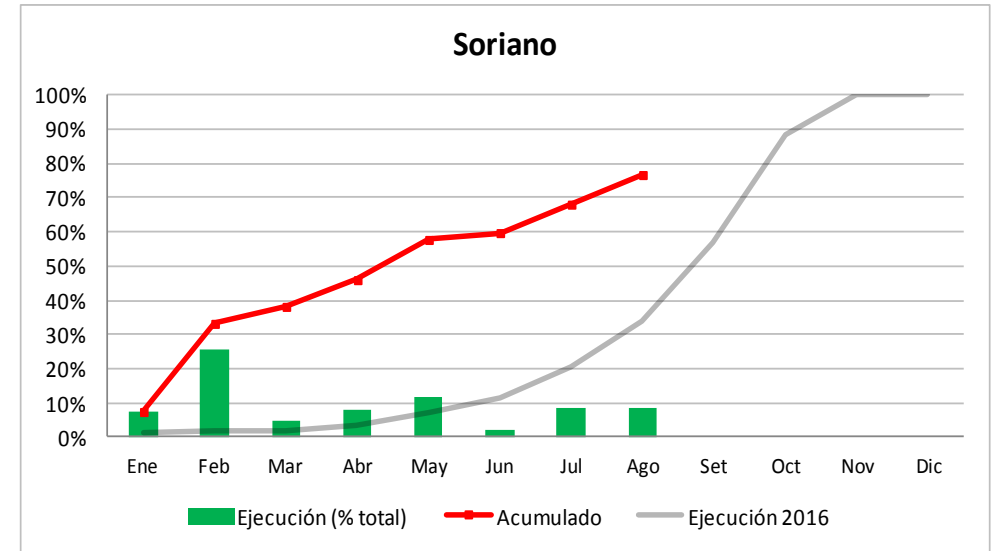



Informe de Ejecución Fondo de Desarrollo del Interior - OPP

Correspondiente a la ejecución de agosto 2017

SORIANO

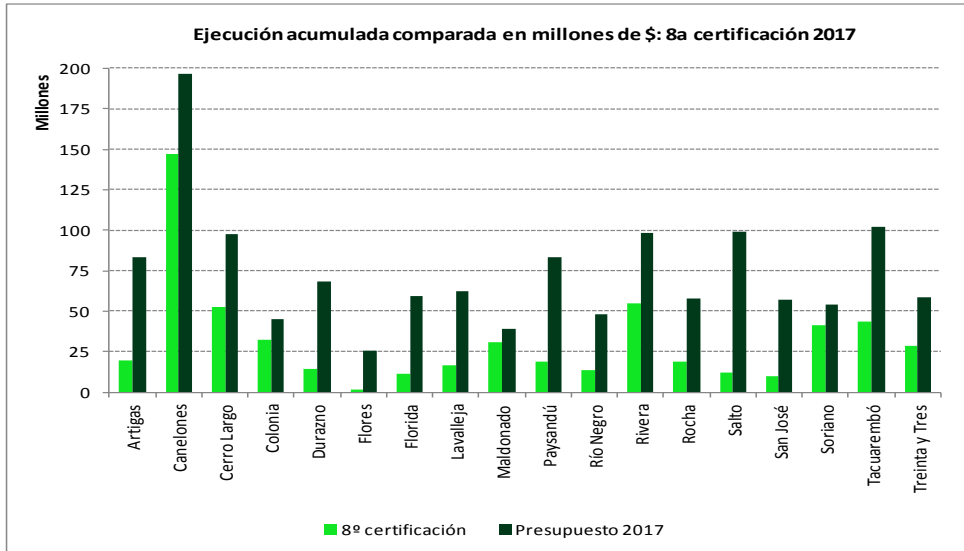

Nota: El gráfico muestra las certificaciones de ejecución otorgadas a la Intendencia en cada mes del año como porcentaje de la disponibilidad total ("Ejecución - % total"), el avance de todas las certificaciones de la Intendencia a la fecha ("Acumulado") y cómo fue el avance en la ejecución de la misma durante 2016 ("Ejecución 2016").

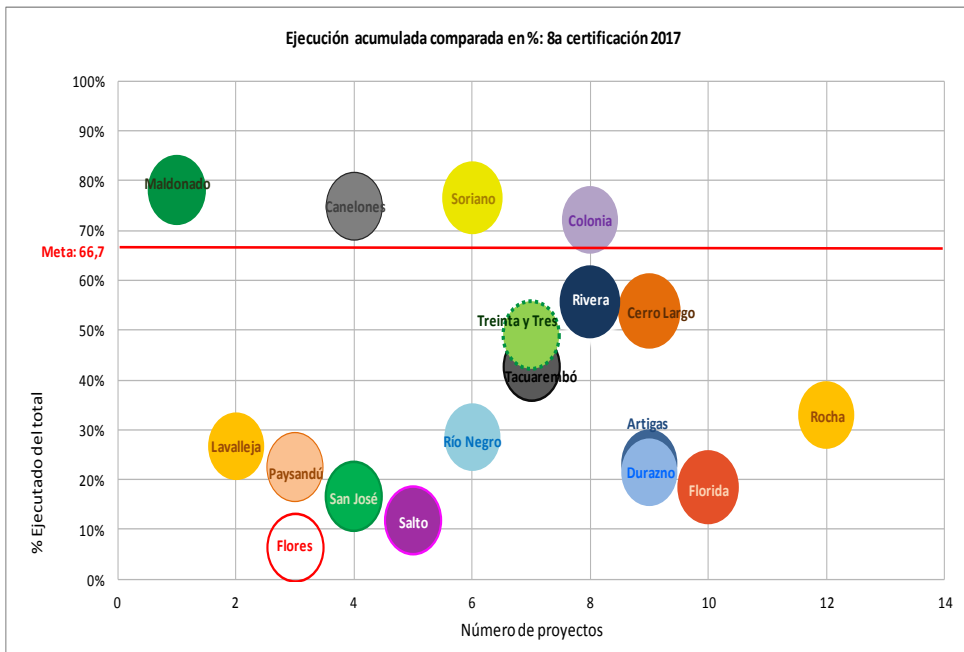

Nota: La línea roja representa el avance mínimo en la ejecución deseable para este mes, correspondiente al porcentaje que se habría acumulado a la fecha (66,7%) si ésta fuera perfectamente uniforme a lo largo del año (8,33% por certificación, por haber doce certificaciones en el presente año), meta que contribuiría al objetivo de evitar riesgos de una ejecución "tardía" en el año.


Alícuota Intendencia en FDI: 4,0% Disponibilidad anual 2017: \$ 53.740.100

- Total comprometido 2017: \$ 49.617.802
- Certificaciones acumuladas básico 2017: \$ 39.368.768
- Certificaciones acumuladas ajustadas 2017: \$ 41.188.505
- Saldo sin ejecutar: \$ 12.551.595
- Proyectos de mantenimiento/maquinaria (máx. permitido 20% de la disponibilidad anual): 0%

Cartera de Proyectos – Evolución de la ejecución con respecto a lo planificado

Cod. proyecto	Nombre Proyecto	Estado Etapa Actual	Financiamiento FDI	% ejecución FDI	Fecha inicio previsto	Meses previstos de ejecución (incluye ampliaciones)	Meses reales de ejecución desde inicio previsto	Meses sin ejecución durante todo el período	Ejecución con respecto a lo planificado
FDI2012/1014	Programa Regional para el Desarrollo de la Quesería Artesanal - Fase II	Ejecución	677.956	87%	jul-2013	36	47	6	
FDI2015/1002	Acondicionamiento urbano del barrio Hipódromo de la ciudad de Mercedes	Ejecución	33.570.677	100%	ene-2016	8	11	2	
FDI2015/1066	Camino a balneario La Concordia (PCR)	Ejecución	8.136.437	94%	nov-2015	7	20	15	
FDI2016/1045	Reforma de la semipeatonal de la ciudad de Mercedes	Ejecución	14.947.700	95%	oct-2016	5	10	2	
FDI2016/1074	Acuerdo Interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal	Ejecución	905.529	0%	sin iniciar	36	0	0	
FDI2016/1075	Reconstrucción y reacondicionamiento de calles de zona 1 de la ciudad de Mercedes	Ejecución	33.407.035	0%	set-2017	8	0	0	

Referencias:



La Intendencia ejecutó de acuerdo a lo planificado

La Intendencia tenía previsto ejecutar y no ejecutó

La Intendencia está fuera del plazo previsto de ejecución o no ha replanificado el proyecto
