CSD

Comisión Sectorial de Descentralización

INFORME

Programa Fondo de Desarrollo del Interior
Programa Caminos Rurales Productivos
Mantenimiento Caminería Rural

Abril **2024**

Oficina
de Planeamiento
y Presupuesto

1. PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR 2

1.1 Proyectos para aprobación 2

1.2 Ampliaciones de proyectos para aprobación 12

1.3 Proyectos en evaluación 15

1.4 3° Certificación 2024 18

1.5 Ejecución 2024 23

1.6 Presupuesto comprometido 2024 30

1.7 Pagos 34

2. PROGRAMA CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS 35

2.1 Proyectos para aprobación 35

2.2 Proyectos en evaluación 40

2.3 3º Certificación 2024 41

2.4 Montos disponibles 42

2.5 Pagos 46

3. MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL – PROYECTO 999 47

3.1 Planes para aprobación 47

3.2 Ejecución 48

3.3 Pagos 50

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1. PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR

1.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: FDI2024/1006 Mantenimiento de calles en barrio Hipódromo en el Municipio de Bañado Medina

Departamento: Cerro Largo

Técnico evaluador: Ing. Ricardo Gamboa

Descripción: Mantenimiento de 14 cuadras en el barrio el Hipódromo, a través de la ejecución de 17.055m2 de pavimento de tratamiento bituminoso doble con sellado.

Objetivo general: Mejora de la transitabilidad.

Productos:
- 17.055m2 tratamiento bituminoso
- 780m caños

Beneficiarios: Vecinos frentistas a las calles a intervenir.

Técnico responsable del proyecto: Arq. Federico Ávila

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 9 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Enero 2025

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	$ 10:677.812	$ 9:076.140	$ 1:601.672
Porcentaje	100%	85%	15%

Proyecto: FDI2024/1009 Remodelación de barrio Bella Unión de la ciudad de Colonia Valdense

Departamento: Colonia

Técnica evaluadora: Ing. Cecilia Quirós

Descripción: Las calzadas actuales del barrio Bella Unión cuentan con pavimento asfáltico de ancho reducido, asociándose a ello una alta peligrosidad para los automovilistas y peatones. Con el presente proyecto se pretende agregarle valor a esta zona urbana con infraestructura, incluyéndose en ello la arteria de mayor importancia en el barrio. La construcción de entubado, cordón cuneta y pavimento renovado permitirá contar con un mayor ancho de calzada para una circulación vehicular más segura. Estos elementos contribuirán en jerarquizar el barrio afectado y toda su zona de influencia.

Objetivo general: Mejorar las condiciones de infraestructura del barrio Bella Unión de la ciudad de Colonia Valdense.

Productos:
- 12.000m2 tratamiento bituminoso
- 2.500m cordón cuneta
- 43m3 hormigón de estructuras
- 170m caños

Beneficiarios: 3.235 personas. Fuente: OTU

Técnico responsable del proyecto: Ing. Gonzalo Santos

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 6 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Junio 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	$ 23:028.955	$ 19:574.612	$ 3:454.343
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Falta presentación de la nota firmada por el Alcalde para que el proyecto sea considerado dentro del 15% del presupuesto destinado a proyectos en territorio municipalizado.

Proyecto: FDI2023/1083 Mejora integral de la Avda. Héctor Gutiérrez Ruiz de la ciudad de Durazno

Departamento: Durazno

Técnico evaluador: Ing. Francisco Sorribas

Descripción: Intervención integral de la Avda. Gutiérrez Ruiz en el tramo que se extiende desde la calle Maciel hasta la Avda. Kennedy en una longitud de 1.350m.
La intervención se compone de las siguientes obras:

- Cambio del perfil transversal actual (de calzada simple) a perfil de doble calzada (de 5,80m de ancho c/u) y cantero central de 1,50m.
- Reconstrucción de nueva estructura de bases con estabilización con cemento portland de la capa superior (espesor 15cm).
- Construcción de nuevo sistema de canalización de aguas pluviales conformado por cordones cuneta, badenes, colectores y alcantarillas.
- Colocación de capa de rodadura de mezcla asfáltica de 6cm de espesor.
- Construcción de sendas peatonales y rampas de accesibilidad en tramos más urbanizados.
- Incorporación de nueva señalización vertical y horizontal.
- Incorporación de nueva red de alumbrado led en toda la extensión del tramo del proyecto.

Objetivo general:

- Jerarquizar la Avda. Gutiérrez Ruiz.
- Brindar mejores condiciones de habitabilidad para los vecinos de la zona.
- Brindar condiciones de mayor comodidad y seguridad para la circulación vehicular y peatonal.
- Generar condiciones más favorables para el desarrollo de la zona.
- Disminuir los actuales costos de mantenimiento.

Productos:

- 17.526m2 carpeta asfáltica
- 4.923m cordón cuneta
- 489m caños
- 145m2 badén
- 6u bocas de tormenta
- 2.732m2 sendas peatonales
- 43u rampas
- 212m2 señalización horizontal
- 25u señalización vertical
- 76u luminarias

Beneficiarios: 3.965 personas.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Ángel Chá

Categoría de proyecto: Infraestructura integral

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 10 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Diciembre 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	$ 90:760.926	$ 77:146.787	$ 13:614.139
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Previo al inicio de la etapa de certificación y de acuerdo a lo establecido oportunamente en el contrato con la empresa adjudicataria de la licitación de las obras del proyecto, se deberá realizar el ajuste de precios unitarios, el monto total de LL.SS y el mes base para el cálculo del ajuste paramétrico. También se deberá ajustar la cantidad de cemento portland para estabilización de base (estimada en forma teórica) de acuerdo a lo que determinen los ensayos correspondientes realizados oportunamente sobre el tramo de prueba.

Proyecto: FDI2024/1001 Monitoreo de aguas superficiales en Río Yí, Río Negro y afluentes

Departamento: Durazno

Técnico evaluador: Ing. Guillermo Pepe

Descripción: El monitoreo de la calidad del agua es fundamental para la protección de la salud humana, la conservación de los ecosistemas acuáticos, la sostenibilidad de los usos del agua, lo que permite identificar tendencias y problemáticas que requieran atención.

La Intendencia Departamental de Durazno (IDD) cuenta con un equipo integrado por técnicos en control ambiental y tecnologías en aguas y desarrollo sostenible. También cuenta con algunos equipos de mediano porte que se detallaran a continuación:

- Fotómetro Lovibond MD600/MaxiDirect, el mismo tiene capacidad para determinar más de 130 parámetros.
- Termoreactor Lovibond con capacidad para digerir 24 muestras en momentáneo.
- Sonda Multiparamétrica Portátil Acuaread AP-2 capacidad para determinar temperatura (temp), Potencial Óxido Reducción (ORP), Potencial de Hidrógeno (pH), Oxígeno Disuelto (OD), Conductividad Eléctrica (EC), Sólidos Totales Disueltos (TDS), Salinidad (SAL), cada punto muestreado queda georreferenciado con su función de GPS con latitud, longitud, altitud y profundidad.
- Sistema de medición de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) con armario termostático.

En la actualidad la Intendencia no cuenta con los recursos necesarios para comprar los reactivos de determinación de parámetros en el fotómetro.

La sonda Multiparamétrica se encuentra averiada por lo cual es de suma importancia su reparación a la brevedad.
El proyecto consiste en reparar la sonda y adquirir los insumos mencionados.

Objetivo general: Monitorear la calidad del agua de los ríos Yí y Río Negro por parte del Departamento de Desarrollo División Medio Ambiente de la Intendencia de Durazno.

Técnico responsable del proyecto: Claudio Piñeyro

Categoría de proyecto: Incremento o mejora de las capacidades

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 12 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Mayo 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	$ 775.956	$ 659.563	$ 116.393
Porcentaje	100%	85%	15%

Proyecto: FDI2024/1018 Compra de maquinaria para el Municipio de Ismael Cortinas

Departamento: Flores

Técnica evaluadora: Arq. Alicia Varela

Descripción: Adquisición de un camión doble eje con volcadora para realizar tareas varias en el Municipio de Ismael Cortinas. Dado que el mismo cuenta con cantera, la actividad principal del vehículo será el transporte de áridos para las diversas obras que lleva a cabo este municipio.

Objetivo general: Facilitar el transporte de productos áridos que realiza el Municipio de Ismael Cortinas.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Valeria Soba

Proyecto en Territorio municipalizado: Si

Categoría de proyecto: Maquinaria

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 6 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Mayo 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	$ 3:510.000	$ 2:983.500	$ 526.500
Porcentaje	100%	85%	15%

Proyecto: FDI2024/1010 Recuperación de calles de barrio La Coronilla de la ciudad de Minas

Departamento: Lavalleja

Técnico evaluador: Ing. Ricardo Gamboa

Descripción: Atender las necesidades de los habitantes del barrio La Coronilla de la ciudad de Minas en lo que respecta a la vialidad y servicialidad que esta pueda ofrecer, en 24 cuadras del barrio.

Objetivo general: Adecuación y mejora de la servicialidad de las calles del barrio La Coronilla de la ciudad de Minas.

Productos:

- 23.497m2 tratamiento bituminoso
- 370m caños
- 6u señalización vertical

Técnico responsable del proyecto: Ing. Richard Estévez

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 4 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Mayo 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	$ 15:298.170	$ 13:003.445	$ 2:294.725
Porcentaje	100%	85%	15%

Proyecto: FDI2024/1012 Mejora en la infraestructura de agua para productores familiares del Departamento de Rocha

Departamento: Rocha

Técnico evaluador: Lic. José Raúl Rodríguez

Descripción: Apoyo a pequeños productores familiares del departamento de Rocha en la construcción de pozos semisurgentes. Se realiza un llamado a licitación para la contratación de empresa perforadora. Se establece un acuerdo con BROU Microfinanzas para otorgar préstamos a los beneficiarios para la compra de materiales, estudios y el pago de honorarios para el registro del pozo ante la Dirección Nacional de Agua (DINAGUA) del Ministerio de Ambiente.

Objetivo general: Acceso al agua por parte de los productores familiares del departamento de Rocha.

Productos:

- 15u abastecimiento de agua

Beneficiarios: 15 productores familiares

Técnicos responsables del proyecto: Ana Castillos y Martín Rodríguez

Categoría de proyecto: Desarrollo productivo

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 12 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Abril 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	$ 3:945.571	$ 3:353.735	$ 591.836
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación:

1. Actualizar planilla de presupuesto, incluido el rubro de monitoreo.
2. Informar sobre el contrato con la empresa seleccionada.
3. Se certifica contra perforaciones realizadas e instalaciones listas para funcionar, incluida la inscripción en DINAGUA.

Proyecto: FDI2024/1027 Reacondicionamiento de calles en la ciudad de Paso de los Toros y alrededores

Departamento: Tacuarembó

Técnica evaluadora: Ing. María Indarte

Descripción: El incremento de la población en estos años y su respectiva movilidad (en forma privada y a través del uso de transporte colectivo desde y hacia la planta de UPM) ha generado un acelerado deterioro de la infraestructura vial existente que ya contaba con varios años de realizada. Se propone realizar tratamiento bituminoso doble en cuadras que se encuentran en mal estado. El proyecto es una continuación del proyecto ejecutado el año 2023 en el que se realizaron las mismas tareas en las calles más afectadas de la localidad.

Objetivo general: Mejora de las condiciones de la infraestructura vial.

Productos:

- 61.569m2 tratamiento bituminoso
- 732m cordón cuneta
- 250m2 badén

Beneficiarios: 13.322 personas, habitantes de Paso de los Toros.

Técnico responsable del proyecto: Arq. Enzo Vallejos

Proyecto en Territorio municipalizado: Si

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 9 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Abril 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	$ 35:482.262	$ 30:159.923	$ 5:322.339
Porcentaje	100%	85%	15%

Proyecto: FDI2023/1077 Gimnasio cerrado en Rincón

Departamento: Treinta y Tres

Técnico evaluador: Arq. Alberto Leira

Descripción: Construcción de un gimnasio cerrado de 870m2 en el predio de AFE con la finalidad de poder desarrollar actividades deportivas y recreativas a lo largo de todo el año. La localidad no cuenta en la actualidad con instalaciones a tales efectos.

Objetivo general: Incentivar el deporte en la localidad y en el departamento.

Beneficiarios: 674 personas, habitantes de la localidad de Rincón. Fuente: Censo INE 2011.

Técnica responsable del proyecto: Arq. Ana Inés Cabrera

Categoría de proyecto: Edificaciones

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 5 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Julio 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	$ 16:664.745	$ 14:165.034	$ 2:499.711
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Presentación del Comodato firmado por AFE que autorice el uso del padrón correspondiente y el plan de gestión.

1.2 Ampliaciones de proyectos para aprobación

Proyecto: FDI2021/1075 Construcción de infraestructura vial e hidráulica en Camino de los Horneros y Av. a la Rambla Costanera

Departamento: Canelones

Técnico supervisor: Ing. Francisco Sorribas

Descripción: La Intendencia de Canelones presenta solicitud de ampliación del proyecto con el objetivo de incluir el tramo costanera (Manuel Márquez entre el Camino de los Horneros y la calle Iberia. La intervención comprende obras viales, hidráulicas, de señalización y la construcción de una rotonda en la intersección del tramo con el Camino de los Horneros. Las obras viales consideran bacheo y levante de sub base en puntos bajos, recargo de 20 cm de capa de base y aplicación de capa de rodadura de mezcla asfáltica de 12cm. Las obras hidráulicas consideran la construcción de 10 entradas particulares y 1 alcantarilla transversal. La componente de señalización considera aplicación de línea amarilla discontinua al eje, líneas blancas en bordes y colocación de 28 carteles. La ejecución se realizará a través de la LP 7/2020 (Contrato con la Empresa Grinor S.A.) y el plazo previsto es de 3 meses. La presente constituye la 2da ampliación del Proyecto y representa el 20% del monto original y acumula el 33% considerando la suma con la primera ampliación realizada en agosto de 2021.

Plazo de ejecución: 3 meses

Modalidad de ejecución: Contrato

Presupuesto

	Total	**FDI**	**Contrapartida**
Precios básicos	$ 17:215.304	$ 14:633.008	$ 2:582.296
Porcentaje	100%	85%	15%

Proyecto: FDI2023⁄1053 Construcción de calles en la localidad de Mariscala

Departamento: Lavalleja

Técnica supervisora: Ing. Cecilia Quirós

Descripción: La Intendencia de Lavalleja presenta solicitud de ampliación del proyecto con el objetivo de incorporar 7 cuadras al proyecto original.

Plazo de ejecución: 3 meses

Modalidad de ejecución: Administración

Presupuesto

	Total	**FDI**	**Contrapartida**
Precios básicos	$ 3:691.949	$ 3:138.157	$ 553.792
Porcentaje	100%	85%	15%

Proyecto: FDI2023/1070 Reconstrucción de plaza de juegos en Pueblo Biassini

Departamento: Salto

Técnico supervisor: Ing. Ricardo Gamboa

Descripción: La Intendencia de Salto presenta solicitud de ampliación del proyecto con el objetivo de incorporar una nueva batería de juegos y una garita de ómnibus con bolardos de protección.

Plazo de ejecución: 1 mes

Modalidad de ejecución: Contrato

Presupuesto

	Total	**FDI**	**Contrapartida**
Precios básicos	$ 1:692.001	$ 1:438.201	$ 253.800
Porcentaje	100%	85%	15%

1.3 Proyectos en evaluación

Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentario CSD
Canelones	FDI2024/1014	Pavimentación de Avenida Queguay en el Pinar	Ing. María Indarte	2024-02-29	Visita al territorio realizada
Canelones	FDI2024/1013	Construcción de Paseo Costero en Ciudad de la Costa - Etapa 2	Ing. María Indarte	2024-02-29	Visita al territorio realizada
Cerro Largo	FDI2024/1005	Mantenimiento de calles en barrios Blocona y Sur de la ciudad de Melo	Ing. Ricardo Gamboa	2024-01-17	Observaciones y sugerencias técnicas en elaboración
Colonia	FDI2024/1016	Reasfaltado con carpeta asfáltica en calles de Colonia del Sacramento	Ing. Cecilia Quirós	2024-03-04	Visita al territorio realizada
Colonia	FDI2024/1002	Construcción de piscina en plaza de deportes de la ciudad de Nueva Palmira	Arq. Alicia Varela	2024-01-15	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Durazno	FDI2024/1017	Mantenimiento de pavimentos en carpeta asfáltica de la ciudad de Durazno	Arq. Alicia Varela	2024-03-08	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID

Florida	FDI2024/1015	Mantenimiento de infraestructura vial de la localidad de La Cruz	Ing. Mario Capote	2024-03-01	Documentación en estudio
Lavalleja	FDI2022/1093	Fortalecimiento sistema operativo	Ec. Verónica Leiza	2022-09-12	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Lavalleja	FDI2024/1020	Reparación de calles de Minas Oeste	Ing. Cecilia Quirós	2024-03-19	Documentación en estudio
Maldonado	FDI2024/1024	Compra de maquinaria	Ing. Cecilia Quirós	2024-04-03	Documentación en estudio
Paysandú	FDI2024/1025	Cordón cuneta, drenaje urbano y tratamiento bituminoso en barrio Centro - Localidad de Guichón	Ing. Isabel Agustins	2024-04-04	Documentación en estudio
Paysandú	FDI2024/1026	Parque lineal costero - Ciudad de Paysandú	Arq. Alberto Leira e Ing. Isabel Agustins	2024-04-04	Documentación en estudio
Río Negro	FDI2022/1119	Parque lineal Algorta	Arq. Carolina Ghio	2022-12-07	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID

Rivera	FDI2024/1021	Construcción de infraestructura vial en la Ciudad de Tranqueras - Parte 2	Ing. Mario Capote	2024-03-19	Visita al territorio en coordinación
Salto	FDI2023/1046	Fortalecimiento institucional de la Dirección de Hacienda	Ec. Verónica Leiza	2023-07-13	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Salto	FDI2024/1019	Construcción de infraestructura de Barrio Dickinson Barbieri, Chinchurreta y Umpierrez	Ing. Francisco Sorribas	2024-03-18	Documentación en estudio
San José	FDI2024/1023	Pavimentación y construcción de alcantarillas en camino El Haras	Ing. Isabel Agustins	2024-03-21	Documentación en estudio
Soriano	FDI2022/1061	Recuperación de calles de hormigón de la ciudad de Mercedes	Ing. Francisco Sorribas	2022-07-04	Documentación en estudio
Tacuarembó	FDI2023/1034	Desarrollo del turismo	Ing. Agr. Andrés Fonseca, Mariana Goñi	2023-06-09	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Treinta y Tres	FDI2024/1022	Treinta y Tres: Destino audiovisual	Ing. Agr. Andrés Fonseca	2024-03-21	Documentación en estudio

1.4 3° Certificación 2024

Certificaciones - Ejecución Marzo/2024			
Organismo	**Codproyecto**	**Nombre Proyecto**	**Monto certificado $**
Artigas - OPP	FDI2021/1008	Mantenimiento vial de calles céntricas de la ciudad de Bella Unión	343.652
Artigas - OPP	FDI2021/1100	Construcción de pluviales y pavimentos en calles del barrio Las Piedras de la ciudad de Bella Unión	795.646
Artigas - OPP	FDI2021/1115	Infraestructura vial y pluvial en barrio El Tropezón de la ciudad de Bella Unión	2.676.589
Artigas - OPP	FDI2021/1173	Promoción de emprendimientos productivos	186.300
Canelones - OPP	FDI2023/1010	Construcción de infraestructura de drenaje pluvial y vialidad en San José de Carrasco Norte en Ciudad de la Costa	8.000.106
Cerro Largo - OPP	FDI2021/1028	Recalificación zona Norte de la ciudad de Melo	3.462.672
Cerro Largo - OPP	FDI2023/1017	Adquisición de un semiremolque cisterna	2.458.946
Colonia - OPP	FDI2021/1160	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	124.562
Colonia - OPP	FDI2023/1018	Remodelación urbana en zona norte de la ciudad de Tarariras	1.839.493
Flores - OPP	FDI2021/1161	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	11.813

Florida - OPP	FDI2021/1162	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	23.589
Florida - OPP	FDI2022/1012	Ovinos de Florida	134.946
Florida - OPP	FDI2022/1030	Cuencas lecheras	79.489
Florida - OPP	FDI2022/1033	Construcción de saneamiento, pluviales, pavimentos y plaza de barrio Abasto en la localidad de Sarandí Grande	2.403.730
Florida - OPP	FDI2023/1078	Consolidación de la horticultura de Florida	389.098
Lavalleja - OPP	FDI2021/1024	Consolidación barrio Peñarol de la ciudad de Minas	687.994
Paysandú - OPP	FDI2022/1041	Cuencas lecheras	39.386
Paysandú - OPP	FDI2023/1009	Cordón cuneta y tratamiento bituminoso en barrio MEVIR IV de la localidad de Piedras Coloradas	588.047
Paysandú - OPP	FDI2023/1044	Urbanización barrio Nuevo Paysandú de la ciudad de Paysandú	1.297.313
Paysandú - OPP	FDI2023/1076	Paysandú Sostenible II	118.399
Río Negro - OPP	FDI2021/1163	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	16.892
Río Negro - OPP	FDI2022/1042	Cuencas lecheras	39.732
Río Negro - OPP	FDI2022/1076	Consolidación urbana en zona aduanera de la ciudad de Fray Bentos - Etapa 1	663.802
Río Negro - OPP	FDI2022/1101	Mejora de infraestructura y ampliación de instalaciones en Parque Liebig	422.837

Río Negro - OPP	FDI2023/1043	Salón multiuso en fracción chacra huerta	743.419
Rivera - OPP	FDI2020/1010	Acondicionamiento vial y pluvial de los barrios Centro, Máximo Xavier y Carmelo Sosa de la ciudad de Rivera	417.242
Rivera - OPP	FDI2021/1007	Reforma y acondicionamiento del Teatro Municipal de la ciudad de Rivera	861.249
Rivera - OPP	FDI2021/1107	Desarrollo del sector ovino en el Departamento de Rivera	118.675
Rivera - OPP	FDI2021/1130	Desarrollo de la cadena de valor hortifrutícola del departamento de Rivera	126.404
Rivera - OPP	FDI2021/1183	Plan director para el diseño, ejecución y mantenimientos de áreas verdes de la ciudad de Rivera	121.815
Rivera - OPP	FDI2022/1091	Fortalecimiento del proceso productivo apícola	196.020
Rivera - OPP	FDI2023/1052	Mantenimiento y acondicionamiento del Estadio Atilio Paiva Olivera de la ciudad de Rivera - Etapa 2	4.626.402
Rocha - OPP	FDI2022/1003	Terminal de ómnibus en la ciudad de Castillos	1.594.288
Salto - OPP	FDI2021/1001	Adecuación de vías de comunicación, espacio público y drenajes en barrio Artigas de la ciudad de Salto	6.510.458
Salto - OPP	FDI2021/1018	Recuperación integral costanera norte de la ciudad de Salto	2.217.626

Salto - OPP	FDI2021/1117	Construcción de ciclovía en colonia Lavalleja-Lluveras Municipio de Lavalleja	884.175
Salto - OPP	FDI2021/1152	Construcción de infraestructura de Paseo Costero en Villa Constitución - Etapa 1	1.380.990
Salto - OPP	FDI2022/1046	Cuencas lecheras	39.732
Salto - OPP	FDI2022/1071	Remodelación de Plaza Constitución en Pueblo Belén	657.487
Salto - OPP	FDI2023/1021	Adecuación de Avda. Apolón de Mirbeck en la ciudad de Salto - Etapa 2	3.637.210
Salto - OPP	FDI2023/1050	Compra de camión cisterna	3.733.870
Salto - OPP	FDI2023/1056	Desarrollo de la cadena hortifrutícola	137.219
Salto - OPP	FDI2023/1059	Máquinas viales y camiones para obras	435.788
Salto - OPP	FDI2023/1071	Adecuación de Avda. Apolón de Mirbeck en la ciudad de Salto - Etapa 3	3.218.832
Salto - OPP	FDI2023/1082	Fortalecimiento de capacidades técnicas y equipos de la Dirección de Hacienda y Administración	125.605
San José - OPP	FDI2021/1164	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	176.290
Soriano - OPP	FDI2021/1165	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	42.210
Soriano - OPP	FDI2022/1050	Cuencas lecheras	39.732
Soriano - OPP	FDI2022/1063	Complejo Deportivo Mercedes	6.399.533

Tacuarembó - OPP	FDI2021/1042	Reacondicionamiento barrio San Gabriel de la ciudad de Tacuarembó	1.039.569
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1174	Remodelación y construcción de Bvar. Manuel Rodríguez Correa en la ciudad de Tacuarembó	434.538
Tacuarembó - OPP	FDI2022/1112	Reacondicionamiento de calles en la localidad de Tambores	2.857.476
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1170	EcoPredio	37.017
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1176	Plan director de arbolado	20.740
Treinta y Tres - OPP	FDI2023/1041	Construcción de polo deportivo en la ciudad de Treinta y Tres	5.728.678
Total			**75.365.326**

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.5 Ejecución 2024

Ejecución – Presupuesto total 2024

			Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (marzo)		
Departamento	**Alícuota**	**Presupuesto 2024 Total**	**$**	**%**	**$**	**%**	**$**	**%**	**Departamento**
Artigas	6,21%	167.534.249	20.730.964	12,4%	16.728.776	10,0%	4.002.187	2,4%	Artigas
Canelones	14,73%	397.387.999	22.289.992	5,6%	14.289.886	3,6%	8.000.106	2,0%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	21.728.530	11,0%	15.806.911	8,0%	5.921.619	3,0%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	90.646.551	2.719.638	3,0%	755.583	0,8%	1.964.055	2,2%	Colonia
Durazno	5,11%	137.858.296	3.368.157	2,4%	3.368.157	2,4%	0	0,0%	Durazno
Flores	1,89%	50.988.688	31.839.696	62,4%	31.827.882	62,4%	11.813	0,0%	Flores
Florida	4,46%	120.322.504	13.443.043	11,2%	10.412.192	8,7%	3.030.851	2,5%	Florida
Lavalleja	4,67%	125.987.913	19.778.952	15,7%	19.090.959	15,2%	687.994	0,5%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	79.045.951	51.898.025	65,7%	51.898.025	65,7%	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	168.613.374	12.122.357	7,2%	10.079.211	6,0%	2.043.146	1,2%	Paysandú
Río Negro	3,61%	97.391.086	4.316.026	4,4%	2.429.345	2,5%	1.886.681	1,9%	Río Negro
Rivera	7,38%	199.098.672	62.306.005	31,3%	55.838.197	28,0%	6.467.808	3,2%	Rivera
Rocha	4,34%	117.085.127	17.508.355	15,0%	15.914.067	13,6%	1.594.288	1,4%	Rocha
Salto	7,41%	199.908.016	85.662.404	42,9%	62.683.412	31,4%	22.978.992	11,5%	Salto
San José	4,28%	115.466.439	12.689.924	11,0%	12.513.634	10,8%	176.290	0,2%	San José
Soriano	4,02%	108.452.124	15.245.441	14,1%	8.763.966	8,1%	6.481.475	6,0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	33.696.028	16,3%	29.364.445	14,2%	4.331.584	2,1%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	24.826.639	21,0%	19.040.203	16,1%	5.786.436	4,9%	Treinta y Tres
Total	**100%**	**2.697.544.217**	**456.170.175**	**16,9%**	**380.804.850**	**14,1%**	**75.365.326**	**2,8%**	**Total**

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Ejecución – Proyectos de inversión 2024

			Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (marzo)		
Departamento	**Alícuota**	**Presupuesto 2024 Total**	**$**	**%**	**$**	**%**	**$**	**%**	**Departamento**
Artigas	6,21%	167.534.249	20.083.680	12,0%	16.267.792	9,7%	3.815.888	2,3%	Artigas
Canelones	14,73%	397.387.999	21.095.908	5,3%	13.095.802	3,3%	8.000.106	2,0%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	21.728.530	11,0%	15.806.911	8,0%	5.921.619	3,0%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	90.646.551	2.352.245	2,6%	512.752	0,6%	1.839.493	2,0%	Colonia
Durazno	5,11%	137.858.296	3.368.157	2,4%	3.368.157	2,4%	0	0,0%	Durazno
Flores	1,89%	50.988.688	31.804.853	62,4%	31.804.853	62,4%	0	0,0%	Flores
Florida	4,46%	120.322.504	12.409.528	10,3%	10.005.798	8,3%	2.403.730	2,0%	Florida
Lavalleja	4,67%	125.987.913	17.260.040	13,7%	16.572.046	13,2%	687.994	0,5%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	79.045.951	51.898.025	65,7%	51.898.025	65,7%	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	168.613.374	11.390.065	6,8%	9.504.704	5,6%	1.885.361	1,1%	Paysandú
Río Negro	3,61%	97.391.086	2.374.988	2,4%	1.288.349	1,3%	1.086.639	1,1%	Río Negro
Rivera	7,38%	199.098.672	61.134.336	30,7%	55.107.628	27,7%	6.026.708	3,0%	Rivera
Rocha	4,34%	117.085.127	17.508.355	15,0%	15.914.067	13,6%	1.594.288	1,4%	Rocha
Salto	7,41%	199.908.016	84.991.879	42,5%	62.189.837	31,1%	22.802.041	11,4%	Salto
San José	4,28%	115.466.439	12.169.962	10,5%	12.169.962	10,5%	0	0,0%	San José
Soriano	4,02%	108.452.124	14.517.326	13,4%	8.117.793	7,5%	6.399.533	5,9%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	33.563.932	16,2%	29.232.349	14,1%	4.331.584	2,1%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	24.584.341	20,8%	18.855.663	15,9%	5.728.678	4,8%	Treinta y Tres
Total	**100%**	**2.697.544.217**	**444.236.148**	**16,5%**	**371.712.486**	**13,8%**	**72.523.663**	**2,7%**	**Total**

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Ejecución – 15% Proyectos en territorio municipalizado 2024

			Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (marzo)		
Departamento	**Alícuota**	**Presupuesto 2024 Total**	**$**	**%**	**$**	**%**	**$**	**%**	**Departamento**
Artigas	6,21%	167.534.249	19.410.663	11,6%	15.594.776	9,3%	3.815.888	2,3%	Artigas
Canelones	14,73%	397.387.999	703.927	0,2%	703.927	0,2%	0	0,0%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	90.646.551	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Colonia
Durazno	5,11%	137.858.296	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Durazno
Flores	1,89%	50.988.688	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Flores
Florida	4,46%	120.322.504	6.345.507	5,3%	3.941.777	3,3%	2.403.730	2,0%	Florida
Lavalleja	4,67%	125.987.913	5.725.092	4,5%	5.725.092	4,5%	0	0,0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	79.045.951	51.898.025	65,7%	51.898.025	65,7%	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	168.613.374	7.653.030	4,5%	7.064.982	4,2%	588.047	0,3%	Paysandú
Río Negro	3,61%	97.391.086	255.000	0,3%	255.000	0,3%	0	0,0%	Río Negro
Rivera	7,38%	199.098.672	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Rivera
Rocha	4,34%	117.085.127	7.465.186	6,4%	5.870.898	5,0%	1.594.288	1,4%	Rocha
Salto	7,41%	199.908.016	13.049.369	6,5%	10.126.717	5,1%	2.922.652	1,5%	Salto
San José	4,28%	115.466.439	6.983.305	6,0%	6.983.305	6,0%	0	0,0%	San José
Soriano	4,02%	108.452.124	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	728.032	0,6%	728.032	0,6%	0	0,0%	Treinta y Tres
Total	**100%**	**2.697.544.217**	**120.217.135**	**4,5%**	**108.892.529**	**4,0%**	**11.324.606**	**0,4%**	**Total**

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Ejecución – 3% Proyectos de desarrollo productivo 2024

			Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (marzo)		
Departamento	**Alícuota**	**Presupuesto 2024 Total**	**$**	**%**	**$**	**%**	**$**	**%**	**Departamento**
Artigas	6,21%	167.534.249	647.284	0,39%	460.984	0,28%	186.300	0,11%	Artigas
Canelones	14,73%	397.387.999	1.194.084	0,30%	1.194.084	0,30%	0	0,00%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	90.646.551	367.393	0,41%	242.831	0,27%	124.562	0,14%	Colonia
Durazno	5,11%	137.858.296	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Durazno
Flores	1,89%	50.988.688	34.843	0,07%	23.030	0,05%	11.813	0,02%	Flores
Florida	4,46%	120.322.504	1.033.515	0,86%	406.393	0,34%	627.121	0,52%	Florida
Lavalleja	4,67%	125.987.913	2.518.913	2,00%	2.518.913	2,00%	0	0,00%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	79.045.951	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Maldonado
Paysandú	6,25%	168.613.374	732.292	0,43%	574.507	0,34%	157.785	0,09%	Paysandú
Río Negro	3,61%	97.391.086	1.941.038	1,99%	1.140.996	1,17%	800.042	0,82%	Río Negro
Rivera	7,38%	199.098.672	1.171.669	0,59%	730.569	0,37%	441.100	0,22%	Rivera
Rocha	4,34%	117.085.127	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Rocha
Salto	7,41%	199.908.016	670.525	0,34%	493.574	0,25%	176.951	0,09%	Salto
San José	4,28%	115.466.439	519.962	0,45%	343.672	0,30%	176.290	0,15%	San José
Soriano	4,02%	108.452.124	728.115	0,67%	646.173	0,60%	81.942	0,08%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	132.096	0,06%	132.096	0,06%	0	0,00%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	242.298	0,20%	184.541	0,16%	57.757	0,05%	Treinta y Tres
Total	**100%**	**2.697.544.217**	**11.934.027**	**0,44%**	**9.092.364**	**0,34%**	**2.841.663**	**0,11%**	**Total**

Cuadro – Detalle de certificaciones mensuales 2024

Departamento	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)
Artigas	7.236.574	9.492.202	4.002.187
Canelones	509.440	13.780.447	8.000.106
Cerro Largo	11.727.650	4.079.261	5.921.619
Colonia	128.109	627.474	1.964.055
Durazno	1.340.044	2.028.113	0
Flores	15.636.778	16.191.104	11.813
Florida	6.711.372	3.700.819	3.030.851
Lavalleja	11.484.588	7.606.370	687.994
Maldonado	38.403.455	13.494.569	0
Paysandú	53.649	10.025.562	2.043.146
Río Negro	1.097.597	1.331.747	1.886.681
Rivera	28.956.955	26.881.243	6.467.808
Rocha	2.941.286	12.972.781	1.594.288
Salto	35.423.009	27.260.403	22.978.992
San José	11.708.523	805.112	176.290
Soriano	389.073	8.374.892	6.481.475
Tacuarembó	24.948.273	4.416.172	4.331.584
Treinta y Tres	3.004.942	16.035.261	5.786.436
Total	**201.701.317**	**179.103.532**	**75.365.326**

Gráfica – Ejecución acumulada 2020-2024

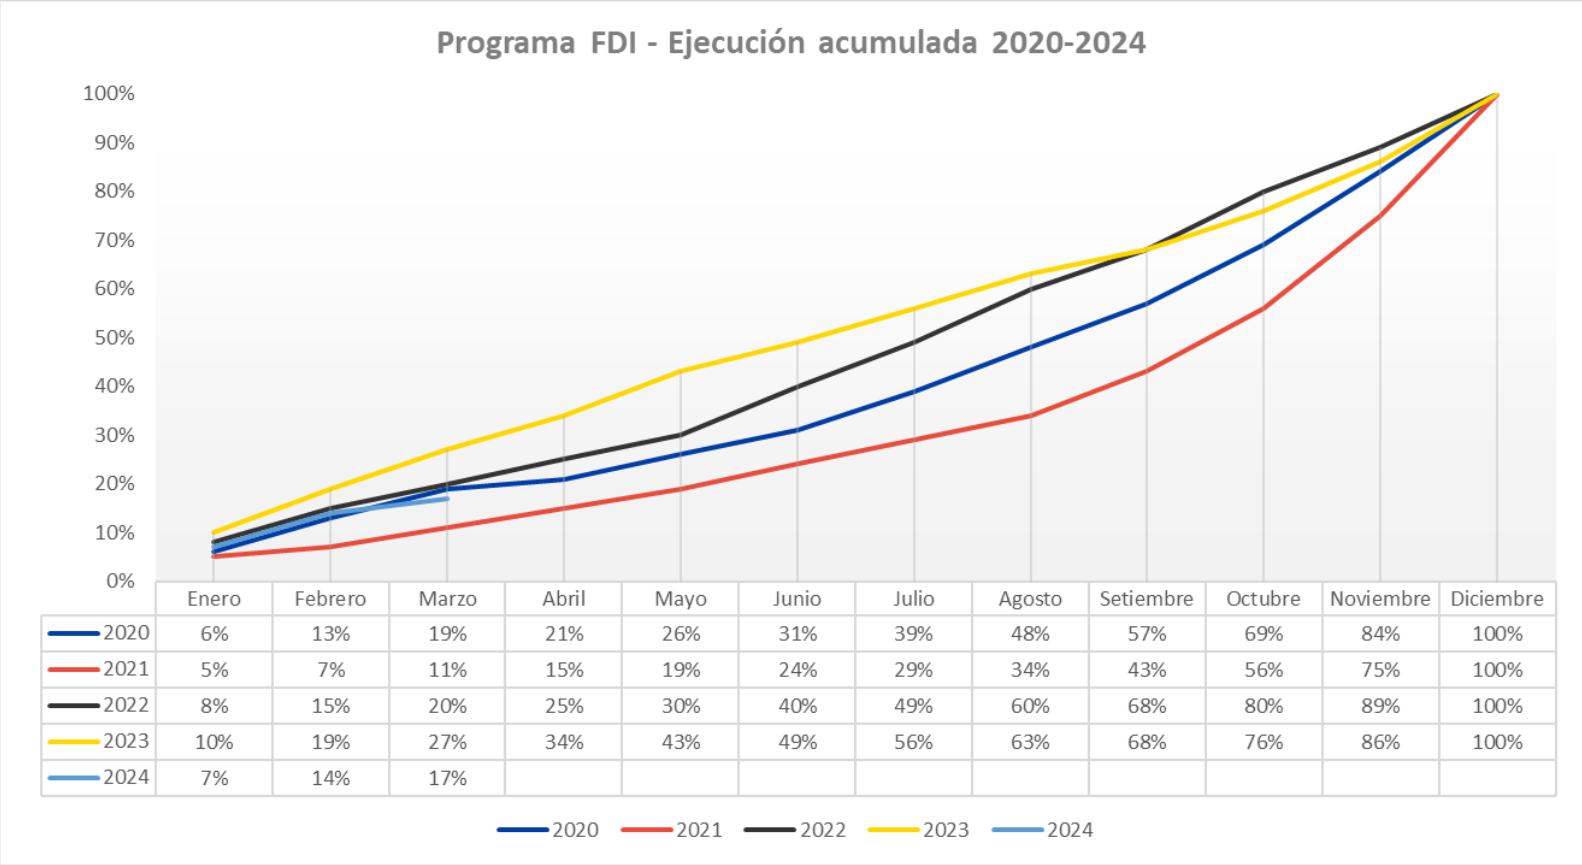

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2020	6%	13%	19%	21%	26%	31%	39%	48%	57%	69%	84%	100%
2021	5%	7%	11%	15%	19%	24%	29%	34%	43%	56%	75%	100%
2022	8%	15%	20%	25%	30%	40%	49%	60%	68%	80%	89%	100%
2023	10%	19%	27%	34%	43%	49%	56%	63%	68%	76%	86%	100%
2024	7%	14%	17%									

Ejecución – PUV artículo 560 Ley Rendición de Cuentas N°20.212

Departamento	Presupuesto Artículo 560 Ley N°20.212 - Año 2023	Presupuesto Artículo 560 Ley N°20.212 - Año 2024	Presupuesto Artículo 560 Ley N°20.212 - Total	% Ejecución
Artigas	4.782.178	5.092.709	9.874.887	0%
Canelones	11.343.234	12.079.808	23.423.042	0%
Cerro Largo	5.613.861	5.978.398	11.592.259	0%
Colonia	2.587.459	2.755.476	5.342.934	0%
Durazno	3.935.093	4.190.619	8.125.712	0%
Flores	1.455.447	1.549.956	3.005.403	0%
Florida	3.434.543	3.657.566	7.092.109	0%
Lavalleja	3.596.260	3.829.783	7.426.043	0%
Maldonado	2.256.326	2.402.840	4.659.166	0%
Paysandú	4.812.981	5.125.513	9.938.494	0%
Río Negro	2.779.978	2.960.496	5.740.474	0%
Rivera	5.683.168	6.052.205	11.735.373	0%
Rocha	3.342.134	3.559.156	6.901.290	0%
Salto	5.706.271	6.076.808	11.783.078	0%
San José	3.295.930	3.509.951	6.805.881	0%
Soriano	3.095.710	3.296.730	6.392.439	0%
Tacuarembó	5.898.790	6.281.828	12.180.618	0%
Treinta y Tres	3.380.638	3.600.160	6.980.798	0%
Total	**77.000.000**	**82.000.000**	**159.000.000**	**0%**

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.6 Presupuesto comprometido 2024

Presupuesto comprometido – Total

			Comprometido 2024		Comprometido 2025 (*)		
Departamento	**Alícuota**	**Presupuesto 2024 Total**	**$**	**%**	**$**	**%**	**Departamento**
Artigas	6,21%	167.534.249	188.420.426	112%	184.017.370	110%	Artigas
Canelones	14,73%	397.387.999	153.650.395	39%	9.941.366	3%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	209.119.487	106%	139.483.801	71%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	90.646.551	67.532.392	75%	0	0%	Colonia
Durazno	5,11%	137.858.296	60.160.840	44%	66.088	0%	Durazno
Flores	1,89%	50.988.688	50.141.800	98%	0	0%	Flores
Florida	4,46%	120.322.504	124.850.234	104%	78.015.640	65%	Florida
Lavalleja	4,67%	125.987.913	73.440.450	58%	0	0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	79.045.951	49.972.538	63%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	168.613.374	126.667.542	75%	107.991.385	64%	Paysandú
Río Negro	3,61%	97.391.086	48.944.009	50%	0	0%	Río Negro
Rivera	7,38%	199.098.672	204.652.350	103%	144.879.482	73%	Rivera
Rocha	4,34%	117.085.127	99.300.397	85%	21.947.993	19%	Rocha
Salto	7,41%	199.908.016	203.178.465	102%	86.280.876	43%	Salto
San José	4,28%	115.466.439	84.391.520	73%	0	0%	San José
Soriano	4,02%	108.452.124	87.321.279	81%	0	0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	180.218.152	87%	121.170.014	59%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	108.464.062	92%	97.055.717	82%	Treinta y Tres
Total	**100%**	**2.697.544.217**	**2.120.426.338**	**79%**	**990.849.732**	**37%**	**Total**

(*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2024. No se incluye el presupuesto de los proyectos presentados a consideración de la CSD.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Presupuesto comprometido – Proyectos inversión

			Comprometido 2024		Comprometido 2025 (*)		
Departamento	**Alícuota**	**Presupuesto 2024 Total**	**$**	**%**	**$**	**%**	**Departamento**
Artigas	6,21%	167.534.249	186.362.065	111%	184.017.370	110%	Artigas
Canelones	14,73%	397.387.999	148.498.657	37%	9.941.366	3%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	207.502.854	106%	139.483.801	71%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	90.646.551	64.611.555	71%	0	0%	Colonia
Durazno	5,11%	137.858.296	58.687.866	43%	0	0%	Durazno
Flores	1,89%	50.988.688	49.075.019	96%	0	0%	Flores
Florida	4,46%	120.322.504	109.855.218	91%	75.640.391	63%	Florida
Lavalleja	4,67%	125.987.913	69.956.671	56%	0	0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	79.045.951	49.438.716	63%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	168.613.374	120.716.596	72%	107.184.947	64%	Paysandú
Río Negro	3,61%	97.391.086	43.060.543	44%	0	0%	Río Negro
Rivera	7,38%	199.098.672	193.851.628	97%	144.879.482	73%	Rivera
Rocha	4,34%	117.085.127	96.999.296	83%	21.947.993	19%	Rocha
Salto	7,41%	199.908.016	190.903.798	95%	86.280.876	43%	Salto
San José	4,28%	115.466.439	81.392.464	70%	0	0%	San José
Soriano	4,02%	108.452.124	77.128.978	71%	0	0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	175.844.818	85%	119.589.014	58%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	107.778.682	91%	97.004.209	82%	Treinta y Tres
Total	**100%**	**2.697.544.217**	**2.031.665.424**	**75%**	**985.969.449**	**37%**	**Total**

(*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2024. No se incluye el presupuesto de los proyectos presentados a consideración de la CSD.

Presupuesto comprometido – 15% Proyectos en territorio municipalizado

			Comprometido 2024		Comprometido 2025 (*)		
Departamento	**Alícuota**	**Presupuesto 2024 Total**	**$**	**%**	**$**	**%**	**Departamento**
Artigas	6,21%	167.534.249	103.494.842	62%	167.421.609	100%	Artigas
Canelones	14,73%	397.387.999	35.403.524	9%	0	0%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	59.686.942	30%	35.000.000	18%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	90.646.551	2.904.209	3%	0	0%	Colonia
Durazno	5,11%	137.858.296	1.966.262	1%	0	0%	Durazno
Flores	1,89%	50.988.688	0	0%	0	0%	Flores
Florida	4,46%	120.322.504	69.946.715	58%	0	0%	Florida
Lavalleja	4,67%	125.987.913	10.197.985	8%	0	0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	79.045.951	49.972.538	63%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	168.613.374	9.107.474	5%	0	0%	Paysandú
Río Negro	3,61%	97.391.086	441.672	0%	0	0%	Río Negro
Rivera	7,38%	199.098.672	26.757.184	13%	0	0%	Rivera
Rocha	4,34%	117.085.127	55.019.830	47%	0	0%	Rocha
Salto	7,41%	199.908.016	64.556.929	32%	0	0%	Salto
San José	4,28%	115.466.439	8.024.956	7%	0	0%	San José
Soriano	4,02%	108.452.124	0	0%	0	0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	25.500.000	12%	47.937.953	23%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	14.146.012	12%	1.849.264	2%	Treinta y Tres
Total	**100%**	**2.697.544.217**	**537.127.074**	**20%**	**252.208.826**	**9%**	**Total**

(*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2024. No se incluye el presupuesto de los proyectos presentados a consideración de la CSD.

Presupuesto comprometido – 3% Proyectos de desarrollo productivo

			Comprometido 2024		Comprometido 2025 (*)		
Departamento	**Alícuota**	**Presupuesto 2024 Total**	**$**	**%**	**$**	**%**	**Departamento**
Artigas	6,21%	167.534.249	2.058.361	1,23%	0	0,00%	Artigas
Canelones	14,73%	397.387.999	5.151.737	1,30%	0	0,00%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	1.616.633	0,82%	0	0,00%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	90.646.551	2.920.837	3,22%	0	0,00%	Colonia
Durazno	5,11%	137.858.296	1.472.974	1,07%	66.088	0,05%	Durazno
Flores	1,89%	50.988.688	1.066.782	2,09%	0	0,00%	Flores
Florida	4,46%	120.322.504	14.995.016	12,46%	2.375.250	1,97%	Florida
Lavalleja	4,67%	125.987.913	3.483.779	2,77%	0	0,00%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	79.045.951	533.822	0,68%	0	0,00%	Maldonado
Paysandú	6,25%	168.613.374	5.950.946	3,53%	806.437	0,48%	Paysandú
Río Negro	3,61%	97.391.086	5.883.466	6,04%	0	0,00%	Río Negro
Rivera	7,38%	199.098.672	10.800.722	5,42%	0	0,00%	Rivera
Rocha	4,34%	117.085.127	2.301.100	1,97%	0	0,00%	Rocha
Salto	7,41%	199.908.016	12.274.667	6,14%	0	0,00%	Salto
San José	4,28%	115.466.439	2.999.056	2,60%	0	0,00%	San José
Soriano	4,02%	108.452.124	10.192.301	9,40%	0	0,00%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	4.373.334	2,12%	1.581.000	0,77%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	685.380	0,58%	51.507	0,04%	Treinta y Tres
Total	**100%**	**2.697.544.217**	**88.760.913**	**3,29%**	**4.880.282**	**0,18%**	**Total**

(*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2024. No se incluye el presupuesto de los proyectos presentados a consideración de la CSD.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.7 Pagos

Departamento	Ejecución Certificación Febrero	Pagos Marzo	Pagos Previstos Abril	Saldo
Artigas	16.728.776	7.236.574	9.492.202	0
Canelones	14.289.887	509.440	13.780.447	0
Cerro Largo	15.806.911	11.727.650	4.079.261	0
Colonia	755.583	128.109	627.474	0
Durazno	3.368.157	1.340.044	2.028.113	0
Flores	31.827.882	15.636.778	16.191.104	0
Florida	10.412.191	6.711.372	3.700.819	0
Lavalleja	19.090.958	11.484.588	7.606.370	0
Maldonado	51.898.024	38.403.455	13.494.569	0
Paysandú	10.079.211	53.649	10.025.562	0
Río Negro	2.429.344	1.097.597	1.331.747	0
Rivera	55.838.198	28.956.955	26.881.243	0
Rocha	15.914.067	2.941.286	12.972.781	0
Salto	62.683.412	35.423.009	27.260.403	0
San José	12.513.635	11.708.523	805.112	0
Soriano	8.763.965	389.073	8.374.892	0
Tacuarembó	29.364.445	24.948.273	4.416.172	0
Treinta y Tres	19.040.203	3.004.942	16.035.261	0
Total	**380.804.849**	**201.701.317**	**179.103.532**	**0**

2. PROGRAMA CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS

2.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: PCR2024/1003 Pavimentación del camino Piedra Sola - Tambores UYPATA01

Departamento: Paysandú

Técnico evaluador: Ing. Francisco Sorribas

Descripción: Intervención del camino que une las localidades de Piedra Sola y Tambores, en una extensión de 25,59km.
Las obras a realizar comprenden:

- Ensanche de plataforma actual para conformar capa de base de 8m de ancho.
- Recargo y estabilización con cemento portland en capa de base en 20 cm de espesor.
- Reconstrucción de todas las alcantarillas de cruce y construcción de alcantarillas para entrada a predios.
- Construcción de capa de rodadura de tratamiento bituminoso doble en 7m de ancho de calzada.
- Colocación de nueva cartelería de señalización y líneas de demarcación de pavimento.

Objetivo general: Elevar el estándar del camino mejorando significativamente la conectividad entre las localidades de Piedra Sola y Tambores. Mejorar el confort y la seguridad de circulación reduciendo los tiempos de viaje. Disminuir los costos de mantenimiento.

Beneficiarios: Pobladores de las localidades de Tambores, Piedra Sola y propietarios y empleados de establecimientos rurales de la zona linderos al camino.

Productos:

- 181.650m2 tratamiento bituminoso
- 457m alcantarillas
- 10.445m2 señalización horizontal

Técnico responsable del proyecto: Ing. Guillermo Daneri

Categoría de proyecto: Infraestructura rural

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 14 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Noviembre 2024

Presupuesto

	Total	PCRP	Contrapartida
Precios básicos	$ 222:488.365	$ 177:990.692	$ 44:497.673
Porcentaje	100%	80%	20%

Condiciones de certificación: Previo al inicio de la etapa de certificación y de acuerdo a lo establecido oportunamente en el contrato con la empresa adjudicataria de la licitación de las obras del proyecto, se deberá realizar el ajuste de precios unitarios, el monto total de LL.SS y el mes base para el cálculo del ajuste paramétrico.

También se deberá ajustar la cantidad de cemento portland para estabilización de base (estimada en forma teórica) de acuerdo a lo que determinen los ensayos correspondientes realizados oportunamente sobre el tramo de prueba.

Proyecto: PCR2023/1001 Pavimentación del camino departamental entre las localidades de Cortume y Ruta N°44

Departamento: Rivera

Técnico evaluador: Ing. Mario Capote

Descripción: Intervención en la continuación del camino Amarillo - Cortume, en el tramo desde Cortume hasta Las Flores, en una extensión de 19,95km.

Objetivo general:

- Brindar mejor seguridad vial.
- Mejorar las condiciones hidráulicas del camino.
- Acortar tiempos de viaje entre la Ruta N°44 y Ruta N°29.

Productos:

- 123.690m2 tratamiento bituminoso
- 220m2 revestimiento talud
- 67m caños
- 65m alcantarillas
- 8.645m2 señalización horizontal
- 80u señalización vertical

Técnico responsable del proyecto: Ing. José Antúnez

Categoría de proyecto: Infraestructura rural

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 22 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Abril 2024

Presupuesto

	Total	PCRP	Contrapartida
Precios básicos	$ 74:016.599	$ 59:213.279	$ 14:803.320
Porcentaje	100%	80%	20%

Proyecto: PCR2024/1002 Camino desde Piedra Sola hasta Ruta N°5

Departamento: Tacuarembó

Técnico evaluador: Ing. Francisco Sorribas

Descripción: Intervención del camino que une la localidad de Piedra Sola con la Ruta Nacional N°5, en una extensión de 26 km.
Las obras a realizar comprenden:

- Ensanche de plataforma actual para conformar capa de base de 8m de ancho.
- Recargo y estabilización con cemento portland en capa de base en 20 cm de espesor.
- Reconstrucción de todas las alcantarillas de cruce y construcción de alcantarillas para entrada a predios.
- Construcción de capa de rodadura de tratamiento bituminoso doble en 7m de ancho de calzada.
- Colocación de nueva cartelería de señalización y líneas de demarcación de pavimento.

Objetivo general: Elevar el estándar del camino mejorando significativamente la conectividad de la localidad de Piedra Sola con la Ruta N°5. Mejorar el confort y la seguridad de circulación reduciendo los tiempos de viaje. Disminuir los costos de mantenimiento.

Beneficiarios: Pobladores de la localidad de Piedra Sola y propietarios y empleados de establecimientos rurales de la zona linderos al camino.

Productos:

- 187.950m2 tratamiento bituminoso
- 851m alcantarillas
- 11.112m2 señalización horizontal

Técnico responsable del proyecto: Arq. Sebastián Serradel e Ing. Guillermo Daneri

Categoría de proyecto: Infraestructura rural

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 14 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Noviembre 2024

Presupuesto

	Total	PCRP	Contrapartida
Precios básicos	$ 271:967.194	$ 217:573.755	$ 54:393.439
Porcentaje	100%	80%	20%

Condiciones de certificación: Previo al inicio de la etapa de certificación y de acuerdo a lo establecido oportunamente en el contrato con la empresa adjudicataria de la licitación de las obras del proyecto, se

deberá realizar el ajuste de precios unitarios, el monto total de LL.SS y el mes base para el cálculo del ajuste paramétrico.

También se deberá ajustar la cantidad de cemento portland para estabilización de base (estimada en forma teórica) de acuerdo a lo que determinen los ensayos correspondientes realizados oportunamente sobre el tramo de prueba.

2.2 Proyectos en evaluación

Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentario CSD
Cerro Largo	PCR2024/1004	Construcción y reparación de estructuras hidráulicas y mejoras viales en Camino Molles-Mungrel	Mario Capote	2024-03-01	Documentación en estudio
Flores	PCR2023/1009	Mejora de las obras de arte de la red vial Departamental de Flores	Alicia Varela	2023-11-23	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Florida	PCR2024/1001	Reacondicionamiento de caminos Florida	María Indarte	2024-01-08	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Rocha	PCR2023/1003	Pavimentación del camino Tiburcio Rocha	María Indarte	2023-03-29	Visita al territorio realizada
Salto	PCR2023/1006	Camino de acceso a Pueblo Belén	Francisco Sorribas	2023-07-12	Documentación en estudio

2.3 3º Certificación 2024

Certificaciones - Ejecución Marzo/2024			
Organismo	**Codproyecto**	**Nombre Proyecto**	**Monto certificado $**
Artigas - OPP	PCR2018/1031	Pavimentación del camino que conecta la Ruta Nº30 con la localidad de Baltasar Brum	5.469.556
Colonia - OPP	PCR2022/1004	Construcción de alcantarilla y asfaltado en camino Paso Curupí a Colonia Arrue	926.508
Paysandú - OPP	PCR2023/1007	Ensanche y pavimentación del camino Cañada del Pueblo - Etapa 2	3.845.013
Salto - OPP	PCR2019/1018	Acceso a Villa Constitución	1.735.685
San José - OPP	PCR2021/1004	Pavimentación del camino Raigón a Ruta N°45 - Tranqueras Coloradas	8.576.199
Tacuarembó - OPP	PCR2019/1014	By pass oeste a la ciudad de Tacuarembó entre Rutas Nacionales Nº31 y Nº26	1.970.205
Tacuarembó - OPP	PCR2022/1014	Puente Paso del Cerro	1.408.925
Tacuarembó - OPP	PCR2022/1015	Puente Paso de la Arena	6.161.995
Treinta y Tres - OPP	PCR2022/1007	Pavimentación camino del Medio - Etapa 1	2.886.544
Total			**32.980.630**

2.4 Montos disponibles

PROGRAMA DE CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS I (PCRP I) (MONTOS EN U$S)								
Departamento	**Asignado**	**Monto ejecutado**	**Avance**	**Saldo**	**Comprometido**	**Aprobado sin inicio de obras**	**Evaluación**	**Saldo para nuevos proyectos**
Artigas	3.954.677	3.660.060	93%	294.618	171.802	122.816	-	-
Canelones	8.337.153	8.337.153	100%	-	-	-	-	-
Cerro Largo	4.621.423	2.859.760	62%	1.761.663	1.632.147	-	129.516	-
Colonia	3.842.729	3.842.729	100%	-	-	-	-	-
Durazno	3.835.724	3.835.724	100%	-	-	-	-	-
Flores	2.054.425	2.054.425	100%	-	-	-	-	-
Florida	3.320.642	3.320.642	100%	-	-	-	-	-
Lavalleja	3.849.149	3.849.149	100%	-	-	-	-	-
Maldonado	2.873.082	2.284.086	79%	588.996	-	588.996	-	-
Montevideo	2.290.319	2.290.319	100%	-	-	-	-	-
Paysandú	4.316.201	4.316.201	100%	-	-	-	-	-
Río Negro	2.850.590	850.101	30%	2.000.489	-	2.000.489	-	-
Rivera	3.191.927	3.191.927	100%	-	-	-	-	-
Rocha	3.218.913	3.218.913	100%	-	-	-	-	-
Salto	4.386.116	4.386.116	100%	-	-	-	-	-
San José	3.137.964	3.137.964	100%	-	-	-	-	-
Soriano	3.211.205	3.211.205	100%	-	-	-	-	-
Tacuarembó	5.082.518	4.932.527	97%	149.991	149.991	-	-	-
Treinta y Tres	2.875.242	567.077	20%	2.308.165	2.308.165	-	-	-
Total	**71.250.000**	**64.146.078**	**90%**	**7.103.922**	**4.262.105**	**2.712.300**	**129.516**	**-**

Comprometido en proyectos en ejecución	Corresponde la suma de todos los saldos de proyectos en ejecución, en todos los casos se trata de precios de licitación.
Aprobado sin inicio de obras	Corresponde a la suma de los proyectos aprobados por la CSD, que no comenzaron a ejecutarse, incluye aquellos que no han sido licitados aún, aquellos que están en proceso de licitación y aquellos adjudicados, que no han comenzado las obras.
Proyectos en evaluación	Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de evaluación, se trata de montos de oficina.
Disponible para nuevos proyectos	Monto total disponible para la presentación de proyectos a ejecutar en el PCRP (límite de ejecución en diciembre 2022).

**Montos estimados: pueden variar según el tipo de cambio y eventuales ajustes de las partidas presupuestales por IPC.*
**Montos únicamente correspondientes al PCRP, no se incluye el 30% de contrapartida departamental.*

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

PROGRAMA DE CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS II (PCRP II) (MONTOS EN U$S)								
Departamento	**Asignado**	**Monto ejecutado**	**Avance**	**Saldo**	**Comprometido**	**Aprobado sin inicio de obras**	**Evaluación**	**Saldo para nuevos proyectos**
Artigas	3.954.677	-	0%	3.954.677	-	3.683.703	-	270.974
Canelones	8.337.153	288.849	3%	8.048.303	-	8.048.303	-	-
Cerro Largo	4.621.423	-	0%	4.621.423	-	-	858.303	3.763.120
Colonia	3.842.729	204.871	5%	3.637.858	936.300	220.893	-	2.480.665
Durazno	3.835.724	215.756	6%	3.619.969	136.601	-	-	3.483.368
Flores	2.054.425	315.936	15%	1.738.490	45.315	1.693.175	-	-
Florida	3.320.642	277.602	8%	3.043.040	-	-	1.390.976	1.652.064
Lavalleja	3.849.149	1.270.905	33%	2.578.245	100.189	-	-	2.478.055
Maldonado	2.873.082	-	0%	2.873.082	-	2.292.989	-	580.093
Montevideo	2.290.319	638.227	28%	1.652.092	-	1.010.198	-	641.894
Paysandú	4.316.201	410.605	10%	3.905.597	1.135.619	-	-	2.769.977
Río Negro	2.850.590	-	0%	2.850.590	-	2.850.590	-	-
Rivera	3.191.927	665.253	21%	2.526.674	455.926	2.070.748	-	-
Rocha	3.218.913	2.708.664	84%	510.249	-	-	510.249	-
Salto	4.386.116	586.116	13%	3.800.000	548.934	1.880.419	1.370.647	-
San José	3.137.964	1.602.807	51%	1.535.157	2.098.398	-	-	-
Soriano	3.211.205	68.100	2%	3.143.105	-	262.506	-	2.880.599
Tacuarembó	5.082.518	-	0%	5.082.518	2.293.488	1.046.162	1.742.867	-
Treinta y Tres	2.875.242	-	0%	2.875.242	55.798	444.764	-	2.374.680
Total	**71.250.000**	**9.253.690**	**13%**	**61.996.310**	**7.806.569**	**25.504.449**	**5.873.042**	**23.375.490**

Comprometido en proyectos en ejecución	Corresponde la suma de todos los saldos de proyectos en ejecución, en todos los casos se trata de precios de licitación.
Aprobado sin inicio de obras	Corresponde a la suma de los proyectos aprobados por la CSD, que no comenzaron a ejecutarse, incluye aquellos que no han sido licitados aún, aquellos que están en proceso de licitación y aquellos adjudicados, que no han comenzado las obras.
Proyectos en evaluación	Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de evaluación, se trata de montos de oficina.
Disponible para nuevos proyectos	Monto total disponible para la presentación de proyectos a ejecutar en el PCRP (límite de ejecución en diciembre 2022).

**Montos estimados: pueden variar según el tipo de cambio y eventuales ajustes de las partidas presupuestales por IPC.*
**Montos únicamente correspondientes al PCRP, no se incluye el 30% de contrapartida departamental.*

2.5 Pagos

Departamento	Ejecución acumulada	Pagos Marzo	Pagos previstos Abril (**)	* Pagos pendientes de documentación (**)	Saldo
Artigas	27.731.804	15.830.195		11.901.609	-
Canelones *					-
Cerro Largo					-
Colonia	6.199.033		313.491	5.885.542	-
Durazno	2.252.231	2.099.452		152.779	-
Flores					-
Florida					-
Lavalleja	489.434			489.434	-
Maldonado					-
Montevideo					-
Paysandú	11.045.759	4.503.243	3.253.948	3.288.568	-
Río Negro					-
Rivera					-
Rocha	7.667.339			7.667.339	-
Salto	20.775.696	15.604.766	3.139.876	2.031.054	-
San José	18.089.014	9.583.711	8.505.303		-
Soriano					-
Tacuarembó	12.415.314	5.128.649		7.286.665	-
Treinta y Tres	17.535.598	8.432.817		9.102.781	-
Total	**124.201.222**	**61.182.833**	**15.212.618**	**47.805.771**	**0**

3. MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL – PROYECTO 999

3.1 Planes para aprobación

Intendencia de Maldonado

Código	Nombre del camino	Largo a intervenir (km)	Ancho promedio (m)	Tipo de intervención
UYMA0299	Los Caracoles	8,1	6	Mantenimiento extraordinario y mejoramiento faja pública
UYMA0243	Los Caracoles	7,2	6	Mantenimiento extraordinario y mejoramiento faja pública
UYMA0297	Paso de la Cantera	14,3		4 alcantarillas - Obras de arte
UYMA0412	Arroyo Los Caracoles			1 alcantarilla Los Álamos
Total		**29,6**		

3.2 Ejecución

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 (sin ajustar)	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje	Saldo a ejecutar
Artigas	6%	33.403.984	9.477.540	28%	23.926.444
Canelones	12%	70.421.455	15.461.395	22%	54.960.060
Cerro Largo	6%	39.035.787	5.183.018	13%	33.852.769
Colonia	5%	32.458.394	32.456.712	100%	1.682
Durazno	5%	32.399.224	3.274.329	10%	29.124.896
Flores	3%	17.353.121	8.665.830	50%	8.687.291
Florida	5%	28.048.478	0	0%	28.048.478
Lavalleja	5%	32.512.624	6.922.457	21%	25.590.167
Maldonado	4%	24.268.071	0	0%	24.268.071
Montevideo	3%	19.345.644	0	0%	19.345.644
Paysandú	6%	36.457.672	0	0%	36.457.672
Río Negro	4%	24.078.086	0	0%	24.078.086
Rivera	4%	26.961.261	22.253.147	83%	4.708.115
Rocha	5%	27.189.201	17.343.134	64%	9.846.067
Salto	6%	37.048.219	1.414.103	4%	35.634.116
San José	4%	26.505.448	14.052.778	53%	12.452.669
Soriano	5%	27.124.095	8.690.605	32%	18.433.490
Tacuarembó	7%	42.930.525	19.973.284	47%	22.957.241
Treinta y Tres	4%	24.286.320	6.079.338	25%	18.206.982
Total	**100%**	**601.827.610**	**171.247.670**	**28%**	**430.579.939**

Cuadro - Detalle de certificaciones mensuales 2024

Departamento	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)
Artigas	0	6.064.232	3.413.308
Canelones	0	9.435.049	6.026.346
Cerro Largo	0	5.183.018	0
Colonia	0	20.891.287	11.565.425
Durazno	0	3.274.329	0
Flores	0	8.665.830	0
Florida	0	0	0
Lavalleja	2.675.070	0	4.247.387
Maldonado	0	0	0
Montevideo	0	0	0
Paysandú	0	0	0
Río Negro	0	0	0
Rivera	0	18.401.464	3.851.683
Rocha	0	9.245.139	8.097.995
Salto	0	980.182	433.921
San José	0	5.915.635	8.137.143
Soriano	0	5.798.889	2.891.716
Tacuarembó	5.999.716	7.342.229	6.631.339
Treinta y Tres	0	0	6.079.338
Total	**8.674.787**	**101.197.282**	**61.375.602**

3.3 Pagos

Departamento	Ejecución Certificación Febrero	Pagos Marzo	Pagos previstos Abril	Saldo
Artigas	6.064.232	-	6.064.232	-
Canelones	9.435.049	-	9.435.049	-
Cerro Largo	5.183.018	-	5.183.018	-
Colonia	20.891.287	-	20.891.287	-
Durazno	3.274.329	-	3.274.329	-
Flores	8.665.830	-	8.665.830	-
Florida	-	-	-	-
Lavalleja	2.675.070	2.675.070	-	-
Maldonado	-	-	-	-
Montevideo	-	-	-	-
Paysandú	-	-	-	-
Río Negro	-	-	-	-
Rivera	18.401.464	-	18.401.464	-
Rocha	9.245.139	-	9.245.139	-
Salto	980.182	-	980.182	-
San José	5.915.635	-	5.915.635	-
Soriano	5.798.889	-	5.798.889	-
Tacuarembó	13.341.945	5.999.716	7.342.229	-
Treinta y Tres	-	-	-	-
Total	**109.872.069**	**8.674.786**	**101.197.283**	**0**
